

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕПЕЛАРЕ

Р Е Ш Е Н И Е № 341

Взето с Протокол № 38 от редовно заседание на Общински съвет – Чепеларе, проведено на 26.02.2026 година.

ОТНОСНО: Одобряване на Доклад за резултатите от междинна оценка за периода 2021-2024 год. на Плана за интегрирано развитие на община Чепеларе 2021-2027 г.

Общински съвет – Чепеларе като изслуша предложението на кмета на общината, постоянните комисии по „Бюджет и финанси“, „Общинска собственост, устройство на територията, инфраструктура и екология“, „Туризм, проекти и инвестиции, „Образование, култура, младежки дейности и спорт“, „Социални дейности, здравеопазване, жалби на населението, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“ и след станалите разисквания на основание чл.21, ал.1, т.24 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.2, т.3 и в чл.33 (1) от Закона за регионалното развитие (ЗРР),

Р Е Ш И:

Общински съвет - Чепеларе одобрява Доклад за резултатите от междинна оценка за периода 2021-2024 год. на Плана за интегрирано развитие на община Чепеларе 2021-2027 г.

Общ брой на общинските съветници: 13

Гласували: 12

“ЗА” - 11;

“ПРОТИВ”- 0;

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1;

СЕКРЕТАР:.....
/СТЕФКА СТАНКОВА/

ЗАМЕСТИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕПЕЛАРЕ:.....
/ПЕТЯ КАСАБОВА/



Съфинансирано от
Европейския съюз



ПРОГРАМА
ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ



ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2024Г. НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ (2021 – 2027г.)

2025 ГОДИНА

Този документ е изготвен в рамките на проект „УСПЕХ - Умения, Синергия и Партньорства за Европейски Хоризонти“, финансиран от Програма "Техническа помощ" 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и национално съфинансиране, по Договор за БФП № BG16RFTA001-1.007-0001-C01

Съдържание

ВЪВЕДЕНИЕ	5
I. ОЦЕНКА НА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО	12
1.1. Общи условия за изпълнение на плана за интегрирано развитие и промени в социално-икономическото развитие на община Чепеларе в периода 2021 – 2024 г.	12
1.2. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението	22
1.2.1. Напредък по Стратегическа цел 1.....	23
1.2.2. Напредък по Стратегическа цел 2.....	34
1.2.3. Напредък по Стратегическа цел 3.....	46
1.2.4. Напредък по Стратегическа цел 4.....	60
1.2.5. Напредък по Стратегическа цел 5.....	61
1.2.6. Напредък по Стратегическа цел 6.....	75
1.2.7. Напредък по Стратегическа цел 7.....	83
1.2.8. Напредък по Стратегическа цел 8.....	90
1.2.9. Напредък по Стратегическа цел 9.....	99
II. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ПИРО	103
2.1. Оценка на степента на постигане на целите от изпълнението на ПИРО	103
2.1.1. Оценка на напредъка по стратегически цели, приоритети и мерки.....	104
2.1.2. Оценка на финансовия напредък.....	143
2.1.3. Оценка на Зоните за прилагане на интегриран подход	151
2.1.4. Оценка на Приложение 1А.....	152
2.2. Констатирани проблеми през периода 2021 – 2024г.	153
III. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ РЕСУРСИ	155
3.1. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните финансови ресурси	155
3.1.1. Оценка на ефективността	156
3.1.2. Оценка на ефикасността	170
3.2. Оценка на организацията и координацията на компетентните органи и ефективността на работата на административната структура	171
IV. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО.....	176

**Доклад за резултатите от междинна оценка за периода 2021 – 2024г.
на План за интегрирано развитие на община Чепеларе (2021 – 2027г.)**

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

АСП	Агенция за социално подпомагане
БСБСПА	Български съюз по балнеология и СПА
БФП	Безвъзмездна финансова помощ
ВВМ	Вътрешна водопроводна мрежа
ВЕИ	Възобновяеми енергийни източници
ВиК	Водоснабдяване и канализация
ВОМР	Водено от общностите местно развитие
ВОКСК	Високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи
ДБТ	Дирекция „Бюро по труда“
ДГ	Детска градина
ДМА	Дълготрайни материални активи
ДЛОШ	Държавен Личен и Отборен Шампионат
ЕС	Европейски съюз
ЕСИФ	Европейски структурни и инвестиционни фондове
ЗДБРБ	Закон за държавния бюджет на Република България
ЗРР	Закон за регионалното развитие
ИСУН	Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България
ИТСР	Интегрирана териториална стратегия за развитие
КИТИ	Концепция за интегрирани териториални инвестиции
МБАЛ	Многопрофилна болница за активно лечение
МИГ	Местна инициативна група
ММС	Министерство на младежта и спорта
МО	Междинна оценка
МОН	Министерство на образованието и науката
МРРБ	Министерство на регионалното развитие и благоустройството
МСП	Малки и средни предприятия
МТСП	Министерство на труда и социалната политика
НПВУ	План за възстановяване и устойчивост на Република България
НПО	Неправителствени организации
НСА	Национална спортна академия
НСИ	Национален статистически институт
НСОРБ	Националното сдружение на общините в Република България
НЧ	Народно читалище
ОбС	Общински съвет
ОДК	Общински детски комплекс
ПГ по СГСТ	Професионална гимназия по селско, горско стопанство и туризъм
ПИРО	План за интегрирано развитие на община
ПМС	Постановление на Министерски съвет
ППЗРР	Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие
ПРР	Програма „Развитие на регионите“ 2021 - 2027
ПРСР	Програма за развитие на селските райони

Доклад за резултатите от междинна оценка за периода 2021 – 2024г. на План за интегрирано развитие на община Чепеларе (2021 – 2027г.)

ПСОВ	Пречиствателни станции за отпадни води
ПУДООС	Предприятие за управление на дейностите за опазване на околната среда
РЗИ	Регионална здравна инспекция
СИДУМН	Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво
СМР	Строително-монтажните работи
СУ	Средно училище
ТБО	Твърди битови отпадъци
УПИ	Урегулиран поземлен имот
ЦНСТ	Център за настаняване от семеен тип
ЦПЛР	Център за подкрепа на личностното развитие
ЮЦР	Южен централен район

СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ В ТЕКСТА

Таблица №	Описание
Таблица 1.	Методика за качествена оценка на количествени показатели
Таблица 2.	Финансово изпълнение на ПИРО на Община Чепеларе за периода 2021-2024 г. (в хил. лв.)
Таблица 3.	Индикатори за резултат
Таблица 4.	Индикатори за продукт

СПИСЪК НА ФИГУРИТЕ В ТЕКСТА

Фигура №	Описание
Фигура 1.	Процес по разработването, наблюдението и оценката на ПИРО Чепеларе
Фигура 2.	Структура на Междинната оценка
Фигура 3.	Основни етапи на Междинната оценка
Фигура 4.	Оценка на постигане на стратегическите цели по категории проекти/дейности
Фигура 5.	Дял на изпълнените проекти спрямо заложените в ПИРО на Община Чепеларе
Фигура 6.	Оценка на постигане на приоритетите по категории мерки/проекти/дейности
Фигура 7.	Оценка на напредъка по Приоритет 1. Повишаване конкурентоспособността на частния сектор и МСП в общината, като движеща сила на местната икономика
Фигура 8.	Оценка на напредъка по Приоритет 3. Изграждане на устойчиви партньорства на местно, регионално и трансгранично ниво.
Фигура 9.	Оценка на напредъка по Приоритет 4. Развитие на устойчиви форми на туризъм и на туристически атракции
Фигура 10.	Оценка на напредъка по Приоритет 5. Изграждане на устойчиво и конкурентно горско стопанство
Фигура 11.	Оценка на напредъка по Приоритет 6. Борба с пожарите, наводненията, неблагоприятните климатични промени и вредителите.

**Доклад за резултатите от междинна оценка за периода 2021 – 2024г.
на План за интегрирано развитие на община Чепеларе (2021 – 2027г.)**

Фигура 12.	Оценка на напредъка по Приоритет 7. Повишаване на конкурентоспособността на селскостопанската дейност и укрепване жизнеспособността на земеделските стопанства и фермите.
Фигура 13.	Оценка на напредъка по Приоритет 9. Превръщане на град Чепеларе в разпознаваем център на спорта с налагането на бранд „Чепеларе-европейски град на спорта“, чрез развитие на атрактивни и устойчиви форми на спорт и тренировъчна дейност
Фигура 14.	Оценка на напредъка по Приоритет 10. Обновяване на социалната и здравната инфраструктура и подобряване качеството на предоставяните от тях услуги
Фигура 15.	Оценка на напредъка по Приоритет 11 Подобряване на свързаността и достъпността на пътната инфраструктура и уличната мрежа.
Фигура 16.	Оценка на напредъка по Приоритет 12 Обновяване на водоснабдителната инфраструктура и услуги
Фигура 17.	Оценка на напредъка по Приоритет 13 Повишаване на енергийната ефективност, чрез изграждане на алтернативни енергийни източници и обновяване на енергийната инфраструктура
Фигура 18.	Оценка на напредъка по Приоритет 14. Обновяване и осъвременяване на съобщителната мрежа и цифрова свързаност
Фигура 19.	Оценка на напредъка по Приоритет 15 Изграждане и благоустрояване на специализираните инфраструктури
Фигура 20.	Оценка на напредъка по Приоритет 16. Инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия живот
Фигура 21.	Оценка на напредъка по Приоритет 17. Културна инфраструктура и културно наследство
Фигура 22.	Оценка на напредъка по Приоритет 18. Благоустрояване на обекти на общественото обслужване и подобряване достъпа до основните административни услуги
Фигура 23.	Оценка на напредъка по Приоритет 19 Подобряване на квалификацията и обmena на добри практики.
Фигура 24.	Оценка на напредъка по Приоритет 20. Подобряване управлението на отпадъците
Фигура 25.	Разпределение на финансовото изпълнение по години (хил. лв.)
Фигура 26.	Ефикасност на използваните източници на финансиране

ВЪВЕДЕНИЕ

Междинната оценка на Плана за интегрирано развитие на Община Чепеларе (ПИРО) е разработена в съответствие с чл.8, ал.2, т.3 и в чл.33 (1) от Закона за регионалното развитие (ЗРР), който изисква изготвянето на обобщена преценка на общинското развитие между 2021 – 2024г., която да изведе насоките за управление на общината до края на настоящия програмен период. Съгласно изискванията на чл.30, ал. 1 на ЗРР, наблюдението и оценката на регионалното развитие се извършват с цел постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионалното развитие. Те отчитат резултатите от изпълнението, които допринасят за регионалното развитие.

Междинната оценка е ориентирана към постигането на следните цели и подцели:

- ✓ Систематизиране и оценка на резултатите от изпълнението на ПИРО в периода 2021 – 2024г.
- ✓ Формулиране на обосновани препоръки за: актуализиране съдържанието на ПИРО за остатъка от периода до 2027г.; необходимите действия на администрацията за последващо изпълнение и наблюдение на ПИРО; подобряване на действията по реализиране на интегрирания териториален подход.

Предмет на настоящия Доклад от междинната оценка на ПИРО за периода 2021 – 2024г. е развитието на административната единица – община Чепеларе, свързано с изпълнението на проекти и инициативи с принос към стратегията и програмата за реализация на ПИРО. Докато ПИРО анализира и оценява състоянието и тенденциите в развитие на общината, Междинната оценка обхваща социално-икономическото развитие от гледна точка на изпълнението на ПИРО. Оценката разглежда инвестициите по отношение на икономиката, социалната сфера, околна среда, управление и функционално-пространствено развитие. Направените анализи акцентират върху проектите дейности и не разглеждат резултатите от изпълнението на основните и регулярни дейности на общинската администрация.

Настоящият доклад от Междинната оценка на Плана за интегрирано развитие на Община Чепеларе разглежда цялата общинска територия: 13 населени места: гр. Чепеларе, с. Богутево, с. Дряновец, с. Забърдо, с. Зорница, с. Лилеково, с. Малево, с. Орехово, с. Острица, с. Павелско, с. Проглед, с. Студенец, с. Хвойна.

Междинната оценка изследва интегрираното общинско развитие в периода между 2021г. и 2024г. Фокусът е поставен върху проекти, проектни идеи, дейности и резултати, които са реализирани или са в процес на реализация за периода на действие на ПИРО. В настоящия документ са включени проекти, които са изпълнявани през 2021г., 2022г., 2023г. и 2024г.

Доклад за резултатите от междинна оценка за периода 2021 – 2024г. на План за интегрирано развитие на община Чепеларе (2021 – 2027г.)

Настоящият Доклад за резултатите от междинна оценка за периода 2021 – 2024г. на Плана за интегрирано развитие на община Чепеларе (2021-2027) е изготвен от „БИМ КОНСУЛТИНГ“ ООД по Заявка подадена от Община Чепеларе до Националното сдружение на общините в Република България в изпълнение на проект „УСПЕХ - Умения, Синергия и Партньорства за Европейски Хоризонти“, финансиран от Програма „Техническа помощ“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и национално съфинансиране, по Договор за БФП № BG16RFTA001-1.007-0001-C01

Процес по разработване, наблюдение и оценка на ПИРО Чепеларе

Планът за интегрирано развитие на Община Чепеларе 2021-2027 г. е приет с Решение № 235 на Общински съвет - Чепеларе от 25.03.2021 г.¹ ПИРО Чепеларе 2021-2027г. е публикуван в портала за обществени консултации на Министерски съвет.²

ПИРО е разработен, съгласно Закона за регионално развитие (ЗРР), Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие (ППЗРР) и Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ).

Фигура 1. Процес по разработването, наблюдението и оценката на ПИРО Чепеларе



ПИРО е стратегически документ, в който са определени средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на Община Чепеларе и връзките ѝ с другите общини в съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие (ИТСР) на Южен централен район (ЮЦР) за планиране от ниво 2 и Общия устройствен план на общината (ОУПО).

Съгласно чл. 13, ал.2 от ЗРР, ПИРО осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на

¹ <http://chepelare.org/?page=decisions&pid=28&id=1986>

² <https://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&id=1475>

дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на община Чепеларе.

Визията, стратегическите цели и приоритети са съгласувани и предвиждат взаимодействието с факторите, условията и потенциала за специфично развитие на общината, мрежата от населени места и отделните сектори, залежали в устройствените планове за развитието ѝ. Формулираните стратегически цели и приоритети отразяват пряко формулираната визия за развитие на община Чепеларе за периода 2021-2027 г. и гарантират интегритет при реализацията им и свързаност със всички планови и стратегически документи както на община Чепеларе, така и на регионално, национално и европейско ниво, като са съобразени и с всички нормативни, законови и подзаконови изисквания, свързани с ПИРО.³

Визията за развитието на община Чепеларе за периода 2021 - 2027г. концентрира специфичния потенциал на общината и насоките за бъдещото ѝ развитие. Тя отразява перспективите пред регионалното и пространственото развитие на територията на общината на основата на социално-икономически фактори.

Стратегическата част на ПИРО е фокусирана, конкретна и ясно показва избраната посока на развитие на общината, както и сферите, към които приоритетно да бъдат насочени усилията и основната част от инвестициите. Приоритетите включват мерки и конкретни проекти, като проектите са индикативно остойностени индикативната финансова таблица на ПИРО. Неразделна част от документа са и инструментите за наблюдение и оценка на ПИРО, включително планирани индикатори и порядък от действия, сред които важна роля заема Междинната оценка.

Междинната оценка е нормативно планирана за средата на програмния период – 2024г. Нейната роля е да анализира и оцени изпълнението на ПИРО в първата половина от неговия период на действие, след което да формулира необходимите препоръки за корекции през следващите години. Значението на Междинната оценка е свързано с две основни направления:

- ✓ Оптимизиране съдържанието и изпълнението на ПИРО до края на програмния период;
- ✓ Осигуряване на основа за изготвянето на Последваща оценка на ПИРО 2021 – 2027г.

Последващата оценка следва да се изготви с натрупване от 2021г., тоест да включва и резултатите от Междинната оценка. По този начин констатациите на настоящия документ са неразделна част от общата оценка на общинското развитие между 2021г. и 2027г. Според процеса по разработването, наблюдението и оценката на ПИРО, Последващата оценка ще се изготвя през 2028г., когато новият средносрочен стратегически документ на общината за периода 2028 – 2034г. вече ще бъде разработен и ще се изпълнява. При тази

³ Източник: ПИРО

Доклад за резултатите от междинна оценка за периода 2021 – 2024г. на План за интегрирано развитие на община Чепеларе (2021 – 2027г.)


последователност, констатациите на Междинната оценка ще бъдат основа за стратегическото планиране през следващия програмен период.

Структура на междинната оценка

Междинната оценка включва четири елемента, дефинирани от чл.33 (2) от ЗРР:

1. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението;
2. Оценка на степента на постигане на съответните цели;
3. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
4. Изводи и препоръки за изпълнението.

Фигура 2. Структура на Междинната оценка

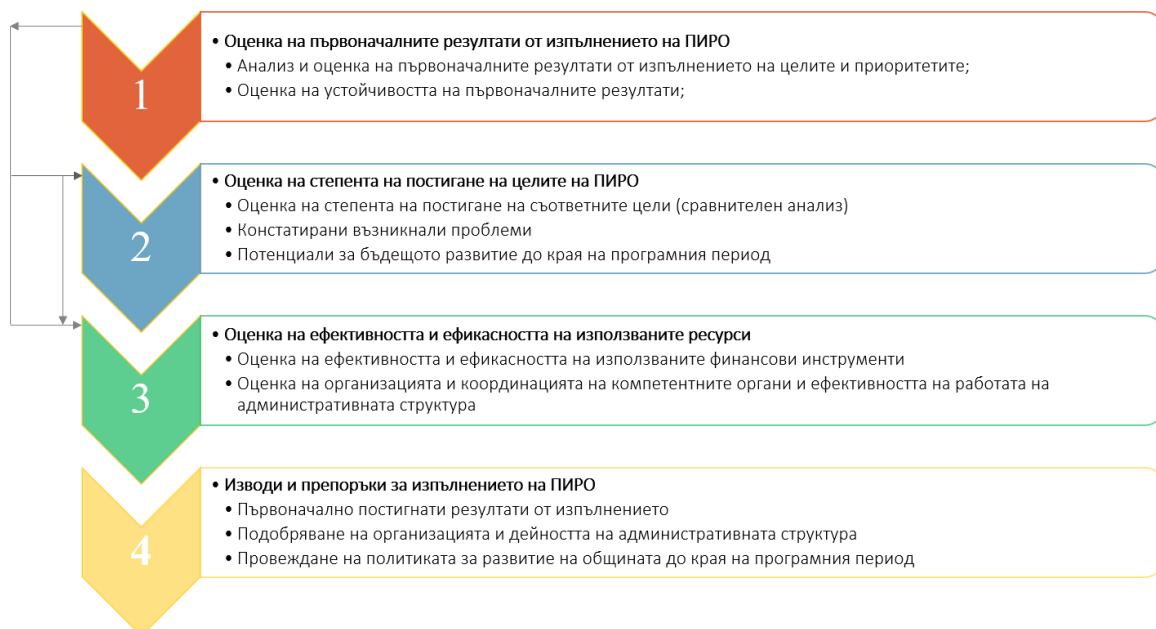

Първите три елемента са свързани с анализ и оценка на различните аспекти от изпълнението на ПИРО, докато четвъртият включва предложения за промени в ПИРО или в начините на неговото приложение.

Информационно осигуряване

Извършването на Междинната оценка на изпълнението на ПИРО на Община Чепеларе за периода 2021-2024г., се базира на следните информационни източници:

- ✓ План за интегрирано развитие на Община Чепеларе (ПИРО) 2021 – 2027г.
- ✓ Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на ПИРО 2021 – 2027г. за 2021г., 2022г., 2023г. и 2024г.


Доклад за резултатите от междинна оценка за периода 2021 – 2024г. на План за интегрирано развитие на община Чепеларе (2021 – 2027г.)

- ✓ Годишни доклади на кмета на Община Чепеларе за изпълнение на мандатните програми за управление;
- ✓ Справки и данни от Националния статистически институт (НСИ) и прилежащия информационен портал (ИНФОСТАТ);
- ✓ Отчети за изпълнение на инвестиционните програми на Община Чепеларе за 2021г., 2022г., 2023г. и 2024г.
- ✓ Информация от ИСУН за подадените, изпълнявани, прекратени и изпълнени проекти, съфинансирани от Европейските фондове;
- ✓ Публично достъпна информация от общинска администрация и Общински съвет - Чепеларе;
- ✓ Публично достъпна информация от министерства, държавни и регионални агенции, държавни комисии, териториални и регионални служби на органите на изпълнителната власт;
- ✓ Публично достъпни стратегически и секторни документи на общинско и областно ниво;
- ✓ Други официални източници, вкл. официалните електронни страници на програми за проектно партньорство в ЕС.

Приложими методи

Процесът на подготовка, разработване и приемане на Междинната оценка за периода 2021-2024 г. на ПИРО на Община Чепеларе преминава през следните основни етапи:

Фигура 3. Основни етапи на Междинната оценка



За целите на Междинната оценка са приложени следните методи:

Проучване: Структуриране и съдържателно проучване на информацията;
Проследяване на изменението на стойностите на индикаторите спрямо базовия сценарий;

Идентифициране на тенденции по изследвани области; Вторичен преглед на данни при идентифициране на противоречащи си тенденции и/или изводи; Графично и таблично изобразяване на данни, факти, тенденции; Експертни заключения относно изследваните области; Дефиниране на слаби места и предложения за подобрене и оптимизиране на процеси.

Анализ и оценка: Оценката се формира на база степента на изпълнение на проектите и дейностите, заложи в Програмата за реализация на ПИРО 2021-2027г., като са извършени следните оценки: Оценка на устойчивостта на първоначалните резултати от изпълнението на ПИРО 2021 – 2027г., от гледна точка на избрани икономически, социални и екологични показатели; Оценка на степента на постигането на съответните цели от изпълнението на ПИРО, към момента на извършване на Междинната оценка, на основата на сравнителен анализ на общата социално – икономическа ситуация (по-специално по отношение на общите характеристики на икономиката, малките и средни предприятия, туризма, транспорта, дейностите в областта на околната среда, енергетиката, пазара на труда, иновациите и въвеждането на нови технологии, здравеопазването, образованието, културата, социалните дейности, административен капацитет и услуги, развитие на гражданския сектор и др.), съгласно общи статистически показатели и емпирични данни от проучвания за развитието на Община Чепеларе; Констатиране възникнали проблеми през периода 2021 – 2024г., който обхваща извършването на МО. Преценка и анализ на влиянието им върху изпълнението на ПИРО през останалата част до края на програмен период 2021 – 2027г.; Оценка на ефективността и ефикасността на използваните финансови инструменти, включително от ЕС и на усвоените ресурси за изпълнение на целите и приоритетите на ПИРО 2021 – 2027г. до етапа на извършване на МО; Оценка на организацията и координацията на компетентните органи и ефективността на работата на административната структура в процеса на разработване, изпълнение, наблюдение и оценка на ПИРО, включително по отношение прилагането на принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност за изпълнение на ПИРО.

Извършени са следните видове анализ: Анализ и оценка на първоначалните резултати от изпълнението на целите и приоритетите на ПИРО, към момента на извършване на МО, на основата на настъпилите промени в икономическото, социалното, инфраструктурното развитие и околната среда; Анализ и оценка за степента на постигане на целите; Анализ на промените в контекста на ПИРО; Анализ на положителните и отрицателните фактори при изпълнението на ПИРО чрез сравнение на данни, факти, показатели и резултати; Анализ на инвестираните финансови ресурси спрямо предварително определените за постигане на заложените цели. Отчитане на ефективност и ефикасност на използваните ресурси.

За изготвяне на оценка за напредъка е използвана методиката, описана в следващата таблица.

**Доклад за резултатите от междинна оценка за периода 2021 – 2024г.
на План за интегрирано развитие на община Чепеларе (2021 – 2027г.)**

Таблица 1. Методика за качествена оценка на количествени показатели

Процентно съотношение изпълнение (в %)	Качествена оценка на изпълнението
От 0 до 25	Незадоволително изпълнение
От 26 до 50	Добро изпълнение
От 51 до 75	Много добро изпълнение
От 76 до 100	Отлично изпълнение
Над 100 (преизпълнен)	Изключително изпълнение/ над очакванията

Изготвеният Доклад за резултатите от Междинната оценка на ПИРО се внася за обсъждане и одобряване от Общински съвет - Чепеларе, съгл. чл.26 (1) от Правилника за прилагане на ЗРР. След приемането му от Общински съвет - Чепеларе, Докладът от Междинната оценка се публикува на интернет страницата на общината и на Портала за обществени консултации на Министерски съвет.

I. ОЦЕНКА НА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Междинната оценка за изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Чепеларе има за цел да обобщи първоначалните резултати и напредъка за първите четири години от прилагането на стратегическия документ, като анализира промяната в средата и условията на живот на местната общност.

Анализът и оценката на първоначалните резултати от изпълнението на целите и приоритетите на ПИРО, към момента на извършване на Междинната оценка, са извършени на основата на настъпилите промени в икономическото, социалното, инфраструктурното развитие и околната среда.

1.1. Общи условия за изпълнение на плана за интегрирано развитие и промени в социално-икономическото развитие на община Чепеларе в периода 2021 – 2024 г.

Периодът 2021 – 2024г. е белязан от негативните ефекти от общото състояние на външната среда в международен план – световна пандемия Covid 19, засилване на глобалното геополитическо напрежение и военни конфликти, инфлация, забавена икономическа активност, природни катаклизми и др. Българските общини са поставени на сериозни изпитания и в резултат на постоянно вътрешнополитическо напрежение, което оказва негативно влияние върху социално-икономическите процеси и забавя изпълнението на важни общински проекти. Политическата нестабилност с честа смяна на централната власт и служебни кабинети се задълбочи с поредица от предсрочни парламентарни избори. Негативните демографски тенденции също оказват силен натиск върху развитието на социалните системи и неблагоприятно влияние върху икономиката. Продължителната липса на възможности за кандидатстване за европейско финансиране забави изпълнението на проектите, включени в ПИРО.

Въпреки трудностите Община Чепеларе продължава да работи за изпълнение на предвидените проекти, мерки и дейности в ПИРО. През периода 2021 – 2024г. работата в областта на общинското развитие е насочена към изпълнение на основни дейности, в рамките на обективните възможности, създаващи условия за нормално функциониране на обществения живот. Община Чепеларе отчита реализирането на общински проекти, насочени към подобряване състоянието на градската среда, изграждане на съвременна инфраструктура с основен фокус – развитие на туризма, решаване на проблеми с водоснабдяването в населените места, повишаване качество на социалните услуги, по-добро образование и по-чиста околна среда. Основните финансови ресурси са насочени

към дейности за намаляване на негативния ефект в най-уязвимите сфери - социални услуги и образователни институции. Усилията на Община Чепеларе са насочени към максимално развитие на туристическия потенциал, обогатяване на културния живот и популяризиране на дестинацията.

В Община Чепеларе изпълнението на ПИРО се извършва при спазване принципите за законосъобразност, прозрачност и публичност, защита на обществените интереси, ефективно и целесъобразно използване на финансовия ресурс. При анализиране и проследяване на условията за изпълнение на ПИРО са отразени настъпилите промени в условията на живот, оказващи пряко въздействие върху социално-икономическото развитие на общината.

Промени в икономическото развитие

Икономическата и финансова обстановка в страната предопределя и всички показатели, от които се прави оценка на икономическото развитие на общината. През 2021г. започва процесът на възстановяване на инвестиционната дейност, който продължава и през 2024г. През периода икономическото развитие на община Чепеларе се подобрява спрямо предходните години. Подобряват се и основните показатели на отчетените нефинансови предприятия.

Брой на предприятията на територията на община Чепеларе: За периода 2021-2023г., броят на нефинансовите предприятия, претърпяват устойчиво повишение от общо 14,58%, основно микро и малките предприятия от региона. През 2023г. техният брой е 503, спрямо 439 през 2021г. Увеличение се наблюдава и в броя на нефинансовите предприятия на 1000 души от населението на община Чепеларе за същия период (2021-2023) – от 69,1 до 87,6 предприятия на хиляда жители, или ръст от 18,5%.

Добавена стойност и продукция на територията на община Чепеларе: За периода 2021-2023 г., брутната добавена стойност по факторни разходи, показва плавен растеж: 2021 – 44,7 млн. /лв., 2022г. – 61,3 млн. лв., 2023 г. – 66,5 млн. лв. Годишно изменение в добавената стойност по факторни разходи, 2022-23 г. е 8,5%. Въпреки инфлационния шок в изследвания период, увеличението в един от основните икономически показатели показва растежа и потенциала на икономиката на община Чепеларе, въпреки предизвикателствата, пред които е изправен стопанския сектор.

Нетни приходи от продажби и произведена продукция в община Чепеларе: За 2023г. нетните приходи от продажби възлизат на 249 млн. лв., като се отчита ръст от 47,33% спрямо 2021г. Стабилен е ръстът на стойността на произведената продукция на нефинансовите предприятия от 51%, или от 144,33 млн. лв. през 2021г., на 217,29 млн. лв. през 2023г. Съвсем логично и произведената продукция на глава от населението също показва съществено увеличение за изследвания период 2021-2023г., като тенденцията е

още по-висока от ръста на общото количество произведена продукция за същия период: 66,54%. Съотношението на тези показатели, показва повишаваща се производителност на човешките ресурси в община Чепеларе, въпреки намаляване на населението.

Инвестиции в предприятията на територията на община Чепеларе: Основният показател за инвестиции в предприятията – Разходи за придобиването на ДМА също сочи, че за периода 2021-2023г. се наблюдава висок ръст на вложенията на бизнеса от 13,5 млн. лв. на 56,4 млн. лв. за 2021 и 2023г.

Основните икономически отрасли в община Чепеларе са туризмът, горското стопанство, производството на спортно оборудване и преработвателната промишленост.

Туризмът: Туризмът като отрасъл е основен поминък и големият двигател на местната икономика. През периода се отчита устойчиво развитие на туризма, като броят на нощувките отчита ръст от близо 52% и приходите от туризма – 139%. Реализираните нощувки по години са: 2021г. – 267 944 бр.; 2022г. – 331 043 бр.; 2023г. – 382 238 бр.; 2024г. – 406 377 бр., а приходите са: 2021г. – 190 290 лв.; 2022г. – 239 691 лв.; 2023г. – 393 798 лв.; 2024г. – 454 679 лв.⁴ Чепеларе е утвърден на пазара като дестинация за планински ски-туризъм с разпознаваемия международен курорт и туристическа марка – Пампорово. През анализирания период е възстановена детската ски писта, намираща се в местността „Дьортевото“ с приблизителна дължината 200 метра. Чепеларе е известен с достъпните си екопътеки. През периода 2021-2024г. е изградена нова туристическа екопътека до археологическия обект пещерното обиталище „Чая“, възстановена е туристическата пътека „Старата воденица“, туристическа пътека „Пещерна лаборатория“ и др. През периода Община Чепеларе изпълнява Концепция с рекламен слоган „Зеленото сърце на България“, която акцентира върху Чепеларе като целогодишна туристическа дестинация. Тя обобщава уникалните природни дадености на района. Условието за климатолечение са основен акцент в новата концепция за развитие на туризма. Община Чепеларе патентова като своя запазена марка „Зеленото сърце на България“ през 2019г.

Общината целенасочено инвестира в диверсификация на туристическия продукт и налагане на пазара на Чепеларе като дестинация за климатолечение, спортен, селски и еко туризъм. Разработена е дигитална карта на която са отбелязани всички туристически обекти, природни забележителности, пътеки, спортни съоръжения, образователни, културни, административни, религиозни обекти, храмове, параклиси и други. Според концепцията за туристическо райониране, община Чепеларе е част от туристически район „Родопи“, който попада в границите на Южен централен район. Основният вид туризъм е планинският с неговите разновидности.

⁴ Източник: Община Чепеларе.

Пазар на труда в община Чепеларе

Заетост и безработица Показателите за заетостта и безработицата са важни индикатори за икономическото развитие, тъй като човешкият фактор е свързващо звено между останалите фактори на производството и от него зависи тяхното пълноценно използване. Делът на трудоспособното население в областта намалява и продължава да е сравнително нисък спрямо средното за страната. Застаряването на населението, образователното ниво на населението, специализацията на местната икономика имат отражение на пазара на труда. Към 2024г. населението в трудоспособна възраст в община Чепеларе е 52,86% при 58,48% в страната, като през периода то интензивно намалява. През периода се наблюдава увеличаване на нивата на безработица: 2021г. – 5,1%; 2022г. – 5,4%; 2023г. – 6%; 2024г. – 6,4%, която е по-висока от средното за страната – 3,6% за 2024г. Предизвикателства пред местния пазар на труда остават образователната структура на работната сила и застаряването на населението. През периода успешно продължи да се развива партньорството на Община Чепеларе с ДБТ.

Доходи и стандарт на живот: Средното брутно месечно възнаграждение на територията на община Чепеларе, бележи постоянен ръст през периода 2021-2023 г., като в процентно изражение повишението е 26,4%, но темпът е чувствително по-нисък от средния за страната (34,77%). Средната месечна брутна заплата на наетите по частния и обществен сектор е съответно през 2021 г. - 1 121 лв./месец и през 2023г. - 1 417 лв./месец, а годишната динамика на brutните заплати за периода 2022-2023 г. – 16,3%.

Промени в социалното развитие

Демография: Данните показват трайна тенденция на намаляване на населението на община Чепеларе. Към 2024г. населението на община Чепеларе е 5 615 души или 6,20 % от общото население на област Смолян (90 534 души). За периода 2020 – 2024г. населението на общината е намаляло с 10,15%. Данните на ниво община са по-неблагоприятни в сравнение с ниво област, при която се отчита понижение от 8,84% спад в броя на населението. В административния център – гр. Чепеларе, е концентрирано 73,27 % от общото население или 5 615 души, към 2024г. За същата година, в селата живеят 1 501 души (или 26,73% от жителите на общината). За изследвания период, градското население е намаляло с 9,26 %, а това в селата с 12,48 %. В изследвания период 2021 – 2024г., процентното съотношение на лицата под, в и над трудоспособна възраст се променя в негативна посока. Увеличава се възрастното население, което към 2024г. заема дял от 36,74% от общото население или 2 063 души. Намалява населението под трудоспособна и през 2024г. то формира дял от 10,40% или 584 души. Най-осезателен е спадът на населението в трудоспособна възраст – с 2,67% за периода 2021-2024г. Към 2024г. в трудоспособна възраст са 2 968 души или 52,86% от общото население. Към 2024 г. децата

и младежите до 19 г. са 13,23% от жителите на общината (734 деца и младежи), а възрастните над 65 годишна възраст имат значителен относителен дял над 33,32% (1 871 души). Тези данни илюстрират процеса на демографско остаряване, като ясно е изразено намаляването на абсолютния брой и относителния дял на населението под 15 години и увеличаване на дела на населението на 65 и повече години. Това предполага провеждане на активна социална политика, насочена към една от най-уязвимите групи – възрастните хора. В община Чепеларе естественият прираст на населението е отрицателен, като за 2024г. е минус 104 души. Средногодишният брой на живородените деца за същата година е 32. През целия период се наблюдава спад на раждаемостта и въпреки понижаване смъртността, след пандемичната 2021г., естественият прираст продължава да бъде отрицателен.

През целия период механичният прираст на населението е отрицателен, като единствено през 2023г. е положителен.

Демографски показатели оказват влияние върху социално-икономическите процеси в общината, но водената местна политика и предвидените цели в Плана за интегрирано развитие на община Чепеларе 2021-2027 г. могат да допринесат за преодоляване на съществуващите предизвикателства.

Образование: Образователната система в община Чепеларе включва: 2 детски градини (ДГ), 1 основно училище (ОУ), 1 средно училище (СУ), 1 спортно училище⁵ и 1 професионална гимназия. През отчетния период общинската образователна система се променя, като през 2024г. Основно училище „Бачо Киро“ – село Забърдо е закрито поради липса на ученици. През периода 2021-2024г. броят на детските градини не се променя – 2: Детска градина Чепеларе, гр. Чепеларе и Детска градина Павелско, с. Павелско. Броят на децата в детските градини варира в близки граници, но през учебната 2024/2025 се отчита ръст от 3,55% спрямо 2021г. и броят на децата е 146.⁶ За периода 2021-2024г. общото образование на територията на общината е организирано в 4 учебни заведения в гр. Чепеларе: Основно училище „Цар Симеон I“, Средно училище „Васил Дечев“, Спортно училище „Олимпийски надежди“ и Професионална гимназия по селско, горско стопанство и туризъм „Никола Йонков Вапцаров“. През наблюдавания период се отчита спад на общия брой ученици с 10,69% в резултат основно на намаляване броя на учащите в V-VII клас и VIII - XII клас. Броят на учениците от I-IV клас ежегодно се увеличава.⁷ През учебната 2024-2025г. броят на учениците е 426. В Професионална гимназия по селско, горско стопанство и туризъм „Никола Йонков Вапцаров“ също се наблюдава лек спад на учениците през анализирания период: 2021/2022 – 149 учащи; 2023/2024 – 142 учащи. За създаване на условия за професионално развитие на учениците от общинската

⁵ Спортно училище „Олимпийски надежди“ е закрито към ноември 2025 г.

⁶ Източник: НСИ

⁷ Източник: НСИ

администрация се реализират активни действия за проследяване на нуждите на пазара на труда и създаване на необходимите кадри. През наблюдавания период материално - техническата база на училищата, вкл. спортната инфраструктура, непрекъснато се обновява, но новите предизвикателства изискват и налагат непрекъснат стремеж към модернизацията ѝ. В Чепеларе функционира Център за подкрепа за личностно развитие Общински Детски Комплекс.

Здравеопазване: Поради близостта си до областния център – гр. Смолян, където са съсредоточени основна част от услугите в областта, Чепеларе не разполага със здравни заведения. Болничното лечение на населението на община Чепеларе се осъществява в Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров“ – гр. Смолян. Спешната помощ се обезпечава от филиал към Центъра за спешна медицинска помощ – Смолян. Здравното обслужване на населението обхваща единствено първична извънболнична медицинска помощ и стоматологична помощ: Медицински център - 2 бр.; Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ – 4 бр.; Амбулатория за индивидуална практика за първична дентална помощ – 8 бр.; Амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ – 1 бр. Всички лечебните заведения за извънболнична помощ се намират в гр. Чепеларе. Няма осигурен постоянен достъп до медицински услуги в селата Орехово, Малево, Забърдо, Лилеково, Острица и Зорница, поради тяхната сравнителна отдалеченост от общинския център и поради дефицит на медицински специалисти. В община Чепеларе има 4 аптеки, от които две се намират в гр. Чепеларе и по една в с. Богутево и с. Хвойна.⁸ Липсва аптечна мрежа в населените места на Общината, поради което възникват трудности за осигуряване на навременни здравни грижи, редовно и навременно закупуване на лекарства и животоподдържащи медикаменти. По данни на НСИ към 2024 г. на територията на община Чепеларе работят общо 7 лекари, 12 медицински специалисти по здравни грижи и 6 стоматолози. На 1 лекар се падат 802 пациенти, което показва по-голяма натовареност в сравнение с показателите на ниво област Смолян - 301 пациенти на 1 лекар. В община Чепеларе 1 лекар по дентална медицина обслужва 936 души, докато на ниво област Смолян на стоматолог се падат – 774 души. В гр. Чепеларе има детска яслена група към ДГ Чепеларе с капацитет 36 деца. През периода 2021-2024г. броят на децата, посещаващи яслата е намалял с над 55%, като през 2024г. те са 15.⁹

Социални услуги: На територията на община Чепеларе е разкрита 1 социална услуга като делегирани от държавата дейности: Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ), в село Павелско. Чрез проектно финансиране от фондовете на ЕС се осигуряват услугите: патронажна грижа; топъл обяд; иновативни здравно-социални услуги в община Чепеларе и др., за които общината разработва и печели проекти. В общината се работи активно по Механизма „Личната помощ“ за подкрепа за пълноценно участие в обществото, за

⁸ <https://services.nhif.bg/references/lists/pharmacies.xhtml>

⁹ Източник: НСИ

извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните потребности от личен, домашен или социален характер, и за преодоляване на бариерите на функционалните ограничения. Предоставянето му е регламентирано в Закона за личната помощ и в Наредба №РД-07-7 / 28.06.2019 г. за включване в Механизма за лична помощ. На територията на общината функционират клуб на пенсионера и клуб на инвалида, чиято задача е да предоставят условия на хората от третата възраст за общуване, осъществяване на социални контакти и възможности за активен живот. През 2022г. Община Чепеларе реализира проект за изграждане на платформата, позволява достъпа на хора с намалена двигателна способност до Музей на родопския карст в Чепеларе, финансиран от Агенция за хората. Към Община Чепеларе функционира Съвет по въпросите на социалните услуги, който е колективен, консултативен орган. Работата му се провежда съгласно Правилник за устройство и дейността на Съвет по въпросите на социалните услуги в Община Чепеларе¹⁰. Той подпомага извършването на анализ на потребностите от социални услуги на общинско ниво и анализ на състоянието и ефективността на социалните услуги; разработва предложения за подобряване на качеството и ефективността на социалните услуги и др.

Култура и културно – историческо наследство: На територията на Община Чепеларе функционират 9 читалища: НЧ „Родопска Искра 1880“ – гр. Чепеларе, НЧ „Никола Вапцаров – 1936“ - с. Хвойна, НЧ „Алеко Константинов – 1880“ – с. Павелско, НЧ „Родопско бъдеще – 1895“ – с. Орехово, НЧ „Христо Ботев 1938“ – с. Забърдо, НЧ „Светлина – 1948“ – с. Богутево, НЧ „Отец Паисий – 1909“ – с. Малево, НЧ „Светлина – 2011“ – с. Зорница и НЧ „Надежда 2006“ – с. Проглед. Към всички читалища функционират библиотеки. Читалищата предлагат различни услуги, свързани с организиране на обучение в музикални школи, курсове по чужди езици и танцови състави. Към някои от музеите се намират тематични музейни сбирки. В гр. Чепеларе се намира и единственият по рода си на Балканския полуостров Музей на родопския карст. В него са представени природните красоти на пещерите и пещерните експонати, запазени от зората на човешката история. На територията на община се намират ценни обекти на културно – историческото наследство. Недвижими културни ценности с категория „национално значение“ на територията на община Чепеларе , съгласно Закона за културното наследство са: Тракийско селище – пещера, „Тъовната пещера“ с. Забърдо и родната къща на Дичо Петров, с. Проглед, както и археологическите обекти Крепост „Зареница“, Останки от древно-римски път, Древно светилище „Заград“. Православни храмове има в гр. Чепеларе, с. Хвойна, с. Малево, с. Орехово, с. Проглед, с. Павелско, в Пампорово. Към първите храмове изградени през периода 1834 - 1836 г. са емблематични образци на възрожденското църковно строителство в Средните Родопи – храм „Св. Атанасий Велики“ – построена само за 40 дни през 1835 г. в гр. Чепеларе и храм „Възнесение Господне“- 1835 г. в с. Павелско. Освен като сгради те се отличават и с оригиналните си стенописи, олтари и икони. През последните години Община Чепеларе насочва усилия и инвестиции в културни събития и обогатяване на културната

¹⁰ Решение №435, взето с Протокол №41 от 30.06.2022г. на Общински съвет – Чепеларе

инфраструктура и културния календар на общината. През периода се извършват археологически разкопки на обект „Пещерно жилище – пещера „Чая“ в м. „Бабина вода“.

Спорт: Титлата „Чепеларе – Европейски град на спорта за 2022 година“ е присъдена на гр. Чепеларе на 29 септември 2021г. от ACES – Асоциация на европейските градове и столици на спорта в категорията „Малки градове“ след оценяване по 12 различни критерия – инфраструктура, спорт, инвестиции в спорта, спортен календар, промотиране на продукта и други. Целта на отличието е признанието идва като награда за усилията на общината да насърчава спорта и активния начин на живот. Наличната почти 400 км спортна инфраструктура, две ски зони – Мечи чал и Пампорово, много трасета за планинско колоездене, град на олимпийски шампиони, с най-голямата фабрика за ски, с перфектна локация и богата спортна история са основите за присъждане на титлата. През периода 2021-2024г. развитието на сектора е насочен към осигуряване на бази, модернизиране на стари или създаване на нови съоръжения за професионален и масов спорт. Приоритетно се инвестира в спортните площадки на открито, които спомагат за развитие на масовия спорт, без да е необходимо включването в организирани структури. Паралелно с осъвременяване на базите се провеждат спортни прояви и дейности, част от които са традиция за общината. На територията на община Чепеларе функционират спортни клубове, от които 5 са вписани в Регистъра на спортните клубове на Министерство на младежта и спорта¹¹: Клуб Биатлон; Спортен клуб - Ветерани Рожен Чепеларе; Спортен клуб по сноуборд – „АМЕР СПОРТС“-гр. Чепеларе, Спортен клуб по тенис на маса-АМЕР СПОРТС; Спортен клуб-Рожен Чепеларе – 2016. Местни клубове предоставят възможност за активно занимание на децата и младите хора. Един от най-активните е Клуб по конен спорт „Аспарух“.

Промени в екологичното развитие и инфраструктурата

Транспортна свързаност: Достъпът до територията на община Чепеларе се осъществява единствено от автомобилен и автобусен транспорт. Главните комуникационно-транспортни връзки на община Чепеларе са развити в направление север-юг между общината и двата областни центрове - Пловдив и Смолян. В района няма пътища от първи клас. Посредством републикански път II-86 Пловдив – Смолян – Рудозем – границата с Гърция (Ксанти), общината се свързва с националната пътна мрежа. Категорията на изградената пътна мрежа в района е ниска. Републиканската пътна мрежа на територията на общината е с дължина от 38,8 км, като състоянието на републиканската пътна мрежа към 2024г. на територията на община Чепеларе е: добро – 31,9 км; средно – 5,4 км и лошо – 1,5 км.¹² Вътрешна улична мрежа на по данни на община Чепеларе е с дължина от 86,15

¹¹ <https://mysregisters.egov.bg/MMSExt/public/registerSk.xhtml?faces-redirect=true>

¹² Източник: НСИ

км. През периода се реализират инвестиции за поддръжка състоянието на пътната и уличните мрежи.

Община Чепеларе е член на Сдружение „Фонд за развитие на летище Пловдив - южната врата на България“, а в Управителния съвет са общините Пловдив, Родопи и Чепеларе. Община Чепеларе работи активно относно перспективите за повече чартъри до Пловдив за да се осигури по-бърз достъп на туристите, които искат да посещават Чепеларе и Пампорово през зимния период. През 2023г. са осъществени чартърни полети до летище Пловдив от Истанбул и е даден старт на редовната линия между двата града. Основен фокус е привличането на туристи от Румъния, Испания и Италия.

Водоснабдителна и канализационна мрежа: Водоснабдяването на населението се извършва от „Вик“ ЕООД – Смолян. Всички селища на територията на община Чепеларе са водоснабдени, като степента на обхватност на водопроводната мрежа е 95%, което е над средното за област Смолян от 90,8%. Свързаността на абонатите към водоснабдителната мрежа е 95 %, а към канализационната мрежа – 78%. През периода се доизгражда вътрешна водопроводна мрежа с. Павелско и в с. Богутево. През 2021 г. реално започва изграждането на водоема, който устойчиво решава проблема с водоснабдяването в село Проглед.

Енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия (ВЕИ): Приносът на ВЕИ към общото производство на електрическа и топлинна енергия към момента се изразява в използването на слънчева и водна енергия. Към края на 2024г. на територията на община Чепеларе функционират общо 10 възобновяеми източници на енергия (ВЕИ) в гр. Чепеларе, с. Малево, с. Орехово, с. Проглед и с. Хвойна с обща инсталирана мощност 2.584790 MW. ¹³ Община Чепеларе изпълнява Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Чепеларе 2021 – 2031 г.

Управление на отпадъците: През периода 2021-2024г. на територията на община Чепеларе не са регистрирани сериозни екологични проблеми и кризи при управление на отпадъците. Проблемите включват периодичното образуване на нерегламентирани замърсявания, липсата на депо за строителни отпадъци, смесването на рециклируемите отпадъци с ТБО и ниските приходи от такса „Битови отпадъци“, които не покриват разходите, свързани с управлението на битовите отпадъци в общината. Количествата събрани битови отпадъци по години е: 2021 г. - 3866,78 т, 2022 г. - 4070,54 т, 2023 г. - 3832,50 т, 2024 г. - 3783,94 т. ¹⁴

Един от проблемите в общината, свързан с управлението на отпадъците е липсата на претоварна станция за минимизиране на обема на ТБО, които се транспортират до регионалното депо за неопасни отпадъци в местност Теклен дол, община Смолян. Наличието на сепарираща инсталация би оптимизирало многократно процеса на

¹³ <https://portal.seea.government.bg/bg/EnergyObjectBySettlements>

¹⁴ По данни на Община Чепеларе

транспортиране на ТБО и на разходите, които общината прави в тази връзка. На територията на община Чепеларе инцидентно възникват нерегламентирани сметища, като за същите веднага се организира почистване и ликвидиране, работи се в посока предотвратяване на последващо възникване. Община Чепеларе полага непрекъснати усилия за усъвършенстване и оптимизиране на системата за управление на твърдите битови отпадъци в общината.

Биоразнообразие: През 2021г. със Заповед № РД – 351 от 31.03.2021г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 59 от 16.07.2021г.) за обявяване на защитена зона – BG0001031 „Родопи – Средни“ определена за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна. Защитената зона BG0001031 „Родопи – Средни“, касаеща територията на община Смолян обхваща землищата на с. Богутево, с. Павелско, с. Хвойна и гр. Чепеларе.

Администрация

Администрацията в община Чепеларе изпълнява компетентно, ефективно, отговорно и координирано своята дейност и следва принципите на отчетност и прозрачност при предоставяне на публична информация и услуги. Община Чепеларе предоставя 167 административни услуги.¹⁵ Електронните административни услуги са достъпни на следния адрес.¹⁶

През периода 2021-2024г. администрацията в община Чепеларе инвестира в укрепване и повишаване на своя административен капацитет.

През 2024г. Кметът на община Чепеларе Боран Хаджиев е отличен с персонална награда „Принос за развитие на местното самоуправление“ в категория „Малка община“ от Национално сдружение на общините в Република България - НСОРБ.

¹⁵

https://iisda.government.bg/adm_services/search_service?search=1&name=&serviceType=&status=1&admType=TERR&kind=ADM_MUNICIPALITY&struct=445

¹⁶ <https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/uslugi/obshtina?mId=445>

1.2. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението

Стратегическата част на ПИРО е фокусирана и конкретна и ясно показва избраната посока на развитие на общината и сферите, към които приоритетно да бъдат насочени усилията и основната част от инвестициите.

Визията за развитието на община Чепеларе за периода 2021 - 2027г. концентрира специфичния потенциал на общината и насоките за бъдещото ѝ развитие. Тя отразява перспективите пред регионалното и пространственото развитие на територията на общината на основата на икономическите и социалните фактори.

Визия: „Община Чепеларе - привлекателна за туризъм, спорт и живеене община, предлагаща добро и съвременно образование и здравеопазване, съхранила природното си и културно-историческо наследство, с изградена и поддържана техническа и бизнес инфраструктура, с регионални и трансгранични инициативи, осигурила балансирано развитие на територията и високо качество на живот за населението.“

В ПИРО са заложили **9 стратегически цели** и **30 приоритета** чрез които следва да се изпълнят стратегическите цели и да се постигне желаната визия. Към приоритетите са изведени мерки, като част от тях са обвързани с конкретни дейности.

Извършен е подборен преглед на проектите и инициативите с принос към ПИРО – реализирани или в процес на реализация в рамките на отчетния период. Водещ е списъкът с дейности/проекти в ПИРО на Община Чепеларе, разработен и попълнен за целите на Междинната оценка и обобщение на проекти и инвестиции с отношение към ПИРО. Основните източници на информация са допълнени с по-детайлно проучване на единични проекти с оглед точно определяне на тяхното съответствие с приоритетите и мерките в ПИРО.

Обект на наблюдение и оценка са четири категории проекти, проектни идеи и дейности:

1. Проекти и дейности, които са реализирани или в процес на реализация с висока степен на съответствие спрямо проектите от Програмата за реализация на ПИРО;
2. Проекти и дейности, които са реализирани или са в процес на реализация, но не са включени в Програмата за реализация на ПИРО, но имат принос към изпълнение на мерките в ПИРО;
3. Оценени проектни предложения с предстояща реализация;
4. Разработени проектни предложения в процес на оценка.

Основно място при оценката заемат изпълнените и успешно приключили проекти. Част от проектите са в процес на изпълнение, но резултати по тях са налице. Взет е предвид и напредъкът, постигнат от проектите в процес на изпълнение, финансирани по програми за периода 2021 – 2027г., както и проекти, стартирали през предходния програмен период (2014-2020г.), които са с период на действие до 2023 г. Последните две категории са свързани с бъдеща или потенциална реализация, които съответстват на мерките от Приоритетите на ПИРО. Независимо, че за разработените проектни предложения в процес на оценка няма сигурност за резултата към момента на изготвяне на настоящата Междинна оценка, те са разгледани като неразделна част от предприетите действия от общинската администрация и от заинтересованите страни за развитие на общината и реализиране на средносрочния планов документ.

При извършване на оценката са идентифицирани проекти/ дейности, които допринасят за изпълнение на отделна мярка и за които е изразходван публичен ресурс. Те са съотнесени към релевантна дейност в зависимост от тематичното им направление. Степента на изпълнението е оценена на база напредъка по съответните групи проекти. Принос на Междинната оценка е систематизирането на всички разгледани проекти и дейности, заедно с посочване на техните основни характеристики.

За извършване на оценката е извършена оценка на съответствието между част 2. Стратегически цели и приоритети на ПИРО и Приложение 1. и Програма за реализация на ПИРО на община Чепеларе за периода 2021-2027 г.: описание на предвидените мерки и дейности. Направена е номерация на описаните дейности, за по-лесно проследяване на напредъка и създаване на база данни за отчитане на количествените резултати.

1.2.1. Напредък по Стратегическа цел 1.

За постигане на **Стратегическа цел 1 „Развитие и модернизация за постигане на интелигентен икономически растеж на град Чепеларе“** са формулирани 3 приоритета

- ✓ Приоритет 1. Повишаване конкурентоспособността на частния сектор и МСП в общината, като движеща сила на местната икономика
- ✓ Приоритет 2. Развитие на международното сътрудничество и провеждане на активна инвестиционна политика
- ✓ Приоритет 3. Изграждане на устойчиви партньорства на местно, регионално и трансгранично ниво.

Приоритет 1. Повишаване конкурентоспособността на частния сектор и МСП в общината, като движеща сила на местната икономика

Мярка 1.1 Подобряване на достъпа и изграждане на местна инфраструктура, подпомагаща бизнеса.

Дейност 1.1.1. Изграждане на зони за туризъм и туристически услуги

 Не е отчетен напредък

Дейност 1.1.2. Изграждане на Туристически Информационен Център в с. Хвойна

 Не е отчетен напредък

Дейност 1.1.3. Регистрация на вековните дървета и изграждане на пътеки и маркировка до тях

 Не е отчетен напредък

Дейност 1.1.4. Изграждане на многофункционална спортна зала за провеждане на спортни събития свързани с БСФ, които ще увеличат туристопотока

 Не е отчетен напредък

Дейност 1.1.5. Извършване на проучване и обществено обсъждане с представители на кооперациите и гатерите в община Чепеларе за необходимостта от изграждане на борса за дърва и дървен материал

 Не е отчетен напредък

Дейност 1.1.6. Изграждане на Общински пазар за промишлени стоки, зеленчуци и плодове.

 Не е отчетен напредък

Мярка 1.2. Стимулиране конкурентоспособността на малкия и средния бизнес, чрез технологично обновяване и иновации

Дейност 1.2.1. Стимулиране и съдействие за изграждане на нови МСП в община Чепеларе

 Не е отчетен напредък

Дейност 1.2.2. Реализиране на съвместни проекти между бизнеса и общината

 Не е отчетен напредък

Дейност 1.2.3. Обучителни пътувания в страната и чужбина за обмен на опит и добри практики в областта на фирмения мениджмънт, маркетинг и рекламата

Не е отчетен напредък

Дейност 1.2.4. Провеждане на различни форми на обучение – курсове, семинари, консултации за подобряване на мениджърските и професионалните умения на заетите в МСП

Не е отчетен напредък

Дейност 1.2.5. Проучване сред предприемачите, земеделските производители и горовладелците на потребностите от специалисти и експерти и препоръки към образователните институции за включване на обучителни курсове, модули и нови специалности в обучителния план, които да обучават нужните на бизнеса кадри

Не е отчетен напредък

Дейност 1.2.6. Провеждане на обучения за хотелиери и ресторантьори. Провеждане на обучения за хотелиери и ресторантьори

Не е отчетен напредък

Дейност 1.2.7. Създаване на предприятие за преработка на отпадъка от дървообработването и дърводобива с участието на публични и частни партньори.

В процес на изпълнение

По Програмата за развитие на селските райони се реализират следните проекти на частни бенефициенти:

Процедура BG06RDNP001-8.001 Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.001 по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ на частен бенефициент.

- ✓ Проект BG06RDNP001-8.001-0073-C01 „Закупуване на инсталация за производство на пелети от дървесна суровина за цех за пелети в с. Павелско, общ. Чепеларе, обл. Смолян“¹⁷, с. Павелско (2021-2023г.)

Дейност 1.2.8. Повишаване конкурентоспособността на местния бизнес (допълнена)

В процес на изпълнение

По Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 се реализира проекти на частни бенефициенти:

¹⁷ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/190/Project/BasicData?contractId=OwlLxzdsWdrigOwhJurN0Q%3D%3D&isHistoric=False>

Процедура BG14MFOP001-5.022 Мерки за предлагане на пазара - сектор „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури:

- ✓ Проект BG14MFOP001-5.022-0036-C01 „Проектно предложение по програма за морско дело и рибарство относно компенсации на операторите, заети в преработка на продукти от риболов и аквакултури за допълнителните разходи, които са понесли поради сътресението на пазара, причинено от агресивната война на Русия срещу Украйна“ на стойност¹⁸ в с. Хвойна на стойност 85 468,48 лв. (2023-2024)

Процедура BG14MFOP001-5.025 Мерки за предлагане на пазара - сектор „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“

- ✓ Проект BG14MFOP001-5.025-0042-C01 Проектно предложение по процедура № BG14MFOP001-5.025 „Мерки за предлагане на пазара - сектор „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ по мярка 5.3 „Мерки за предлагане на пазара“ относно предоставяне на компенсации на операторите, заети в преработка на продукти от риболов и аквакултури за допълнителните разходи в следствие на агресивната война на Русия срещу Украйна“¹⁹ в с. Хвойна на стойност 113 502 лв. (2024)

По Програма „Развитие на човешките ресурси 2021-2027“ се реализира проект на частен бенефициент:

Процедура BG05SFPR002-1.004 Адаптирана работна среда

- ✓ BG05SFPR002-1.004-1380-C01 „Осигуряване на адаптирана работна среда в МУРГАВЕЦ - ШАРЛОПОВ ХОТЕЛС ЕООД“²⁰ на стойност 101 406,58 лв. (2024-2025)

През 2024г. са разработени и подадени следните проекти на частни бенефициенти по

По Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027:

Процедура BG16RFPR001-1.004 Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите:

- ✓ Проект BG16RFPR001-1.004-0549-C01 „Повишаване капацитета на семейното предприятие „Алкор 2000“ ООД, град Чепеларе чрез модернизация и оптимизация на бизнес процесите“²¹ на стойност 139 397,08 лв. (2025-2027)
- ✓ Проект BG16RFPR001-1.004-1556-C01 „Инвестиции за подобряване на производствения капацитет в предприятието „Монстар“ ЕООД“²² на стойност 27 265 лв. (2025-2026)

¹⁸ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/190/Project/BasicData?contractId=%2Fg%2Bn4T8ohWltKIB%2FdtzucA%3D%3D&isHistoric=False>

¹⁹ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/190/Project/BasicData?contractId=WZ2E%2B3dwt3i2oip5F23c0A%3D%3D&isHistoric=False>

²⁰ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/190/Project/BasicData?contractId=7h6z6%2FE6KRXwSqJk1AsMg%3D%3D&isHistoric=False>

²¹ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/190/Project/BasicData?contractId=l6gtHSir%2BKGRdsiwVAi9Nw%3D%3D&isHistoric=False>

²² <https://2020.eufunds.bg/bg/0/190/Project/BasicData?contractId=WBizFCJfy6qUm%2FQkCp2ylA%3D%3D&isHistoric=False>

По програма ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 (Европейски фонд за регионално развитие, Републикански бюджет) са финансирани следните проекти:

- ✓ Проект „Подкрепа за сътрудничество и развитие“ с бенефициент Сдружение „Мечи Чал-Рожен“ (2021 – 2023), чиято основна цел е да предостави информация по различни аспекти, която да отговаря на основните предизвикателства, пред които са изправени предприемачите в региона, да укрепи факторите, влияещи върху предприемаческия успех, да стимулира оцеляването на бизнеса и да популяризира предприемаческата култура, включително чрез създаване на нови предприятия и стартиране на нови компании (стартиращи предприятия).
- ✓ Проект „Бизнес съвет“ с бенефициент Сдружение „Развитие на иновативни стартиращи компании“ (2021 – 2023), чиято основна цел е създаването на бизнес съвети от представители на бизнеса, местните администрации и регулаторните органи, които ще обсъждат проблемите и възможностите на двете страни. Съветът ще създава партньорство, което ще адресира основните проблеми, с които се сблъсква бизнесът в своята дейност, и по този начин ще укрепи факторите, влияещи върху предприемаческия успех, ще стимулира оцеляването на бизнеса и ще популяризира предприемаческата култура, включително чрез създаване на нови предприятия (стартиращи компании).

Мярка 1.3 Активен маркетинг и реклама на местните производства

Дейност 1.3.1. Маркетингово проучване на местните производствени и селскостопански марки

 Не е отчетен напредък

Дейност 1.3.2. Регистриране и утвърждаване на местни производствени и селскостопански марки и обединяването им под собствен бранд на община Чепеларе „Зеленото сърце на България“.

 Не е отчетен напредък

Дейност 1.3.3. Разработване и изпълнение на маркетингова и рекламна кампания популяризиращи бранда „Зеленото сърце на България“.

 Не е отчетен напредък

Дейност 1.3.4. Участие в международни форуми и трансгранични изяви с цел популяризиране на бранда „Зеленото сърце на България“.

 Не е отчетен напредък

Приоритет 2. Развитие на международното сътрудничество и провеждане на активна инвестиционна политика

Мярка 2.1 Разработка и изпълнение на местна инвестиционна политика.

Дейност 2.1.1. Разработване на инвестиционна политика осигуряваща подкрепа и преференции за инвеститорите.

Не е отчетен напредък

Дейност 2.1.2. Провеждане на рекламна кампания за промоциране на община Чепеларе и бранда „Зеленото сърце на България“ пред потенциални инвеститори на различни регионални, национални и международни събития.

Не е отчетен напредък

Мярка 2.2 Включване в програми и проекти за трансгранично, европейско и международно сътрудничество.

Дейност 2.2.1. Поддържане на установените партньорски отношения със Сарайлар, Мармара (РТурция), Куманово(Македония) и Просочани (Гърция).

Не е отчетен напредък

Дейност 2.2.2. Устойчиво развитие на територията и природните ресурси

Не е отчетен напредък

Дейност 2.2.3. Маркетинг и реклама на спортния, културния и екологичен туризъм в трансграничната област

Не е отчетен напредък

Дейност 2.2.4. Включване на местни фирми в български и международни мрежи за обмен на бизнес информация и положителни бизнес практики.

Не е отчетен напредък

Дейност 2.2.5. Подобряване на социалните и здравните услуги и съпътстващата ги инфраструктура в трансграничната област.

Не е отчетен напредък

Приоритет 3. Изграждане на устойчиви партньорства на местно, регионално и трансгранично ниво

Мярка 3.1 Изграждане на устойчиви партньорства с икономически, социални и образователни партньорски организации.

Дейност 3.1.1. Изграждане на Център за професионално образование

Не е отчетен напредък

Дейност 3.1.2. Обвързване на професионалното образование с нуждите на местния бизнес (обучение, стажуване и практики)

В процес на изпълнение

ПГСГСТ гр. Чепеларе е включена в Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ с бенефициент Министерство на образованието и науката, финансиран от ОП НОИР 2014-2020г. (2020 г. - 2023 г.), насочен към развитието на дуалната система на обучение и осигуряване на възможност за тясна обвързаност между образователната система и реалните потребности на пазара на труда.

Дейност 3.1.3. Обучение за работа в устойчиво партньорство (местни власти, НПО и бизнес)

В процес на изпълнение

През периода Община Чепеларе създава устойчиви партньорства, вкл. чрез участия в обучения по линия на сътрудничество с РТА – Родопи и Организация за управление на туристически регион „Родопи“; Асоциация на родопските общини; НСОРБ; Български съюз по балнеология и СПА туризъм и др.

Дейност 3.1.4. Професионална подготовка на планински водачи и екскурзоводи

Не е отчетен напредък

Дейност 3.1.5. Аутсорсване на част от общинските услуги приоритетно в социалните дейности

Не е отчетен напредък

Дейност 3.1.6. Изграждане на партньорства с публични и частни субекти

Не е отчетен напредък

Мярка 3.2 Изграждане на междубщински партньорства за реализация на регионални, национални и трансгранични инициативи

Дейност 3.2.1. Изграждане и обслужване на ботанически маршрути на територията на общината и в региона

Не е отчетен напредък

Дейност 3.2.2. Развитие на религиозния туризъм, чрез разработване на маршрути с различна продължителност и обхват

Не е отчетен напредък

Дейност 3.2.3. Изграждане на междуобщински и трансгранични екологични и културни маршрути

Не е отчетен напредък

Мярка 3.3 Увеличаване приноса на Местната Инициативна Група (МИГ) за развитие на местното предприемачество, обществените инфраструктури и услугите.

Дейност 3.3.1. Изграждане и обновяване на публични инфраструктури

Не е отчетен напредък

Дейност 3.3.2. Разширяване на земеделските и горовладелските дейности.

Дейност 3.3.3. Развитие на услугите и неземеделските дейности.

В процес на изпълнение

По Програмата за развитие на селските райони се реализират следните проекти на частни бенефициенти:

Процедура BG06RDNP001-19.689 МИГ „Преспа“ - общини Баните, Лъки и Чепеларе - мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

- ✓ Проект BG06RDNP001-19.689-0001-C04 Доставка и монтаж на технологично оборудване за производство на хляб и хлебни изделия²³ в гр. Чепеларе (2023-2025г.)

Процедура BG06RDNP001-19.206 МИГ „Преспа“-общини Баните, Лъки и Чепеларе - мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

- ✓ Проект BG06RDNP001-19.206-0001-C04 „Обновяване на съществуваща хибридна влакнесто-оптична и коаксиална разпределителна система за пренос на данни, радио и телевизионни и мултимедийни интерактивни сигнали, чрез доставка и монтаж на иновативна оптична ПОН мрежа от ново поколение в гр. Чепеларе“²⁴ в гр. Чепеларе (2023-2025г.)

Процедура BG06RDNP001-19.689 МИГ „Преспа“ - общини Баните, Лъки и Чепеларе - мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

- ✓ Проект BG06RDNP001-19.689-0007-C03 Внедряване на технология, за подобряване качеството на предоставяните интернет и телевизионни услуги от Астра ТВ Нет²⁵ в гр. Чепеларе (2024-2025)

²³ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/190/Project/BasicData?contractId=cydQosDh0F9%2FCTqi1G5xwg%3D%3D&isHistoric=False>

²⁴ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/190/Project/BasicData?contractId=i1q%2Fpc8fET8qg8D81o0yA%3D%3D&isHistoric=False>

²⁵ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/190/Project/BasicData?contractId=AHpCm%2FtjSqV1CFR%2FnlYj9w%3D%3D&isHistoric=False>

- ✓ Проект BG06RDNP001-19.689-0005-C03 Закупуване на строителна техника²⁶ в гр. Чепеларе (2025)

Процедура BG06RDNP001-19.206 МИГ „Преспа“ - общини Баните, Лъки и Чепеларе - мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

- ✓ BG06RDNP001-19.206-0008-C03 Разнообразяване услугите на СТМ „Труд и безопасност“ ЕООД²⁷ в гр. Чепеларе (2022-2024)

Дейност 3.3.4. Проект BG06RDNP001-19.610-0100-C02 Изготвяне на стратегията за BOMP за територията на МИГ „Преспа – общини Баните, Лъки и Чепеларе“ (допълнен)²⁸

Изпълнен

През 2023г. е реализиран проекта с бенефициент Сдружение „Местна инициативна група Преспа - общини Баните, Лъки и Чепеларе“, финансиран от Програма за развитие на селските райони 2014-2020, подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. на стойност 48 207 лв.

Изпълнени са следните дейности: популяризиране на процеса на разработване на стратегия за BOMP; обучение на местни лидери и заинтересовани страни; проучвания и анализи на територията; подготовка на стратегия за BOMP, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията; координация на изпълнението на подготвителните дейности. Изготвена Стратегията за водено от общностите местно развитие.

Мярка 3.4 Насърчаване на заетостта и подкрепа за мобилността на работната сила.

Дейност 3.4.1. Активно включване в програмата за временна заетост

В процес на изпълнение

Община Чепеларе работи в сътрудничество с Агенцията по заетостта чрез Дирекция „Бюро по труда – Смолян“ за реализиране на програми, насочени към наемане на работа и подкрепа на безработни лица. Тези програми играят важна роля за стимулиране на заетостта и подобряване на жизнения стандарт в региона.

През периода 2021-2024г. Община Чепеларе се включва в следните програми към Агенция по заетостта, Дирекция „Бюро по труда“ (ДБТ) – Смолян:

Регионална програма за заетост на област Смолян

- ✓ 2021 г. – назначени 5 души на длъжност „Общ работник“ за периода 1 юни – 30 ноември 2021 г., обслужващи населените места – с. Павелско, с. Хвойна, с. Малево и с. Орехово

²⁶<https://2020.eufunds.bg/bg/0/190/Project/BasicData?contractId=R%2Ft%2FQsTvebPmXmw6LqK1XA%3D%3D&isHistoric=False>

²⁷ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/190/Project/BasicData?contractId=v8zFSpkOYvOPOUgQOM%2BdCw%3D%3D&isHistoric=False>

²⁸ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/190/Project/BasicData?contractId=x0%2FGnvaKfX3WEFNBSH1UA%3D%3D&isHistoric=False>

**Доклад за резултатите от междинна оценка за периода 2021 – 2024г.
на План за интегрирано развитие на община Чепеларе (2021 – 2027г.)**

- ✓ 2022г. - назначени 19 души на длъжност „Общ работник“ за селата Павелско, Хвойна, Малево, Орехово, Забърдо, Лилеково и Острица за месеците юни – ноември 2022 г.
- ✓ 2024г. – назначени 7 души с период на заетост от 08.07.2024г. до 30.11.2024г.

Национална програма „Помощ за пенсиониране“

През периода 2021-2024г. годишно е назначаван по 1 работник в Община Чепеларе за период от 24 месеца.

Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“

През периода 2021-2024г. годишно е назначаван по 1 работник в Община Чепеларе за период от 24 месеца, като през 2023г. бройката е в с. Орехово и след това преместена в гр. Чепеларе.

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица-Компонент 2

- ✓ 2021г. - Назначени 10 души за период от 1 месец - декември, разпределени както следва: 2 човека град Чепеларе – дейност за превенция разпространението на заболяемостта на населението от COVID – 19; 7 човека в град Чепеларе – подготовка за зимния сезон. 1 човек в село Орехово, община Чепеларе – подготовка за зимния сезон;
- ✓ 2024г. – назначени 2 души за период от 3 месеца.

Програма „Старт на кариерата“

- ✓ 2022г. - назначен 1 служител в Община Чепеларе за срок от 12 месеца;
- ✓ 2023г. - назначен 1 служител в Община Чепеларе за срок от 12 месеца;

Програма „Започвам Работа – Компонент 3 – Заетост“

- ✓ 2024г. – назначени 6 лица в Община Чепеларе за срок от 12 месеца;

Дейност 3.4.2. Увеличаване на трудовата заетост, чрез прилагане на програмите за заетост на МТСП.

 Не е отчетен напредък

Дейност 3.4.3. Прилагане на различни програми с цел подобряване на трудовата заетост сред младежите.

 Не е отчетен напредък

Дейност 3.4.4. Разработване на проекти осигуряващи нови работни места.

 Не е отчетен напредък

Мярка 3.5 Подобряване качеството на човешките ресурси, чрез повишаване на образованието и квалификацията.

Дейност 3.5.1. Повишаване квалификацията и преквалификацията сред младите хора

 Не е отчетен напредък

Дейност 3.5.2. Ранно професионално ориентиране на децата, избрали да получат професионална подготовка в средните училища.

 Не е отчетен напредък

Дейност 3.5.3. Осигуряване на равен достъп до образование чрез подкрепа на деца и младежи със СОП за компенсиране на дефицитите.

 Не е отчетен напредък

Дейност 3.5.4. Социална и професионална интеграция на младите хора, чрез включването им в различни програми, проекти и инициативи.

 Не е отчетен напредък

Дейност 3.5.5. Адаптиране на учебните планове за професионално обучение към нуждите на пазара на труда.

 Не е отчетен напредък

Дейност 3.5.6. Професионална квалификация и преквалификация на заетите в образованието

 Не е отчетен напредък

Дейност 3.5.7. Свързване на СУ „Олимпийски надежди“ с Национална спортна академия

 Изпълнена

През април 2022г. подписан договор между Община Чепеларе, Спортното училище „Олимпийски надежди“ и НСА за сътрудничество, даващи началото на бъдещи съвместни дейности в областта на образованието, науката, спорта и културата между институциите.

Дейност 3.5.8. Свързване на ПГ по СГСТ „Н.Й. Вапцаров“ с Лесотехнически университет.

 Не е отчетен напредък

1.2.2. Напредък по Стратегическа цел 2.

За постигане на **Стратегическа цел 2 „Интегрирано развитие на приоритетните отрасли на територията на общината“** са формулирани 5 приоритета

- ✓ Приоритет 4. Развитие на устойчиви форми на туризъм и на туристически атракции
- ✓ Приоритет 5. Изграждане на устойчиво и конкурентно горско стопанство
- ✓ Приоритет 6. Борба с пожарите, наводненията, неблагоприятните климатични промени и вредителите.
- ✓ Приоритет 7. Повишаване на конкурентоспособността на селскостопанската дейност и укрепване жизнеспособността на земеделските стопанства и фермите.
- ✓ Приоритет 8. Развитие на екологично земеделие и животновъдство

Приоритет 4. Развитие на устойчиви форми на туризъм и на туристически атракции

Мярка 4.1. Изграждане и обновяване на туристическата инфраструктура

Дейност 4.1.1. Провеждане на археологически разкопки, консервация и реставрация на Крепостта „Зареница“ и „Св.Никола“ – с.Павелско.

В процес на изпълнение

В обхвата на дейността са включени 2 обекта: Крепостта „Зареница“ и „Св.Никола“ – с. Павелско по които не е отчетен напредък.

Допълнен обект:

През периода се извършват археологически разкопки на обект „Пещерно обиталище – пещера „Чая“ в м. „Бабина вода“.

Поради близостта на пещерата до града и живописния район, в който се намира, както и уникалността на обекта, амбицията на Община Чепеларе и Музея на родопския карст е да превърне пещерното обиталище в туристически обект, както и да обособи туристически маршрут до него. Намерените артефакти са изложени в Музея на Родопския карст, който от 2024 г. е част от 100-те национални туристически обекта.

Необходимите средства за извършване на проучванията са осигурени от държавния и общинския бюджет. Финансирането на начинанието е осигурено от Община Чепеларе по програмата за туризма за 2021г., приета на заседание на Консултативен съвет по въпросите за туризма в Общината

През 2023г. приключва изпълнението на Проект „Интегриран туристически подход за развитие на културни и природни обекти в Чепеларе, България и Просочани, Гърция“

(INTEGRA_TOUR), финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 2014-2020“ (Договор за субсидия № B2.6c.01/31.08.2017 г.)

През 2024 г. е разработен проект „INTEGRA TOUR II: Култивиране на трансграничния културен туризъм“, Програма „ИНТЕРРЕГ VI-A Гърция – България“ 2021-2027 г. с бюджет 2 449 763,00 евро. Водещ партньор е Община Чепеларе.

Проектът INTEGRA TOUR II е трансгранична инициатива между община Чепеларе в България и община Просочани в Гърция, насочена към развитието на културния туризъм чрез подобряване на местната култура, паметници и природни туристически ресурси. За община Чепеларе ключовите дейности включват проучване, консервация и реставрация на пещерното обиталище „Чая“, както и реконструкция и оборудване на административна сграда в Музея на Родопския карст. Тези усилия се допълват от създаването на работилници, лаборатории, STEM зала и конферентна зала с библиотека. Важни дейности по проекта също включват организиране на партньорски срещи, подобряване на уеб и социално-медийното присъствие, разработване на рекламни материали, участие в трансгранични конференции и създаване на образователни материали и филми.

Дейност 4.1.2. Ремонт на религиозните храмове на територията на общината.

В процес на изпълнение

През 2022г. се извършва спешен ремонт на електрическата инсталация в храм „Успение на пресвета Богородица“, гр. Чепеларе. Средствата в размер на 2616 лв, събрани от проведени благотворителни инициативи, съпътстващи „Ride on Chelare'22“, са дарени на храма.

Дейност 4.1.3. Проучване, изграждане и маркировка на нови „екопътеки“ и обновяване на съществуващите.

В процес на изпълнение

През периода са изградени:

- ✓ Туристически маршрут до археологическия обект пещерното обиталище „Чая“, в местността „Янчовица“ с маркиране на трасето, вкл. с табели, оформяне на пътеките, изграждане на кътове за отдих. Инициативата за екопътеката е на ръководещите проучванията на пещерното жилище доц. д-р Костадин Кисъв и София Христова. Община Чепеларе осигурява финансирането на проекта, а идеята е осъществена от Стилян Цветков, Васил Учиков, Юри Чолаков, Валери Иванов.
- ✓ Туристическата пътека „Старата воденица“, свързана с римския мост, намиращ се преди с. Богутево и със забележителност – Вързаният камък край с. Лилеково. Извършено е прочистване на туристическа пътека, укрепен старият римски мост по туристическия маршрут. Маршрутът започна в

началото на Чепеларе, на моста пред фабриката за ски, при старите рибарници и ресторант „Рибката“, „Пътят на водата“ при вековната воденица до римския мост по поречието на река Чепеларска – 3,6 км. При възстановяване на екопътеката Община Чепеларе закупува необходимите материали и с труда на доброволци, и на ученици от ПГСГСТ „Н.Й.Вапцаров“-Чепеларе, по инициатива на Марчо Паунов от Чепеларе.

- ✓ Екопътека „Пещерна лаборатория“ - една от най-атрактивните екопътеки – Маршрутът започва от разклона на стария път за с. Левочево, кръгов е и с обща дължина около 9 км, подходящ за пешеходен, велосипеден туризъм или джип сафари. Преминава през емблематични места за Родопска планина – пещера „Сбирковата“, Старата граница, пещера Топчето, пилон Рожен, изворите на река Чепеларска.
- ✓ Туристическа пътека в близост до туристическа атракция „Zip Line“, Чепеларе (2021г.)

Дейност 4.1.4. Изграждане на Музей на скиите

 Не е отчетен напредък

Дейност 4.1.5. Изграждане на заслони и места за отдих по маршрутите . с. Дряново – хижа Пашалийца до Момина вода

 Не е отчетен напредък

Дейност 4.1.6. Изграждане на летни и зимни атракции в община Чепеларе

 В процес на изпълнение

За подобряване атрактивността на съществуващи културни обекти през периода се инвестира в подобряване на материално – техническата база на: Музей на скиите – компютър (2023г.); Музей на родопския карст - експозиционна витрина, лаптоп, фотоапарат, генератор за електрически ток (2023-2024г.)

Дейност 4.1.7. Изграждане на зони за отдих по поречието на реките: Янчовска, Сивковска, Камбурска и Лопуха.

 Не е отчетен напредък

Дейност 4.1.8. Подобряване достъпа до пещерата Челевешница в землището на с.Павелско

 Не е отчетен напредък

Мярка 4.2. Проучване на възможностите и подпомагане и стимулиране за развитие на различни видове туризъм, в това число еко, спортен и ловен туризъм с максимално усвояване на благоприятните способстващи фактори на средата

Не е отчетен напредък

Мярка 4.3. Подобряване на информираността, маркетинга и рекламата на местните туристически продукти

Дейност 4.3.1. Разработване на Маркетингова, рекламна стратегия и провеждане на рекламна кампания за сертифициране и налагане на местни и регионални туристически марки част от бранда „Зеленото сърце на България“

Не е отчетен напредък

Дейност 4.3.2. Изработване и реализация на маркетингова и рекламна стратегия „Чепеларе – зеленото сърце на България“.

В процес на изпълнение

През периода Община Чепеларе изпълнява Концепция с рекламен слоган „Зеленото сърце на България“, която акцентира върху Чепеларе като целогодишна туристическа дестинация. Тя обобщава уникалните природни дадености на района. Условието за климатолечение са основен акцент в новата концепция за развитие на туризма.

През 2019г. Община Чепеларе патентова като своя запазена марка „Зеленото сърце на България“. Общината разработва нова туристическа стратегия за налагане на Чепеларе като дестинация за климатолечение, спортен, селски и еко туризъм.

През 2022г. е монтирано красиво голямо светещо сърце на площад „Олимпийски“, където гостите и жителите на града могат да запечатат в уникални кадри любовта си към „Зеленото сърце на България“ – Чепеларе. Съществуващият кът за снимки се променя тематично. Възстановена е табелата на входа на града откъм Смолян, поставени са нови билборди на главния път преди село Хвойна от Пловдив и др.

Община Чепеларе активно участва в регионални, национални и международни туристически изложения и форуми:

- ✓ Участие в конгреси на Български съюз по балнеология и СПА Туризъм (2021 г., 2022г., 2024г.);
- ✓ През 2023 г. Община Чепеларе е домакин на 10 конгрес на Български съюз по балнеология и СПА Туризъм с участието на президента на Европейската СПА асоциация Тиери Дюбоа, експерти от страната и Европа, представители на бизнеса, местни и държавни власти в модерния конгресен център на хотел Перелик в Пампорово. БСБСПА създаде цветна градина с японски вишни в Чепеларе.

- ✓ Участие Международното туристическо изложение Holiday&SPA EXPO в Интер Експо Център – София. (2022г., 2023г.)

Община Чепеларе има разнообразен културен календар, а събитията включени в него допринасят за популяризиране и рекламиране на от бранда „Зеленото сърце на България“.

По-популярни културни събития организирани ежегодно през периода са:

- ✓ „Тука е така Фест“ е първият по рода си фестивал в района с насоченост към младежката общност и тяхната социална ангажираност, от 2022г. се провежда ежегодно;
- ✓ Ежегодно се провеждат Национални хайдушки празници „Кап. Петко войвода“.
- ✓ 90-годишен юбилей на курортен комплекс Пампорово 2023г.

През периода се работи и по изпълнение на Маркетингова стратегия на родопски туристически район 2021-2024.

2024Г. Община Чепеларе вече разполага с дигитална карта на цялата си територия, на която са отбелязани всички туристически обекти, природни забележителности, еко-пътеки, спортни съоръжения, образователни, културни и административни институции, религиозни обекти (параклиси с кратки описания, храмове и джамии) и др. При заснемането на обектите, на повечето от тях са поставени стикери с QR код, който при сканиране с мобилен смарт телефон препраща туристите към дигиталната карта. Някои от обектите са заснети и вътре, така, че посетителите могат да си направят виртуална разходка до избран обект и да го предпочетат или не, пред друг. От започването на работата по дигитализирането на територията на община Чепеларе до началото на месец декември 2024 г., виртуалният тур на община Чепеларе има над 140 хил. гледания.²⁹

Дейност 4.3.3. Провеждане на рекламна кампания за популяризиране на културните и природните забележителности на територията на общината

В процес на изпълнение

Проект BG06RDNP001-19.607-0011-C01 Мост на културното наследство на МИГ Преспа - общини Баните, Лъки и Чепеларе и МИГ Ардино- Джебел, финансиран от ПРСР 2014-2020г.,³⁰ с бенефициент Сдружение „Местна инициативна група Преспа - общини Баните, Лъки и Чепеларе“ (2023-2024).

Община Чепеларе е част от Местна инициативна група „Преспа“ и участва в реализацията на проекта. По проекта е създаден иновативен културно-туристически продукт - пътеводител, обхващащ регионите на двете местни инициативни групи, във

²⁹ <https://visitchepelare.bg/bg/>

³⁰ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/190/Project/BasicData?contractId=yIQNvqaVfZr80DeUHgtOJg%3D%3D&isHistoric=False>

видео формат и печатен формат, включващ снимки на исторически, културни, географски, религиозни и други забележителности.

По проекта в град Чепеларе бе монтирана видео стена и бе проведен фестивал с участието на състави и от Баните и Лъки. Обща стойност на проекта: 147 449.00 лв. Дата на стартиране: 30.11.2023 г. Дата на приключване: 30.11.2024 г.

През 2021г. е изработен филм за Община Чепеларе от две части по БНТ – Туризм БГ. Излъчен на дати 27 ноември и на 04.12. 2021 г.

Периодично си публикуват материали в местни и регионални медии, facebook и туристически портал bgtourism. Община Чепеларе е позиционирана активно на туристическия сайт - www.visitchepelare.com, където се прави активен маркетинг и реклама на местни производства и бизнеси.

Провеждат се активни кампании във фейсбук чрез снимки, видео, интервюта, реклама на туристически обекти и хотели и се издава общински вестник.

През 2023г. Община Чепеларе участва в 4-то издание „Дестинациите – най-добрият пътеводител за вашата почивка” с акцент 90 години Пампорово и новостите в курорта.

През 2024г. журналисти от Чешка република посещават Община Чепеларе и са им представени възможностите за целогодишен туризъм и спорт в населените места на община Чепеларе, както и дигиталната карта като съвременен туристически продукт, посещават емблематични туристически обекти.

През 2024г. е разработена концепция за „Интерактивна 360-градусова трансгранична туристическа платформа“ с водещ партньор Община Гърмен и партньори Община Чепеларе и Община Тасос (Гърция).

През 2025г. предложението е одобрено.

Целта на местната власт от двете страни на българо-гръцката граница е да се разработи и внедри интерактивна туристическа платформа, използваща технологиите за добавена и виртуална реалност. Така ще се подобри преживяването от трансграничния туризъм в България и Гърция.

Платформата ще предостави на туристите впечатляващи 360-градусови гледки, интерактивни маршрути, персонализирани маршрути и интегрирани услуги, като ще насърчи развитието на обединена и технологично напреднала туристическа дестинация.

Финансирането е по Програма „ИНТЕРПРЕГ VI-А Гърция – България“ 2021-2027 г., Общ бюджет на проекта: 1 016 500 евро

Дейност 4.3.4. Обслужване на културните и екологичните маршрути в общината, чрез осигуряване на водачи и екскурзоводи.



Не е отчетен напредък

Дейност 4.3.5. Популяризиране на местните културни традиции, обреди и обичаи

В процес на изпълнение

Проект BG06RDNP001-19.287-0002-C02 Да съхраним традициите в Община Чепеларе През периода 2021-2023г. се реализира проекта с бенефициент Община Чепеларе, финансиран от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., Процедура BG06RDNP001-19.287 Местна инициативна група „Преспа“ – общини Баните, Лъки и Чепеларе“ - подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ Стойността е 24 340 лв.

Основна цел на проекта е опазване на нематериалното културно наследство в Община Чепеларе. По проекта са ушито 29 мъжки и женски родопски народни носии за нуждите на самодейна група за автентичен фолклор „Заедно можем повече“ към общинска организация на Съюза на инвалидите – България.

През 2024г. са монтирани нови дървени къщички, в които местните търговци и занаятчи да предлагат своите продукти при природния феномен „Чудните мостове“ - с. Забърдо.

Община Чепеларе има богат културен календар, в който ежегодно се включват традиционни празници и събития, по значими от които са:

- ✓ Сирни Заговезни (Пустове) - символичното запалване на традиционния огън, музика и веселие. Партньор на Община Чепеларе е Сдружение на хотелиери, ресторантьори и търговци - Чепеларе (СХРТ Чепеларе);
- ✓ Тодоровден в град Чепеларе – парад на конете по главната улица на града, празнична програма, състезания и др. Партньори на Община Чепеларе са Сдружение на коневъдите в Чепеларе, Конна база Аспарух/Horse riding Asparuh и местните коневъди и др. Празникът се отбелязва и в село Хвойна.

Мярка 4.4. Активно участие в разработване на областна стратегия с цел по-пълно и всеобхватно реализиране планинския ресурс.

Не е отчетен напредък

Мярка 4.5. Налагане на общ съвместен туристически бранд с общините в областта, съпроводен с комплексна маркетингова стратегия.

Не е отчетен напредък

Мярка 4.6. Популяризиране на събития и мероприятия с местно значение, които допринасят за развитието на туризма

 Не е отчетен напредък

Приоритет 5. Изграждане на устойчиво и конкурентно горско стопанство

Мярка 5.1 Създаване на условия за развитие на съвременно, балансирано и природосъобразно горско стопанство.

Дейност 5.1.1. Изграждане и ремонт на горски пътища.

 Не е отчетен напредък

Дейност 5.1.2. Закупуване на техника за ремонт и изграждане на горски пътища

 Не е отчетен напредък

Дейност 5.1.3. Залесяване на непригодните за земеделие земи.

 В процес на изпълнение

Проект BG06RDNP001-8.002-0014-C02 Презалесяване на гори, пострадали от пожари, абиотични и биотични фактори на територията на община Чепеларе, област Смолян³¹

През периода 2021-2023г. Община Чепеларе изпълнява проекта, финансиран от ПРСР 2014-2020г., Процедура BG06RDNP001-8.002 Подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ на стойност 74 541,99 лв.

Презалесяване е извършено в местност „Пожара Студенец“, землището на с. Малево, в местност „Сивкоскана гора“, землището на гр. Чепеларе и местност „Малък пещерски дол“, землището на с. Богутево с черен бор, бял бор и смърч.

Дейност 5.1.4. Разширяване на екологичните блага, чрез подобрена информираност и увеличени директни плащания по екологичните мерки

 Не е отчетен напредък

Мярка 5.2 Устойчиво управление на горите и горския фонд.

Дейност 5.2.1. Прозрачност и публичност при планиране на лесоустройството.

 Не е отчетен напредък

Дейност 5.2.2. Интегриране на мерки в областта на биоразнообразието в планове за управление на горите.

 Не е отчетен напредък

³¹ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/190/Project/BasicData?contractId=bVHT%2B5zM8xw6QWYtDqrtUQ%3D%3D&isHistoric=False>

Дейност 5.2.3. Сертифициране на общинските гори, за устойчиво стопанисване на горите.

 Не е отчетен напредък

Дейност 5.2.4. Изработване на Лесоустройствен план

 В процес на изпълнение

Ново изготвените са лесоустройствени планове на следните кооперации и сдружения: ГПК „Свети Дух“, ГПК „Свети Илия“, ГПК „Хаджийца“, р-р „Вълневото гроба“, ГПК „Дряновец – Хаджиосманско“, ГПК „Острица“, ГПК „Каракус“, ГПК „Карачелебийца – Инджекаровско“, ГПК „Вакъфа“, ГПК „Пампорово“, ДЗЗД „Русина ела“, р-р „Бор“, ГПК „Богатево“, ГПК „Гора“, ДЗЗД „Сбирковото“, ГПК „Хаджиева чука“,

Дейност 5.2.5. Организирано залесяване на терени по повод Деня на гората и други поводи или възникнали потребности.

 Не е отчетен напредък

Приоритет 6. Борба с пожарите, наводненията, неблагоприятните климатични промени и вредителите

Мярка 6.1 Изграждане на система за наблюдение, превенция и борба с пожарите.

Дейност 6.1.1. Оптимизиране на общинската система (организация) за борба с пожарите и природните бедствия на територията на общината.

 В процес на изпълнение

През 2021 г. са закупени 2 броя високо проходими автомобили за нуждите в ситуации на бедствия и аварии от Община Чепеларе. Закупени са роторни машини за снегочистване за град Чепеларе и село Забърдо.

Дейност 6.1.2. Изграждане на минерализовани ивици

 Не е отчетен напредък

Дейност 6.1.3. Поставяне на предупредителни табели

 Не е отчетен напредък

Дейност 6.1.4. Устройване на противопожарни депа

 Не е отчетен напредък

Дейност 6.1.5. Изграждане на хеликоптерна площадка

 Не е отчетен напредък

Мярка 6.2 Борба с ерозията, наводненията, неблагоприятните климатични изменения и вредителите

В процес на изпълнение

През 2021г. са изпълнени 2 обекта с финансиране от Междуведомствената комисията по бедствия и аварии:

- ✓ Обект „Укрепване на срутищен участък на път SML 1314 (II-86 Хвойна - Чепеларе) - местността „Чудните мостове“ при км. 8+750, с. Забърдо - ПМС №96/25.04.2019г. и ПМС №250/2020г.
- ✓ Обект „Укрепване на срутищен участък от път на с. Павелско при о.т.488 и о.т.489 в община Чепеларе - ПМС № 250/2020г.“

Подпорни стени в гр. Чепеларе:

- ✓ Ремонт на подпорна стена към ул. „Христо Ботев“ и частичен ремонт на улицата; на улица „Мрамор“ (2023г.);
- ✓ Изграждане на подпорни стени на ул. „Младост“ и ул. „Персенк“ (2021-2023)
- ✓ Изграждане подпорна стена на ул. „Ирландия“ (2022-2023г.)
- ✓ Изграждане на подпорни стени на ул. „24-ти май“ (2021-2023)

Подпорни стени в малките населени места:

- ✓ Текущ ремонт на подпорна стена и стълби в с. Проглед (2023г.)
- ✓ Текущ ремонт на подпорна стена в с. Орехово (2024г.)

2024г. Обекти с финансиране от Междуведомствената комисията по бедствия и аварии:

- ✓ Възстановяване на подпорна стена на улица „Добри Чинтулов“ между о.т. 84 до о.т. 85 в кв. 8 и кв. 10 гр. Чепеларе, ПМС № 423/12.2024г. на стойност 208 878 лв. Обекта ще се изпълнява през 2025 г.
- ✓ Възстановяване на подпорна стена на улица между о.т. 50 и о.т. 57 в кв. 3 и кв. 9 по ЗРП на с. Забърдо, ПМС № 395/2022г. За 2024 г. усвоените средства са в размер на 280 477 лв. Строителството продължава през 2025 г.

Приоритет 7. Повишаване на конкурентоспособността на селскостопанската дейност и укрепване жизненоспособността на земеделските стопанства и фермите.

Мярка 7.1 Изграждане на съвременно, иновативно селско стопанство

Дейност 7.1.1. Подпомагане развитието на картофопроизводството, пчеларството, говедовъдството, овцевъдството, козевъдството, свиневъдството, птицевъдството чрез програми, кредити, лизинг, консултации.

Не е отчетен напредък

Дейност 7.1.2. Подпомагане и съдействие за подобряване на ресурсното и технологично обезпечаване на земеделското производство /семена, торове, препарати, горива, технологично оборудване и др./ чрез субсидиране и кредитни линии.

 Не е отчетен напредък

Дейност 7.1.3. Съдействие за подобряване на качеството на земеделската продукция съобразено с изискванията на ЕС и въвеждане на схеми за качество.

 Не е отчетен напредък

Дейност 7.1.4. Съдействие за реконструкция и осъвременяване на земеделските стопанства

 В процес на изпълнение

По Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 се реализират следните проекти на частни бенефициенти:

Процедура BG06RDNP001-4.008 Целеви прием за земеделски стопани в сектор „Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“:

- ✓ Проект BG06RDNP001-4.008-0650-C07 „Изграждане и модернизиране на овцеферма в с. Орехово, община Чепеларе“³² на стойност 975 276,99 лв. (2022-2024г.)

Процедура BG06RDNP001-4.012 Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“:

- ✓ Проект BG06RDNP001-4.012-1874-C04 „Модернизиране на земеделско стопанство на Никола Манджуков“³³ в с. Малево на стойност 1 954 583,91 лв. (2023-2025г.)
- ✓ Проект BG06RDNP001-4.012-1857-C05 „Обновяване и модернизация на земеделско стопанство на „Петро-С“ ЕООД“³⁴ в с. Орехово на стойност 1 954 181,36 лв. (2023-2025г.)

Процедура BG06RDNP001-6.001 Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“

- ✓ Проект BG06RDNP001-6.001-1013-C01 Стартова помощ за създаване на стопанство на млад фермер³⁵, който приключва през 2024г. в с. Павелско и с.

³² <https://2020.eufunds.bg/bg/0/190/Project/BasicData?contractId=8qnyXF7S7XDC16WI7fwwjA%3D%3D&isHistoric=False>

³³ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/190/Project/BasicData?contractId=QFlcbzyRsZQF3U2DF55evQ%3D%3D&isHistoric=False>

³⁴ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/190/Project/BasicData?contractId=rrl9oyKUZdk3YkNQQfYVKg%3D%3D&isHistoric=False>

³⁵ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/190/Project/BasicData?contractId=%2FL30Em5AYQWxWEuqBIWYIA%3D%3D&isHistoric=False>

Хвойна - създаване на ново насаждение от сливи : създаване на ново насаждение от сливи.

Процедура BG06RDNP001-6.012 Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“

- ✓ Проект BG06RDNP001-6.012-0942-C01 Подпомагане развитието на стопанството на земеделски стопанин Борис Илиев Златков³⁶ в с. Орехово на стойност 29 337 лв. (2023-2028г.)

По Националния план за възстановяване и устойчивост се реализира проект на частен бенефициент:

Процедура BG-RRP-6.004 Инвестиции в технологична и екологична модернизация,

- ✓ Проект BG-RRP-6.004-4354-C03 „Технологична и екологична модернизация на овцеферма в Орехово, община Чепеларе на ПЕТРО-С“³⁷ ЕООД на стойност 796 800 лв. (2024-2025г.)

Дейност 7.1.5. Подпомагане, съдействие, административна и експертна помощ на предприемачите желаещи да развиват култивирано производство на гъби, билки, горски плодове

 Не е отчетен напредък

Дейност 7.1.6. Подпомагане, съдействие, административна и експертна помощ на предприемачите желаещи да отглеждат алтернативни култури заместващи картофопроизводството.

 Не е отчетен напредък

Дейност 7.1.7. Мерки за намаляване на замърсяванията от земеделието и животновъдството.

 Не е отчетен напредък

Мярка 7.2. Обмяна на ноу-хау със съседни общини и с трансгранични партньори за приложими иновативни технологии и практики в земеделието

 Не е отчетен напредък

³⁶ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/190/Project/BasicData?contractId=6l2tBUbrBXWVQjLIMqj%2BQ%3D%3D&isHistoric=False>

³⁷ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/190/Project/BasicData?contractId=her9sLlk0oP%2FCeJJmeY4uw%3D%3D&isHistoric=False>

Приоритет 8. Развитие на екологично земеделие и животновъдство

Мярка 8.1 Стимулиране развитието на биодинамичното земеделие и животновъдство.

Дейност 8.1.1. Стимулиране и подпомагане на производители на био зеленчуци и био плодове.

☐ Не е отчетен напредък

Дейност 8.1.2. Административни и данъчни облекчения за предприемачи, желаещи да изградят биоферми на територията на община Чепеларе/

☐ Не е отчетен напредък

Дейност 8.1.3. Стимулиране и подпомагане на производители занимаващи се с отглеждане и сертифициране на биокартофи

☐ Не е отчетен напредък

Дейност 8.1.4. Насърчаване на производството и използването на биоторове

☐ Не е отчетен напредък

Дейност 8.1.5. Насърчаване на производството на пчелен мед и други пчелни продукти.

☐ Не е отчетен напредък

Дейност 8.1.6. Намаляване замърсяванията от преработващата и хранително-вкусовата промишленост.

☐ Не е отчетен напредък

1.2.3. Напредък по Стратегическа цел 3.

За постигане на **Стратегическа цел 3 „Подобряване на достъпа до качествени здравни, социални, културни услуги и спорт“** са формулирани 2 приоритета

- ✓ Приоритет 9. Превръщане на град Чепеларе в разпознаваем център на спорта с налагането на бранд „Чепеларе-европейски град на спорта“, чрез развитие на атрактивни и устойчиви форми на спорт и тренировъчна дейност
- ✓ Приоритет 10. Обновяване на социалната и здравната инфраструктура и подобряване качеството на предоставяните от тях услуги

Приоритет 9. Превръщане на град Чепеларе в разпознаваем център на спорта с налагането на бранд „Чепеларе-европейски град на спорта“, чрез развитие на атрактивни и устойчиви форми на спорт и тренировъчна дейност

Мярка 9.1 Изграждане и обновяване на спортната инфраструктура и услуги на територията на общината.

Дейност 9.1.1. Изграждане на стрелкови комплекс и Ролбан

 Не е отчетен напредък

Дейност 9.1.2. Реконструкция на съществуващата спортна база

 Не е отчетен напредък

Дейност 9.1.3. Изграждане на многофункционална спортна зала, подходяща за организиране на мероприятия свързани с привличане на чуждестранни експерти и различни федерации

 Не е отчетен напредък

Дейност 9.1.4. Изграждане на покритие (балон) на тенис корта в гр. Чепеларе

 Не е отчетен напредък

Дейност 9.1.5. Реконструкция на тенис корта в гр. Чепеларе

 Изпълнен

Обектът е включен в обхвата на проект „Подобряване на условията за спорт чрез обновяване на спортна площадка в Община Чепеларе“, финансиран от Министерство на младежта и спорта през 2022г.

Дейност 9.1.6. Въвеждане на практика за домакинстване на тенис турнири и мероприятия на тенис корта в гр. Чепеларе.

 В процес на изпълнение

Чепеларе е домакин на следните тенис – турнири:

- ✓ Турнир по тенис на корт за купа „Чепеларе – Амер Спортс“ във възрастови групи до 10 и до 12 години – момичета и момчета през 2024 г.

Дейност 9.1.7. Провеждане на спортни мероприятия „Чепеларски търкала“.

 В процес на изпълнение

Състезанието по планинско колоездене „Чепеларски търкала“ е уникално по рода си състезание по планинско бягане и планинско колоездене, което се провежда ежегодно. Организатори са Община Чепеларе и Trip Elements. Състезанието се състои

от общо 4 различни Търкала с различна посока и с приблизителна дължина от 20 км всяко. Началото и краят на всяко Търкало се намират на централния площад „Олимпийски“, като крайният трак на състезанието наподобява четирилистна детелина. Общата дължина на състезанието е 86 км, с положителна денивелация от 2950м.

Дейност 9.1.8. Организиране и провеждане на спортни състезания и събития

В процес на изпълнение

Община Чепеларе има традиции в организирането на спортни събития и поддържа богат спортен календар. По значими събития, организирани през периода 2021-2024г. са:

- ✓ Международен олимпийски ден – празник на хората в Чепеларе (юни, ежегодно)
- ✓ „Ride on Cherehare“ - годишна мото среща на собственици на мотори „Харли Дейвидсън“ с участници от София, Атина и Истанбул (2022г.)
- ✓ През 2023 година спортните събития са ориентирани към популяризиране на бранда „Чепеларе – европейски град на спорта“;
- ✓ Спортен празник в чест на Екатерина Дафовска (февруари) за отбелязване единственият златен олимпийски медал по биатлон, който тя донесе за България от Зимна Олимпиада в Нагано 1998 г.
- ✓ Състезания по биатлон в к.к. Пампорово, местността „Язовира“ за купа „Арагорн“ в дисциплините „спринт“ и „индивидуално“. Организатори на спортното събитие са СК „Рожен Чепеларе – 2016“ и Община Чепеларе, спонсор фирма „АРАГОРН“ ЕООД (февруари 2024 г.)
- ✓ Състезание по спортно ориентиране за купа „Чепеларе“ (август, 2024г.)
- ✓ Състезание по летен биатлон за Купа „Ростер“, за Купа „Рожен“.

Община Чепеларе е домакин на следните събития:

- ✓ Европейско първенство по ски ориентиране, което е и кръг от Световната купа, и успоредно с това - на Световно първенство за младежи до 23 години и Световно първенство за ветерани. Участват представители на 22 държави. Първенствата са организирани от Българска федерация по ориентиране с подкрепата на Министерство на младежта и спорта, Община Чепеларе и със съдействието на Община Смолян (2022г.)
- ✓ Държавен Личен и Отборен Шампионат (ДЛОШ) по планинско колоездене в дисциплината спускане в МТБ зона Мечи чал на най-дългото трасе „Брус Лий“, организатор Българска Федерация Колоездене, Riders United и разбира се с домакинството на Община Чепеларе и к.к. Пампорово (юли 2024г.)
- ✓ Етапно състезание по колоездене на шосейни колела, купа „Чепеларе“ в няколко етапа: I-ви ЕТАП – купа „Снежанка“ – пред Община Чепеларе -

изкачване на връх Снежанка- 17800 метра/17 км 800 м./; II-ри ЕТАП – Критериум в к.к Пампорово с дължина на една обиколка 2 км. 200 м. (август 2024г.)

- ✓ Конференция „Старт на олимпийската учебна 2023/24 година в България“, посветена на 100-годишнината на Българския олимпийски комитет. Тя има за цел усъвършенстване на сътрудничеството на БОК с образователната система, за да може да се повиши ролята на спорта и състезателната дейност за развитие на нравственото възпитание на младежта в училищата (2023г.)

През 2022г. спортните събития на Община Чепеларе, проведени под егидата на „Европейски град на спорта 2022“ са представени на конференция в София в присъствието на кметове и представители на всичките 14 български селища, носещи титлите „Европейски градове на спорта“.

Дейност 9.1.9. Определяне на място, монтиране и оборудване на стена за алпийско катерене

 Не е отчетен напредък

Дейност 9.1.10. Изграждане на трибуни и ограда на мини футболното игрище с изкуствена настилка в училище СУ „Васил Делчев“ гр. Чепеларе

 Изпълнен

Проект „Подобряване на условията за спорт и отдих в град Чепеларе чрез изграждане на трибуни на мини футболно игрище с изкуствена настилка“ се реализира с финансиране от Министерството на младежта и спорта на стойност 115 656,32 лв. (2022-2023)

Дейностите включват: изграждане на трибуни към съществуващо игрище за мини-футбол с единични PVC седалки в частта на имота, която е между улицата и игрището, посредством моделиране на терен, състоящо се в изравняване и терасиране.

Дейност 9.1.11. Подмяна на изкуствена настилка и ремонт на прилежаща инфраструктура на мини футболно игрище в училище СУ „Васил Дечев“, гр. Чепеларе

 Не е отчетен напредък

Дейност 9.1.12. Реконструкция и изграждане на нови въжени линии и ски-писти в община Чепеларе

 В процес на изпълнение

Възстановена е детската ски писта, намираща се в местността „Дьортевото“ с приблизителна дължината 200 метра. Пистата е оборудвана с една новодоставена транспортна ски пътека, ще работи също и съществуващия ски влек за по-големите деца. Монтирано е 1 вентилаторно оръдие за сняг, което работи с пълна сила вече

трети ден, тъй като минусовите температури го позволяват. Осигурена е и снегоотпкваща машина, предоставена от „Пампорово“ АД. Средствата са осигурени от капиталови разходи – общински и държавен бюджет.

Дейност 9.1.13. Изграждане на стадион за биатлон и писти за ски бягане и биатлон



В процес на изпълнение

През 2022 г. – 2023г. се извършват подготвителни дейности за реализиране на проекта – придобиване на земя, изработване на проект за подробен устройствен план и др.

Дейност 9.1.14. Изграждане на улей за сноуборд.



Не е отчетен напредък

Дейност 9.1.15. Изграждане на спортни обекти за спускане с планински велосипеди



Не е отчетен напредък

Дейност 9.1.16. Изграждане на спортни обекти за скално катерене



Не е отчетен напредък

Дейност 9.1.17. Изграждане на обекти за екстремни спортове: бърнди-скокове, делтапланери, скейтборд и др.



Не е отчетен напредък

Дейност 9.1.18. Изграждане на Многофункционална спортна площадка в община Чепеларе



Изпълнен

През 2023-2024г. Община Чепеларе реализира проекта с финансиране от Министерство на младежта и спорта по Наредба №4 от 08.07.2019г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти - държавна и общинска собственост Договор за финансово подпомагане 23-00-199 на 21.12.2022 г. на стойност 624 124,82 лв.

След ремонтните дейности комплексът разполага с два тенис корта, покрити с многопластова спортна настилка. Това са т. нар. "бързи" настилки, които заменят досегашния „шамот“. Настилката от акрилно покритие не се влияе от атмосферните условия, дълготрайна е и е удобна за експлоатация и поддръжка. В комплекса има още едно комбинирано игрище за футбол, баскетбол и волейбол с нова настилка. Подменени са фитнес уредите на открито, изградена е тенис маса, както и маси за шахмат и настолни игри. Ремонтирани са трибуните, огражденията и сградата към

спортния комплекс. Инсталирана е и система за видеонаблюдение с цел ефективно опазване на спортната площадка и съоръженията.

Мярка 9.2 Реконструкция и изграждане на паркове и градини.

Дейност 9.2.1. Изграждане на парк и алея за отдих в м. „Таванчика“.

Не е отчетен напредък

Дейност 9.2.2. Обособяване, благоустрояване и озеленяване на нови междублокови и паркови пространства.

Не е отчетен напредък

Дейност 9.2.3. Рехабилитация на съществуващите паркови и междублокови пространства

В процес на изпълнение

В град Чепеларе

През 2023 г. е изпълнен обект „Реконструкция на паркинг и междублоково пространство в УПИ I, кв. 17, гр. Чепеларе“ с целеви трансфер от държавния бюджет. Изпълнен е ремонт и реконструкция на междублоково пространство, намиращо се при блокове СКИОР БНБ, СКИОР 4 и СКИОР 5.

В малките населени места

Проекти, финансирани от ПУДООС от Националната кампания „Чиста околна среда“ - 2021г.

- ✓ Обновление и естетизиране на парка в село Хвойна на стойност 10 000 лв.;
- ✓ Обновление и естетизиране на парка в село Павелско на стойност 9 987,30 лв.;
- ✓ Моят пътър, цветен свят, село Орехово - на стойност 9 998,92 лв.

Дейност 9.2.4. Изграждане на Мултифункционални спортни площадки в община Чепеларе

В процес на изпълнение

През 2024г. в с. Павелско е оборудвана нова фитнес площадка на открито с дарения от завършилите училище в селото - набор 1975 и със съдействието на Община Чепеларе

През 2024г. е разработено проектно предложение „Модернизация и развитие на спортната инфраструктура чрез обновяване на многофункционална спортна площадка в УПИ III - терен за спорт, кв. 94 по плана на село Павелско, общ. Чепеларе,“ за финансиране от Министерството на младежта и спорта на стойност 541 850,90 лв., от които безвъзмездна финансова помощ - 476 828,79 лв. През 2025г. проектът е одобрен за финансиране по Национална програма за споделено финансиране на

инвестиционни спортни проекти 2024 г., утвърдена и открита, съобразно реда и условията на чл. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 1 от 6 октомври 2023 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти - държавна и общинска собственост (обн., ДВ, бр. 86 от 2023 г., изм. и доп., бр. 73 от 2024 г.)

Дейност 9.2.5. Благоустрояване на хълма „Св.Никола“

Не е отчетен напредък

Дейност 9.2.6. „Обновяване на централен градски парк с площад и пешеходна алея в УПИ VII-Централен градски парк с пешеходна алея в град Чепеларе“

В процес на изпълнение

Дейността се изпълнява поетапно чрез няколко проекта:

Проект „Интегриран подход за развитие на културни и природни обекти в Чепеларе, България и Просочани, Гърция“ (INTEGRA_TOUR)

Проектът с бенефициент Община Чепеларе е финансиран от Програма INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020. Бюджет на Община Чепеларе е 847 253,53 €. С допълнително споразумение е удължен срокът на проекта до 29.05.2022 г. и са одобрени са допълни дейности по благоустрояване на градския парк на стойност 235 577, 17 евро,

Стойността на строително-ремонтните дейности е в размер на 459 981,34 лв.

През 2022г. приключва изпълнението на проекта, в рамките на който са изградени три детски площадки с атрактивни комбинирани детски съоръжения; реновирана е алейната мрежа на градския парк, в това число и новата 100 метрова писта за бягане, покрита с каучукова настилка; монтираното ново парково осветление с енергоефективни светодиодни осветителни тела. Оформени са зони за отдих с перголи, пейки и маси за игра на табла и шах, монтирани две нови чешми, допълнително озеленяване, ограда, видеонаблюдение и др.

През 2023г. е извършен текущ ремонт на площад „Олимпийски“ гр. Чепеларе

Проект ОР-24.001-1220 Обновяване на централен градски парк с площад в УПИ VII – Централен градски парк с пешеходна алея в гр. Чепеларе

Проектът е включен за финансиране от Инвестиционната програма за общински проекти по чл. 107, ал. 13 от ЗДБРБ. Между МРРБ и Община Чепеларе е подписан Договор РД-02-30-416/26.03.2024г. за изпълнение на СМР на стойност 1 263 900 лв.

Проектът е в процес на изпълнение.

Обектът представлява част от ул. „Васил Дечев“, обособена като пешеходна зона в центъра на гр. Чепеларе, в която се намират търговски обекти и обекти за отдих и развлечения, с дължина около 400 м. Асфалтова настилка и тротоари от двете страни с ширина около 1,40 м. По улицата преминава главен канализационен клон, водопровод, които са изградени преди около 100 години.

**Доклад за резултатите от междинна оценка за периода 2021 – 2024г.
на План за интегрирано развитие на община Чепеларе (2021 – 2027г.)**

През 2024 г. са осъществени дейности по премахване на пътното платно и съществуващите тротоари и изграждане на единно пешеходно пространство. Изградени са пешеходна зона с настилка от унипаваж в правоъгълен растер. Подменена е остарялата водопроводна мрежа, включително сградните отклонения и е изградена нова канализационна мрежа за повърхностно отводняване на улицата; ново осветление за цялата зона; вкл. реконструкция на съществуваща телефонна мрежа, кабелна ТВ и интернет мрежа, благоустройство и озеленяване.

Дейност 9.2.7. Изграждане на зимен и летен атракционен парк в м. „Дьортевото“, гр. Чепеларе

 Не е отчетен напредък

Дейност 9.2.8. Благоустрояване на Градски парк

 Не е отчетен напредък

Дейност 9.2.9. Ремонт на ОДЗ „Чепеларе, база „Здравец“

 Не е отчетен напредък

Дейност 9.2.10. Модернизация и реконструкция на туристически дом „Пещерняк“ и преустройването му в база подходяща за организиране и провеждане на детски лагери и зелени училища, както и за предоставяне на здравни и социални услуги.

 Не е отчетен напредък

Мярка 9.3. Дейности по разработване и популяризиране на този бранд и превръщането му на разпознаваем и привлекателен слоган за общината

 Не е отчетен напредък

Приоритет 10. Обновяване на социалната и здравната инфраструктура и подобряване качеството на предоставяните от тях услуги

Мярка 10.1. Насърчаване на социалното приобщаване и намаляването на бедността, чрез осигуряване на адекватна социална инфраструктура и интеграция на групите в неравностойно положение.

Дейност 10.1.1. Продължаване на дейността на „Център за услуги в домашна среда“ в гр. Чепеларе

 В процес на изпълнение

Проект BG05SFPR002-2.001-0037-C04 „Грижа в дома в община Чепеларе“³⁸

През периода 2022-2025г. Община Чепеларе изпълнява проекта, финансира от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 на стойност 545 032,81 лв. Целта е осигуряване на подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. В края на 2024 г. по проекта са обслужени 95 потребителя. Назначени 15 домашни помощници, 1 диспечер, 2 медицински сестри, 1 шофьор, 1 психолог.

Проект BG05SFPR002-2.012-0012-C01 „Иновативни здравно-социални услуги в община Чепеларе“³⁹

За осигуряване на непрекъснатост и продължение на услугата „Грижа в дома“ след 16.01.2025 г. Община Чепеларе ще стартира изпълнението на проект „Иновативни здравно – социални услуги“, Процедура BG05SFPR002-2.012, финансирана по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027. Дейностите ще се изпълняват за периода 17.01.2025 г. до 31.12.2026 г. Обща стойност на проекта е 102 985,84 лв - 100% безвъзмездна финансова помощ.

През периода 2021-2024 продължава предоставянето на следните услуги – делегирани от държавата дейности:

- ✓ По Механизма „Лична помощ“ – социалната услуга „Личен асистент“. Към края на 2024 г. са назначени 61 лични асистенти и 60 потребители.
- ✓ „Асистентска подкрепа“ - До 31.12. 2024 г. са обслужени 30 потребителя.

Дейност 10.1.2. Изграждане на Дом за стари хора с Дневен център.



Не е отчетен напредък

Дейност 10.1.3. Изграждане на Център за социална рехабилитация и интеграция



Не е отчетен напредък

Дейност 10.1.4. Продължаване на функционирането на Домашен социален патронаж



В процес на изпълнение

Проект BG05M9OP001-6.002-0078-C01 Патронажна грижа + в община Чепеларе⁴⁰

През периода 2021-2022г. Община Чепеларе изпълнява проекта, финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 на стойност 59 059,45 лв. Общ брой обслужени потребители са 51 лица.

Проект BG05M9OP001-6.004-0071-C01 Патронажна грижа + в община Чепеларе⁴¹

³⁸ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/190/Project/BasicData?contractId=ISpKGeLswBd1HUNugmbPPQ%3D%3D&isHistoric=False>

³⁹ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/190/Project/BasicData?contractId=YOKFUONADcfNYnuftcuNDQ%3D%3D&isHistoric=False>

⁴⁰ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/190/Project/BasicData?contractId=xeALciKnsVr2%2Bm8FTI8c6A%3D%3D&isHistoric=False>

⁴¹ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/190/Project/BasicData?contractId=pftHKHxNb7c60566Aa5%2BUA%3D%3D&isHistoric=False>

През периода 2022-2023г. Община Чепеларе изпълнява проекта, финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 на стойност 30 902,40 лв. Общ брой обслужени потребители са 38 лица.

Дейност 10.1.5. Дооборудване и обзавеждане на материалната база за развитие на социалната услуга „Обществена трапезария“.

В процес на изпълнение

Проект BG05FMOP001-5.001-0218-C08 „3-1 - Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19 в община Чепеларе“⁴²

През 2021-2022г. Община Чепеларе изпълнява проекта, финансиран от операция „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ по Оперативна програма „Храни и/или основно материално подпомагане“ 2014 – 2020 г. на стойност 304 717,71 лв. Включени са 369 потребители от град Чепеларе, село Павелско, село Хвойна, село Малево, село Орехово, село Забърдо, село Богутево, село Острица и село Лилеково.

Проект BG05SFPR003-1.001-0145-C03 Топъл обяд в община Чепеларе⁴³

През периода 2022-2026г. Община Чепеларе изпълнява проекта, финансиран Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021-2027 на стойност 570 234,42 лв.

Чрез подпомагането с топъл обяд се цели ежедневно да се осигури здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на 180 потребители, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава от 9 населени места в Община Чепеларе - град Чепеларе, село Богутево, село Острица, село Лилеково, село Забърдо, село Павелско, село Хвойна, село Малево, село Орехово.

През 2024г. БЧК - Смолян подпомага най-уязвимите граждани в община Чепеларе с хранителни и хигиенни продукти. Предоставянето на помощта е в изпълнение на операция „Подкрепа“ по Програма „Храни и основно материално подпомагане“ на АСП, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс, с Управляващ орган Агенцията за социално подпомагане (АСП).

Община Чепеларе е включена в проект BG05SFPR003-1.006-0001-C10 „Детска кухня“, финансиран по Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021-2027, с бенефициент Агенция за социално подпомагане,.

Основната цел на проекта е осигуряване на здравословно и пълноценно хранене на деца от 10 месеца до 3 години, допълнено със специфична съпътстваща подкрепа за социално приобщаване и преодоляване на последиците от бедността.

От 02.01.2024 г. на територията на град Чепеларе се предоставят ваучери на 8 деца от целевата група за детска кухня, на които се приготвя обедно хранене, при условие,

⁴² <https://2020.eufunds.bg/bg/0/190/Project/BasicData?contractId=votG5ycvbP1LK86%2FjcHdGA%3D%3D&isHistoric=False>

⁴³ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/190/Project/BasicData?contractId=r%2Bmz3UYiudIJYwxufuyY%2Bg%3D%3D&isHistoric=False>

че такова не е осигурено по друг ред. Единичната стойност на ваучера за детска кухня, която включва единствено средно претеглена стойност на разходите за продуктите, влагани в приготвянето на тристепенно меню за обяд (супа, основно ястие и десерт) е определена в размер на 2,08 лв. Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е до 30.11.2027 г.

Дейност 10.1.6. Ремонт, обновяване и изграждане на клубовете на пенсионера и на клуба на инвалида.

 В процес на изпълнение

Проект „Закупуване на обзавеждане за клуб на инвалида в гр. Чепеларе“

През 2022г. се реализира проекта, финансиран от Министерство на труда и социалната политика чрез Агенцията за хората с увреждания по Национална програма за заетост на хората с увреждания на стойност 7 145 лв.

Създадени са подходящи условия за труд на две лица с трайни увреждания, работещи в Клуба на инвалида в гр. Чепеларе и имащи затруднения при придвижването си.

През 2022 г. със собствени средства Община Чепеларе подмени дограмата и направи разширение на входната врата, за да могат да влизат безпрепятствено хората с колички.

Дейност 10.1.7. Създаване на Център за обществена подкрепа.

 Не е отчетен напредък

Дейност 10.1.8. Изграждане на инфраструктура подобряваща достъпа на хора с увреждания до сградите предоставящи публични услуги.

 В процес на изпълнение

Проект „Осигуряване на достъп до „Музей на Родопския карст“

През 2022г. Община Чепеларе реализира проекта, финансиран от Агенция за хората с увреждания на стойност 35 144 лв.

Платформата, позволява достъпа на хора с намалена двигателна способност до Музей на родопския карст в Чепеларе. При нужда посетителят трябва да сигнализира служителите в Музея посредством бутон, поставен в началото на рампата.

Дейност 10.1.9. Проект „Приеми ме“ (допълнена)

 В процес на изпълнение

От 2022г. Община Чепеларе има сключено споразумение с Агенция „Социално подпомагане“ , относно предоставянето на приемна грижа на територията на общината. Дейността по приемна грижа се осъществява в момента от едно приемно семейство в с. Павелско. До 25.10.2024 г. месец бяха настанени две деца, които

намериха осиновители. От 25.10.2024 г. са настанени две реинтегрирани от семейната среда деца.

Дейност 10.1.10. Проект BG05SFPR002-2.002-0051-C01 „Укрепване на общинския капацитет на Община Чепеларе“ (допълнена)⁴⁴

В процес на изпълнение

През периода 2023-2025г. Община Чепеларе изпълнява проекта, с финансиране от Европейския социален фонд + чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Общата стойност е 35 364 лева.

Основната цел е повишаване качеството на предлаганите социални услуги, като подкрепи реформирането на системата на социалните услуги и улесняването на преходите към новите механизми на местно ниво, чрез развитие и укрепване на общинския капацитет на Община Чепеларе.

Дейност 10.1.11. „Център за настаняване от семеен тип” с. Павелско (допълнена)

В процес на изпълнение

Социалната услуга е делегирана държавна дейност с доставчик община Чепеларе. В процеса на работа центърът се утвърждава като нова форма на социална услуга от резидентен тип, насочена към деца, които имат нужда от грижа извън тяхното семейство. В ЦНСТ Павелско се настаняват деца от 7 до 14 годишна възраст. Капацитет на Центъра - 10 места. Към 31.12.2024 г. настанените деца са 6.

За подобряване на материално – техническата база през периода 2022-2024г. са закупени: ново кухненско обзавеждане, климатици, лек автомобил – бус.

Дейност 10.1.13. Предоставени за закупуване на техника на потърпевшите семейства от пожара (допълнена)

Изпълнен

През 2023г. от „Фонд социална закрила“ към МТСП, Община Чепеларе получава 9 800 лв. за закупуване на техника на потърпевшите семейства от пожара на 26.03.2023г., при който изгаря жилищна сграда и цялата покъщнина.

Община Чепеларе като институция и жителите и предприемат множество действия за подпомагане на живущите в сградата домакинства. На заседание на Общински съвет – Чепеларе, проведено на 30.03.2023г. е гласувана финансова помощ на потърпевшите от пожара – на 2-те семейства с деца по 2500 лв., а на останалите 4

⁴⁴

<https://2020.eufunds.bg/bg/0/190/Project/BasicData?contractId=POqPhxrBV%2FWdPVS%2BICqrXA%3D%3D&isHistoric=False>

домакинства с до двама души - по 1000 лв. за посрещане на нужди от първа необходимост.

Мярка 10.2. Предоставяне на по-качествени здравни грижи и осъвременяване на здравната инфраструктура в общината.

Дейност 10.2.1. Изграждане на лаборатория за основни изследвания и оборудване с рентген

Не е отчетен напредък

Дейност 10.2.2. Пристройка за асансьор и ремонт на съществуващи санитарни възли в сградата на поликлиника гр. Чепеларе

В процес на изпълнение

През 2024г. се изготвя проект за „Пристройка за асансьор към сграда на Поликлиника в гр. Чепеларе“ УПИ II – Поликлиника, кв. 118 по плана за регулация на гр. Чепеларе, поземлен имот с идентификатор 80371.241.409 по КKKP на гр. Чепеларе, с административен адрес: гр. Чепеларе, ул. „Беломорска“ №44А.

Дейност 10.2.3. Отваряне на лекарски кабинети в Чепеларе предоставящи висококвалифицирана здравна помощ.

В процес на изпълнение

През 2021г. приключва изпълнението на проект BG16RFOP002-2.024-1445-C01 „Развитие на дейността на „Доктор Би - Амбулатория за първична медицинска помощ по дентална медицина - индивидуална практика“ ЕООД“⁴⁵, финансиран по ОПИК 2014-2020г. на стойност 238 917,46 лв. за закупуване на високотехнологично специфично оборудване за поставяне на дентални импланти.

През периода 2023-2025г. „Медицински Център Канеа“ ООД изпълнява Проект BG06RDNP001-19.206-0003-C06 „Закупуване на оборудване за развитие на здравни услуги в Медицински Център в гр. Чепеларе, община Чепеларе, област Смолян“⁴⁶, финансиран от ПРСР 2014-2020г. на стойност 120 860,80 лв.

Проекта предвижда закупуване на специализирано оборудване, е с цел развитие на здравните услуги, свързани с извършване на медицинска дейност за оказване на извънболнична медицинска помощ, диагностика, лечение и рехабилитация на болни, физиотерапия и рехабилитация. Предвижда се закупуване, доставката, инсталиране и пускане в експлоатация на следното оборудване: Комбиниран апарат за електро и ултразвукова терапия; Апарат за магнитна терапия; Апарат за високо интензивна лазерна терапия; Апарат за ударно-вълнова терапия; Апарат за

⁴⁵ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/190/Project/BasicData?contractId=0XcWxvCID1oNbY9WkJq%2FSA%3D%3D&isHistoric=False>

⁴⁶ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/190/Project/BasicData?contractId=TYN7tyMnGNZp12luQk2Wng%3D%3D&isHistoric=False>

таргетирана радиочестотна терапия; Ехограф и софтуер за управление на медицински център.

Дейност 10.2.4. Осигуряване на лекарски практики за всички населени места

В процес на изпълнение

В края на 2024г. лекарски практики има в гр. Чепеларе и селата Забърдо, Хвойна и Павловско.

Дейност 10.2.5. Изграждане на съвременна здравна база за лечение на белодробни заболявания

Не е отчетен напредък

Дейност 10.2.6. Проучване на възможностите за довеждане на минерална вода до гр. Чепеларе и к.к. Пампорово

Не е отчетен напредък

Дейност 10.2.7. Ремонтване на здравните служби в селата: Павелско, Хвойна и Забърдо

Не е отчетен напредък

Дейност 10.2.8. Провеждане на експертно проучване и популяризиране на възможностите и предпоставките за климатолечение на белодробни заболявания в община Чепеларе

В процес на изпълнение

През 2022г. е подписан Меморандум за сътрудничество между Община Чепеларе и Медицински университет – Варна. Целта на Меморандума е да създаде условия за подобряване на социално-икономическата среда в Община Чепеларе чрез развитие на здравеопазването и медицината, популяризиране на туризма и културно-историческото наследство на района. Страните декларират своята подкрепа за задълбочаване на връзките помежду си и разгръщане на секторите с най-голям потенциал за развитие – туризъм, образование, здравеопазване и медицина.

Медицински университет - Варна и Община Чепеларе ще си сътрудничат в развитието на човешкия капитал на Община Чепеларе чрез инициативи за повишаване на знанията и уменията на младите и активни граждани в сферата на туризма и здравеопазването и ще работят за създаване на среда за тяхната съвременна изобретателност, реализация и предпоставки за европейска конкурентоспособност.

През 2024г. за популяризиране на потенциала за климатолечение е проведена Конференция на тема „Съвременен поглед върху климатолечението в община

Чепеларе“ (2024г.) в в КК „Пампорово“, по повод 90-годишния юбилей на курорта. Организиран е от Община Чепеларе в партньорство с Български съюз по балнеология и СПА туризъм и „Пампорово“ АД. Целта на конференцията е да бъдат посочени и да се отличат възможностите на курортния комплекс „Пампорово“ и региона в областта на климатолечението, както и да се даде нов и модерен поглед към дестинацията чрез задълбочено изследване по темата на хабилитирани лица от академичните среди и експерти от туристическия бранш от страната и чужбина.

През 2024г. са организирани инициативи за профилактика :

- ✓ Безплатни изследвания за рак на дебелото черво в лаборатория „Нолекс“ в Чепеларе в рамките на Националната скринингова кампания „Заедно срещу рака на дебелото черво“, организирана от Фондация „Лъчезар Цоцорков“ и РЗИ -Смолян;
- ✓ Седмица на отворените врати за ранно откриване на туберкулоза „Да! Ние можем да спрем туберкулозата!“, организирана от МБАЛ и РЗИ и Смолян в рамките на националната кампания;
- ✓ Мобилна оптика ПроГлед, със съдействието на Община Чепеларе, организира кампания за цялостни очни прегледи в гр. Чепеларе.

Мярка 10.3. Подкрепа за медицинските практики и аптекната мрежа във всички населени места от общината

Не е отчетен напредък

Мярка 10.4. Насърчаване на раждаемостта чрез пакет от финансови стимули и предоставяне на допълнителни социални услуги в помощ на родителите

В процес на изпълнение

Община Чепеларе продължава установената практика за предоставяне на еднократна финансова помощ в размер на 1000 лева за новородени деца при навършване на 1 година с адресна регистрация в община Чепеларе, съгл. Правилника за условията и реда за отпускане на финансова помощ за новородено дете и на еднократна финансова помощ на нуждаещи се граждани на територията на община Чепеларе.

1.2.4. Напредък по Стратегическа цел 4.

В ПИРО няма изведена Стратегическа цел 4., но за целите на отчетността е запазена съществуващата номерация.

1.2.5. Напредък по Стратегическа цел 5.

За постигане на Стратегическа цел 5 „Подобряване и развитие на общинска инфраструктурата, повишаване на енергийната ефективност в публичния и частния сектор“ са формулирани 5 приоритета

- ✓ Приоритет 11. Подобряване на свързаността и достъпността на пътната инфраструктура и уличната мрежа.
- ✓ Приоритет 12. Обновяване на водоснабдителната инфраструктура и услуги
- ✓ Приоритет 13. Повишаване на енергийната ефективност, чрез изграждане на алтернативни енергийни източници и обновяване на енергийната инфраструктура
- ✓ Приоритет 14. Обновяване и осъвременяване на съобщителната мрежа и цифрова свързаност
- ✓ Приоритет 15. Изграждане и благоустрояване на специализираните инфраструктури.

Приоритет 11. Подобряване на свързаността и достъпността на пътната инфраструктура и уличната мрежа.

Мярка 11.1. Изграждане на регионалната транспортна свързаност.

Дейност 11.1.1. Изпълнение на проект за изграждане на обходна пътна артерия през град Чепеларе

Не е отчетен напредък

Мярка 11.2. Изграждане и рехабилитация на общинската пътна инфраструктура и привеждането ѝ в съответствие с европейските изисквания.

Дейност 11.2.1. Рехабилитация на път SML3314 /Хвойна – Чепеларе/ - м. Чудни мостове

В процес на изпълнение

През 2021г. са изпълнени неотложни възстановителни работи по път SML /II-86 Хвойна – Чепеларе/ - местността „Чудните мостове“ от км. 9+200 до км.16+200 от км. 9+200 до км.16+200, на стойност 250 035 лв. с целеви трансфер.

През 2024г. е извършен текущ ремонт на отсечката от хижа „Скални мостове“ до главния път за с. Забърдо с приблизителна дължина 16 км, водеща към една от най-впечатляващите природни забележителности в община Чепеларе – Чудните мостове.

Дейност 11.2.2. Рехабилитация и изграждане на път SML2310 Хвойна – Павелско – х. Пашалийца

 Не е отчетен напредък

Дейност 11.2.3. Рехабилитация и изграждане на път SML3313 /Хвойна – Чепеларе/ - Студенец

 Не е отчетен напредък

Дейност 11.2.4. Рехабилитация и изграждане на път SML3321 Чепеларе – м. Асенец – х. Изгрев

 Не е отчетен напредък

Дейност 11.2.5. Рехабилитация на път SML3315 /Хвойна – Чепеларе/ - Богутево

 Не е отчетен напредък

Дейност 11.2.6. Рехабилитация и изграждане на път SML3319 /Хвойна – Чепеларе/ - Дряновец

 Не е отчетен напредък

Дейност 11.2.7. Рехабилитация на път SML3320 Богутево - Лилеково

 В процес на изпълнение
През 2024г. е извършен текущ ремонт на улици и път SML 3320 с. Богутево, Острица и Лилеково.

Дейност 11.2.8. Рехабилитация и изграждане на път SML3325 /Чепеларе – Рожен/ - м. Караманица - Чепеларе

 Не е отчетен напредък

Дейност 11.2.9. Рехабилитация и изграждане на път SML2322 /IV-86054 – Орехово/ - х. Персенк

 Не е отчетен напредък

Дейност 11.2.10. Изготвяне на ПУП на местност Асенец

 Не е отчетен напредък

Дейност 11.2.11. Реконструкция и основен ремонт на участък от път в Горна махала в с. Зорница (допълнен)

 В процес на изпълнение

През 2023г. започва изпълнението на обекта с финансиране от общинския и държавния бюджет.

Мярка 11.3. Изграждане и рехабилитация на вътрешно-уличната мрежа.

Дейност 11.3.1. Реконструкция / рехабилитация на вътрешна улична мрежа в общината

В процес на изпълнение

В гр. Чепеларе

През 2022г. приключва проект BG06RDNP001-7.001-0045-C03 „Реконструкция и рехабилитация на ул. „24-ти май“ - гр. Чепеларе от км. 0+000 до км. 1+159.18 и на улица „Младост“ о.т. 336, о.т. 335, о.т. 87, о.т. 83 гр. Чепеларе“ с финансиране по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.⁴⁷

През 2024г. за финансиране от Инвестиционната програма за общински проекти по чл. 107, ал. 13 от ЗДБРБ са включени:

- ✓ Проект ОР-24.001-1217 Реконструкция на ул. „Христо Ботев“, гр. Чепеларе; Между МРРБ и Община Чепеларе е подписан Договор РД-02-30-1022/25.06.2024 за изпълнение на СМР на стойност 2 932 400лв.
- ✓ Проект ОР-24.001-2580 „Реконструкция на улица „Васил Дечев“ от о.т. 678 до УПИ I-2167,2158-Автогара, и улица „Хан Аспарух“ от о.т. 577 до о.т. 116, град Чепеларе, община Чепеларе“. Между МРРБ и Община Чепеларе е подписан Договор РД-02-30-32/16.06.2025 - СМР на стойност 855 900 лв.

През периода 2021-2024г. са изпълнени ремонти, вкл. текущи ремонти по уличната мрежа:

- ✓ гр. Чепеларе - улиците „Мурджовска“, „Христо Ботев“, „Васил Дечев“ (до блок „Скиор 5), „Св. Св. Кирил и Методий“ (от ул. „24 май“ до ул. „Дичо Петров“), „Хан Аспарух“, „Протойерей Евстатий Янков“, „Васил Левски“, „Здравец“, „Спартак“, „Йордан Данчев“, Марчовска“, „Орфей“, „Рожен“, „Чая“, „Чернатица“, „Кирил Маджаров“, „Люляк“, „Синчец“, „Бельовска“, „Калин Кехая“, „Беломорска“, „Родопи“, „Братан Шукеров“, „Пролет“, „Спортна“ и др.
 - ✓ Ремонт на стълбищен подход между ул. „Васил Дечев“ и ул. „Калин Кехая“ и между ул. „Васил Дечев“ и ул. „Петър Кузманов“.
 - ✓ Кръстовище на улици „Дичо Петров“ и „Св. Св. Кирил и Методи“ гр. Чепеларе
- Финансиране е осигурено от държавния бюджет.

⁴⁷ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/190/Project/BasicData?contractId=BlvmBFdB%2BrVAup3QXzByGg%3D%3D&isHistoric=False>

В малките населени места на общината:

Проект BG06RDNP001-19.546-0001-C03 „Реконструкция на ул. „Васил Левски“ в село Хвойна, община Чепеларе“⁴⁸

През 2023-2025г. се изпълнява проекта с бенефициент Община Чепеларе.

Общата стойност е 236 547,93 лв.

През периода 2021-2024г. са изпълнени:

- ✓ Текущ ремонт на улици в селата: Богутево, Зорница, Забърдо, Малево, Павелско, Хвойна, Студенец; Проглед; Орехово;

Дейност 11.3.2. Изграждане на нова вътрешна улична мрежа



В процес на изпълнение

През периода 2021-2024г. се отчуждават земи за изграждане на нови улици.

Изготвят се устройствени планове за нова улична регулация.

Изграждат се нови улици или нови участъци в гр. Чепеларе: „Малина“, „Есперанто“, „Туристическа“ и „Съединение“.

Дейност 11.3.3. Рехабилитация на техническата инфраструктура в индустриалните зони на гр. Чепеларе.



Не е отчетен напредък

Дейност 11.3.4. Подмяна на уличните табели



Не е отчетен напредък

Дейност 11.3.5. Изграждане на улица, свързваща път III 8641 и х. Студенец к.к Пампорово



В процес на изпълнение

През 2022-2022г. е извършена реконструкция на централна улица в к.к. Пампорово, финансиран с целеви трансфери по ПМС № 360/10.12.2020г.

През 2023г. е изпълнен текущ ремонт на улица в к.к. Пампорово - старата автогара

Дейност 11.3.6. Изграждане на Паркинг за товарни автомобили.



Не е отчетен напредък

Дейност 11.3.7. Изграждане на ул. „Съединение“



Не е отчетен напредък

Дейност 11.3.8. Рехабилитация на ул. „Никола Чичовски“ о.т. 89 до о.т. 359



Изпълнен

⁴⁸ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/190/Project/BasicData?contractId=oyo8JvTjI62to59Y%2F2fmTg%3D%3D&isHistoric=False>

Проект BG06RDNP001-19.091-0003-C03 Рехабилитация на улица „Никола Чичовски“, от о.т. 89 до о.т. 357, гр. Чепеларе и реконструкция на улица „Ирландия“, гр. Чепеларе⁴⁹

През 2021-2024г. е изпълнен проекта с бенефициент Община Чепеларе.

Общата стойност е 181 696,46 лв. с финансиране от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, Процедура BG06RDNP001-19.091 МИГ „Преспа“ - подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

По проекта е извършена реконструкция и рехабилитация на ул. „Никола Чичовски“ от о.т. 89 до о.т. 357 и ул. „Ирландия“ - гр. Чепеларе.

Дейност 11.3.9. Реконструкция на ул. „Ирландия“

Изпълнен

Дейността е изпълнена по проект BG06RDNP001-19.091-0003-C03 Рехабилитация на улица „Никола Чичовски“, от о.т. 89 до о.т. 357, гр. Чепеларе и реконструкция на улица „Ирландия“, гр. Чепеларе

Дейност 11.3.10. Изграждане на улица „Панорама“ и ул. „Преспа“

В процес на изпълнение

През 2024г. Проект ОР-24.001-1218 Реконструкция на улица „Панорама“ и улица „Преспа“, гр. Чепеларе е включен за финансиране от Инвестиционната програма за общински проекти по чл. 107, ал. 13 от ЗДБРБ. Между МРРБ и Община Чепеларе е подписан Договор РД-02-30-31/16.06.2025 за изпълнение на СМР на стойност 1 400 000 лв.

Приоритет 12. Обновяване на водоснабдителната инфраструктура и услуги

Мярка 12.1. Изграждане и реконструкция на ВИК мрежа, ПСОВ и пречиствателни станции за питейна вода

Дейност 12.1.1. Разширение и модернизация на пречиствателна станция за отпадни води - Пампорово

Не е отчетен напредък

Дейност 12.1.2. Доизграждане на колектори за отпадни води към пречиствателни станции за отпадни води

⁴⁹ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/190/Project/BasicData?contractId=1i8rsSDuKfDt3AgY6uVsOg%3D%3D&isHistoric=False>

 Не е отчетен напредък

Дейност 12.1.3. Реконструкция на ВВМ в Хвойна

 Не е отчетен напредък

Дейност 12.1.4. Изграждане на пречиствателна станция за питейни води в град Чепеларе

 Не е отчетен напредък

Дейност 12.1.5. Реконструкция и възстановяване на колектор Ф 800 до дървопреработващо предприятие на „Секвоя“ ЕООД гр. Чепеларе

 Не е отчетен напредък

Дейност 12.1.6. Аварийен ремонт на открит канал в северна промишлена зона до гатер на ГПК „Гора“

 Не е отчетен напредък

Дейност 12.1.7. Подмяна на азбестови тръби на ВиК мрежата във всички населени места

 Не е отчетен напредък

Дейност 12.1.8. Рехабилитация на съществуваща водопроводна мрежа в с. Павелско

 В процес на изпълнение

През 2022-2023г. е изпълнен основен ремонт на водопровод и ремонт на улица „Зареница“ в с. Павелско със средства по ПМС № 376/05.11.2021 г.

Дейност 12.1.9. Доизграждане на водопроводна мрежа в Павелско , община Чепеларе

 В процес на изпълнение

През 2022 г. – 2024г. се реализира обект „Доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа с.Павелско“, финансиран от целева субсидия.

Подготвено е проектно предложение „Доизграждане на водопроводната мрежа на село Павелско, община Чепеларе, включващо Главен клон – I-е (продължение) и прилежащи водопроводи, както и водопроводен клон Б-с“, за кандидатстване по Интервенция „II.Г.6 – Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони“ от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027г.

Дейност 12.1.10. „Доизграждане на водопроводна мрежа в с. Богутево, община Чепеларе, клон 1, клон 2, клон 3 и клон 4

В процес на изпълнение

През периода се изпълнява проекта за доизграждане на водопроводна мрежа в село Богутево с тръби ПЕВП 90/10:

- ✓ Клон №1 с начало главния клон при ОТ 193 и с трасе по северната улица на селото до моста на р. Богутевска с дължина 617 м и
- ✓ Клон №2 осъществява водозахранването на северозападната част на селото. Началото е при ОТ 145 на главния клон с дължина 250 м.
- ✓ Клон №3 осигурява ключването на селищната водопроводна мрежа, а именно връзката между вече изпълнените главен клон и второстепенен водопроводен клон при ОТ 166 с дължина 184 м.
- ✓ Клон № 4 по улицата между ОТ 166 и ОТ 203 с дължина 119 м.

През 2023г. е подписано допълнително споразумение с МРРБ за финансиране на втората фаза за водопровода в с. Богутево на стойност 451 466 лв. без ДДС за 3-4 клон.

Дейност 12.1.11. Изграждане водопровод Пампорово - Чепеларе

Не е отчетен напредък

Дейност 12.1.12. Рехабилитация на съществуваща водопроводна мрежа в с. Проглед

Не е отчетен напредък

Дейност 12.1.13. Изграждане на водопреносна мрежа и водоем за водоснабдяване на с. Проглед

В процес на изпълнение

През 2021 г. реално започва изграждането на водоема, който устойчиво решава проблема с водоснабдяването в село Проглед.

Дейност 12.1.14. Рехабилитация на магистрален водопровод за водоснабдителна група Орехово – Малево – Хвойна – Павелско (допълнен)

В процес на изпълнение

През 2024г. Проект ОР-24.001-1216 Рехабилитация на магистрален водопровод за водоснабдителна група Орехово – Малево – Хвойна – Павелско е включен в за финансиране от Инвестиционната програма за общински проекти по чл. 107, ал. 13 от ЗДБРБ. Между МРРБ и Община Чепеларе е подписан Договор №РД-02-30-1507/ /08.10.2024г. на стойност 7 598 000 лв. Чрез този водопровод се осъществява транспортиране на питейната вода от извори, намиращи се в землището на с. Орехово, до резервоарите на с. Хвойна и с. Павелско.

Дейност 12.1.15. Проект ОР-24.001-1219 Реконструкция на ул. „Ручей“ от км 0+000 до км 0+195 – гр. Чепеларе (допълнен)

 В процес на изпълнение

През 2024г. Проект ОР-24.001-1219 Реконструкция на ул. „Ручей“ от км 0+000 до км 0+195 – гр. Чепеларе е включен в за финансиране от Инвестиционната програма за общински проекти по чл. 107, ал. 13 от ЗДБРБ на стойност 949 700 лв. Предвижда се изграждане на подпорни стени, пътна част, изграждане на 400 кв.м. тротоарна настилка и цялостна подмяна на ВиК съоръжения.

Мярка 12.2. Изграждане на водоизточници, санитарно-охранителни зони около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване и нови водохващания.

Дейност 12.2.1. Изграждане на канали за отвеждане на скатни води

 Не е отчетен напредък

Дейност 12.2.2. Възстановяване на подпорни стени на дере при бензиностанция на „Лукойл“

 Не е отчетен напредък

Дейност 12.2.3. Възстановяване на подпорна стена и водосток под УПИ III и УПИ IV кв. 57- гр. Чепеларе

 Изпълнен

През периода се извършват строително – монтажни работи по възстановяване на подпорна стена и водосток под УПИ III и УПИ IV в кв.57 гр. Чепеларе, финансиран от Междуведомствената комисията по бедствия и аварии по ПМС № 352/10.12.2020 г.

Дейност 12.2.4. Възстановяване на подпорна стена за укрепване на десния бряг на р. Камбурска, под УПИ X на ул. К. Ванчева - гр. Чепеларе

 Изпълнен

През периода се изграждане подпорна стена за укрепване на десен бряг на р. Камбурска под УПИ X на ул. „Катя Ванчева“ гр. Чепеларе, финансиран от Междуведомствената комисията по бедствия и аварии по ПМС № 352/10.12.2020 г.

Дейност 12.2.5. Проучване и проектиране на допълнителни водоизточници

 Не е отчетен напредък

Мярка 12.3. Регулиране на речните корита с цел намаляване на опасностите от наводнения.

Дейност 12.3.1. Почистване на коритата и укрепване на бреговете на реките в община Чепеларе

Не е отчетен напредък

Дейност 12.3.2. Цялостна корекция на речните корита на р. Сивковска и р. Камбурска в гр. Чепеларе

В процес на изпълнение

През 2023г. започва изграждането на две монолитни ъглови стоманобетонни подпорни стени по десния бряг на р. Сивковска по обект „Подпорни стени по десния бряг на р. Сивковска от о.т. 390 до о.т. 564, гр. Чепеларе, община Чепеларе“ – Етап I:

- ✓ Подпорна стена №1 с дължина 159,30м и височина от 3,95м до 4,5м. Стената започва от о.т.390 и завършва при устоя на моста при о.т.399.
- ✓ Подпорна стена №6 с дължина 44,60м и средна височина 4,05м и започва от изградената подпорна стена при о.т.508 и завършва при устоя на моста при о.т.507 – за ветеринарната лечебница.

Общата дължина на стените е 203,90 м на стойност 1 343 576 лв., с финансиране от Междуведомствената комисията по бедствия и аварии, ПМС №140 от 8 септември 2023 г.

Приоритет 13. Повишаване на енергийната ефективност, чрез изграждане на алтернативни енергийни източници и обновяване на енергийната инфраструктура

Мярка 13.1. Изграждане и обновяване на електропреносната мрежа

Дейност 13.1.1. Подобряване на изградеността и състоянието на електропреносната система във всички населени места на общината

В процес на изпълнение

През 2021г. са подменени стълбове на електропреносната мрежа на улици „24 Май“, „Младост“ и „Беломорска“

През 2022г. са подменени стълбове на електропреносната мрежа на улица „Есперанто“ и село Зорница

Дейност 13.1.2. Частична реконструкция на електромрежата на проблемните места

Не е отчетен напредък

Дейност 13.1.3. Подмяна на уличното осветление с енергоспестяващи осветителни тела в общината.

В процес на изпълнение

През 2021 г. е монтирано енергоспестяващо декоративно осветление покрай река Сивковска.

Проект BG-RRP-4.025-0058-C02 Рехабилитация и модернизация на системите за външно изкуствено осветление в селата Павелско, Хвойна, Забърдо, Богутево, Зорница, Лилеково, Малево, Острица, Орехово, Проглед, Студенец и к.к. Пампорово, на територията на община Чепеларе⁵⁰

През 2023-2025г. се изпълнява проекта с бенефициент Община Чепеларе.

Общата стойност е 539 734,80 лв.

Целта е да се повиши енергийната ефективност на системите за външно изкуствено осветление в селата Павелско, Хвойна, Забърдо, Богутево, Зорница, Лилеково, Малево, Острица, Орехово, Проглед, Студенец, както и обособена зона в к.к. Пампорово (път към хотел „Елина“, път към хотел „Финландия“ и път към ски писта) на територията на община Чепеларе чрез технологично обновление и модернизиране и да подобри условията на живот на местното население, гостите и туристите. Извършена е подмяна на осветителите в системите за външно изкуствено осветление с нови и добавяне на допълнителни ефективни LED осветители, подмяна и добавяне на нови стълбове за улично осветление на определени места, замяна на старите електрически захранващи табла (касети) с нови, които осигуряват централизирано автоматизирано управление и мониторинг на потреблението от системите за външно изкуствено осветление, изграждане на 2 бр. централизирани хибридни фотоволтаични станции, които да осъществяват електрозахранването на улични осветители. Проектът ще допринесе за подобряване на сигурността и комфорта на гражданите, като същевременно ще намали разходите на общината за улично осветление и ще осигури дългосрочна устойчивост.

Мярка 13.2. Изграждане и експлоатация на енергийната инфраструктура и алтернативните източници на енергия.

Дейност 13.2.1. Изграждане на газова инфраструктура на територията на община Чепеларе

Не е отчетен напредък

Дейност 13.2.2. Присъединяване на общинските и държавни обекти към газоразпределителната мрежа

Не е отчетен напредък

⁵⁰ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/190/Project/BasicData?contractId=J1W5fzZ9pEh9kAwbellcuw%3D%3D&isHistoric=False>

Мярка 13.3. Подобряване на енергийната ефективност на общинския сграден фонд.

Дейност 13.3.1. Включване на общината в програми подобряващи енергийната ефективност на обществените сгради (общинска администрация и други общински сгради различни от училищата и читалищата).

В процес на изпълнение

През 2021г. Община Чепеларе се присъедини към проекта REPLACE, финансиран от Програмата за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020 на Европейския съюз, който има за цел да популяризира ползите от и възможностите за подмяна на старо, скъпо и замърсяващо отопление с ново и чисто отопление на основата на възобновяеми енергийни източници. По този проект са събрани и описани реални примери за подмяна на отоплението в различни европейски региони, сред които е и Родопският регион.

През 2022 г. експерти от проекта посещават избрани обекти в общини Ардино, Брацигово, Чепеларе и Кърджали и се срещнат със собствениците, които желаят да подменят съществуващите си отоплителни инсталации (стари печки и котли на твърдо гориво и електронагревателни уреди) с нови, по-ефективни и екологични системи за отопление. В община Чепеларе е избран обект „Подмяна на стар котел на дърва в 3-тажна еднофамилна къща в гр. Чепеларе (BG-CH1)“.⁵¹

Дейност 13.3.2. Саниране и подобряване на енергийната ефективност на кметствата в общината

Не е отчетен напредък

Дейност 13.3.3. Включване на общината в програми подобряващи енергийната ефективност на жилищните и производствените сгради

В процес на изпълнение

Национален план за възстановяване и устойчивост – жилищни сгради

През 2023г. Община Чепеларе подава 7 проектни предложения по НПВУ, Процедура BG-RRP-4.023 Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап I.

От тях 1 проект за МЖС „Скиор 4“ е одобрен за финансиране, а останалите 6 - блокове „Скиор 1“, „Скиор 2“, „Скиор 5“, „Асенец 1“, „Асенец 2“, Блок на ул. „Беломорска“ (Военен блок) са в списък на резерви по процедурата и за тях се очаква допълнително финансиране при освобождаване на финансов ресурс.

⁵¹ <https://replace-project.eu/>

Проект BG-RRP-4.023-3062-C01 Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда блок „Скиор 4“, ид. № 80371.241.1909.3 по КKKP, ул. „Хан Аспарух“ № 4, гр. Чепеларе, община Чепеларе, обл. Смолян⁵²

През 2024 – 2026г. се изпълнява проекта с финансиране от Национален план за възстановяване и устойчивост, по Процедура BG-RRP-4.023 Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап I.

Бенефициент: Община Чепеларе

Стойността на проекта е 1 155 875,96 лв.

Ще бъдат реализирани предписаните в енергийното обследване мерки: топлинно изолиране на външни стени, покрив и под; подмяна на прозорци и врати; мерки по системите за осветление.

Национален план за възстановяване и устойчивост – производствени сгради

Процедура BG-RRP-4.021 Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите

- ✓ През 2024-2026г. се изпълнява 1 проект на частен бенефициент в гр. Чепеларе на стойност 716 850,48 лв.

Процедура BG-RRP-4.026 Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата - Покана 1

- ✓ През 2024г. са подадени, а от 2025г. в процес на изпълнение са 2 проекта на частни бенефициенти в гр. Чепеларе на обща стойност 31 000 лв. за закупуване на фотоволтаични системи.

Мярка 13.4. Широко популяризиране сред обществеността на ползите, възможностите и задълженията за енергийна ефективност и спестявания съгласно българското и европейско законодателство

 В процес на изпълнение

През 2024г. Община Чепеларе се присъединява към поредното издание на най-мощната глобална природозащитна инициатива „Часът на Земята“ на международната природозащитна организация WWF като за 1 час се изключват светлините.

Марка 13.5. Стимулиране ползването на алтернативни/възобновяеми енергийни източници

 В процес на изпълнение

⁵² <https://2020.eufunds.bg/bg/0/190/Project/BasicData?contractId=60sHcmgySYXQiki2kOGLxg%3D%3D&isHistoric=False>

Община Чепеларе изпълнява Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Чепеларе 2021 – 2031г.⁵³

Мярка 13.6. Широко популяризиране сред обществеността на ползите, възможностите и задълженията за Ползване на ВЕИ енергия съгласно българското и европейско законодателство

Не е отчетен напредък

Мярка 13.7. Проучване на възможността за насърчителни мерки, в това число данъчни стимули при изпълнение на мерки за енергийна ефективност и нови ВЕИ мощности

Не е отчетен напредък

Приоритет 14. Обновяване и осъвременяване на съобщителната мрежа и цифрова свързаност

Мярка 14.1. Модернизация на телекомуникационната мрежа на територията на общината

Дейност 14.1.1. Доизграждане на Широколенов Интернет до всички обществени сгради в общината.

В процес на изпълнение

През 2024г. е разработен, а през 2025г. започва изпълнението на проект BG-RRP-7.008-0004-C01 „Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) на Република България - Южен централен район за планиране“⁵⁴

Бенефициент е „ЦЕТИН България“ ЕАД

В обхвата на проекта е включен град Чепеларе.

Целта на проекта е да осигури разгръщането на мрежи с много голям капацитет (ММГК/ Very High Capacity Networks (VHCN) в Южен централен район за планиране, които позволяват високоскоростен пренос на данни.

Мрежата за пренос ще предлага симетрична свързаност със скорости от 10 Gbps до оптични възли в определени общински центрове, съгласно зададените критерии в условията за кандидатстване. Новоизградената мрежа ще бъде управлявана като

⁵³ Решение №223, взето с Протокол № 22 от заседание на Общински съвет – Чепеларе, проведено на 26.02.2021 година.

⁵⁴ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/190/Project/BasicData?contractId=zmqE6kRfpzDdvgoEPWGmbw%3D%3D&isHistoric=False>

технологично неутрална инфраструктура/мрежа и ще бъде предоставяна на други оператори при условия, които са прозрачни, справедливи и недискриминационни. Всички фиксирани и мобилни мрежи в областта на интервенцията ще имат възможност за достъп до най-малко 50% от капацитета. Тази рамка гарантира, че всички потенциални потребители имат еднаква възможност да използват инфраструктурата/мрежата, насърчавайки приобщаваща пазарна среда.

Дейност 14.1.2. Усилия за постигане на цялостно покритие на сигнала на мобилните оператори на територията на цялата община Чепеларе.

Не е отчетен напредък

Мярка 14.2. Проучване на възможностите и изпълнение на дейности по изграждане на свръхбърза широколентова инфраструктура

Не е отчетен напредък

Мярка 14.3. Осигуряване на свързаност към единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на държавната администрация

Не е отчетен напредък

Приоритет 15. Изграждане и благоустрояване на специализираните инфраструктури.

Мярка 15.1. Благоустрояване на специализираните инфраструктури

Дейност 15.1.1. Геодезично заснемане, разширяване и парцелиране на гробищните паркове в община Чепеларе

В процес на изпълнение

През 2024 г. Община Чепеларе закупува земя за разширяване на гробищен парк в гр. Чепеларе

Дейност 15.1.2. Изграждане на алеи, подходи и инфраструктура в гробищните паркове

В процес на изпълнение

Гробищен парк в кв.22 по ЗРП на с. Забърдо

През 2022-2023г. се изпълнява инвестиционен проект за възстановяване на подпорна стена на улица за гробищен парк в кв.22 по ЗРП на с. Забърдо с финансиране от ПМС №471/22.12.2021 г.

През 2023г. се извършва Реконструкция и основен ремонт на улица към гробищен парк с. Забърдо.

През 2022 г. е закупен автомобил с катафалка, финансирани с целева субсидия.

Дейност 15.1.3. Изграждане на ритуални постройки, огради и врати на гробищните паркове.

 Не е отчетен напредък

Дейност 15.1.4. Изграждане на съоръжение за полагане на урни в гр. Чепеларе

 Не е отчетен напредък

Мярка 15.2. Актуализиране на кадастралните карти и регулационните планове.

Дейност 15.2.1. Изработване и актуализиране на кадастралните карти

 Не е отчетен напредък

Дейност 15.2.2. Актуализиране и дигитализация на регулационните планове

 Не е отчетен напредък

1.2.6. Напредък по Стратегическа цел 6.

За постигане на Стратегическа цел 6 „Повишаване на жизнения стандарт чрез конкурентоспособно образование и обучение, култура и културно-историческо наследство“ са формулирани три приоритета

- ✓ Приоритет 16. Инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия живот
- ✓ Приоритет 17. Културна инфраструктура и културно наследство

Приоритет 16. Инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия живот

Мярка 16.1. Обновяване на образователната инфраструктура и подобряване степента на образованост сред гражданите.

Дейност 16.1.1. Изграждане на пътна инфраструктура около училищата и детските градини, намаляващи опасността от пътно-транспортни произшествия.

 В процес на изпълнение

През 2024г. са изпълнени следните дейности по пътната инфраструктура край образователните институции:

- ✓ Текущ ремонт на кръстовище на ул. „Спартак“ и подход за достъп към училище СУ „В. Дечев“ гр. Чепеларе - сграда на гимназията
- ✓ Ремонт на пешеходен подход за достъп между улица „Полк. Дичо Петров“ и двора на СУ „В. Дечев“ - сграда на основно училище

Дейност 16.1.2. Подпомагане развитието на физкултурата и спорта в училищата, чрез обновяване на съществуващите спортни зали.

 Не е отчетен напредък

Дейност 16.1.3. Изграждане на детски площадки и спортни съоръжения на открито и закрито в училищата и детските градини

 Не е отчетен напредък

Дейност 16.1.4. Обновяване на съществуващите детски и спортни площадки

 В процес на изпълнение

Проекти, финансирани от ПУДООС

Националната кампания „Чиста околна среда“ - 2021г.

- ✓ Проект „Реконструкция на детска площадка и създаване на кът за отдих“, с. Забърдо на стойност 10 000 лв.
- ✓ Проект „Моят пътър, цветен свят“ с. Орехово на стойност 9 999 лв.

През 2022 г. за ПГСГСТ гр. Чепеларе е закупен Спортен уред - Комбинирано съоръжение Crossfit.

Дейност 16.1.5. Изграждане на нови детски площадки в община Чепеларе

 В процес на изпълнение

Проекти, финансирани от ПУДООС

Националната кампания „Чиста околна среда“ - 2021г.

- ✓ Проект „Малък рай за децата на с. Богутево“ на стойност 9 484,50 лв.

Дейност 16.1.6. Изграждане на учебни кабинети със съвременно оборудване в училищата в община Чепеларе

 В процес на изпълнение

През периода са реализирани следните инвестиции:

- ✓ 2021 г. - закупуване на учебен лек автомобил за нуждите на ПГСГСТ „Никола Йонков Вапцаров“

- ✓ 2023г. – за ОУ „Цар Симеон I“ с. Павелско: озвучителна система и видеокамера; ПГСГСТ „Никола Й. Вапцаров“ гр. Чепеларе - уред за измерване на височината на дърветата - висотомер

Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ на МОН

По Модул 1 „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, по география и икономика, по технологии и предприемачество и за целодневна организация на учебния ден“ (2024г.) е реализиран проект на ОУ „Цар Симеон I“ Модул 1 „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“ (2023 г.) са реализирани проекти на ОУ „Цар Симеон I“ и СУ „Васил Дечев“ Модул 2 „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“ (2022г.) е реализиран проект на СУ „Васил Дечев“.

Национален план за възстановяване и устойчивост, Процедура BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“

През 2024г. започва изпълнението на 4 проекта в училищата на община Чепеларе. Основна цел на проектите е осигуряване на физическата среда и техническото оборудване и обзавеждане на STEM пространства в училищното образование с оглед създаване на интегрирана учебна среда от ново поколение, която да поощри и подкрепи образователните иновации в обучението и преподаването в сферата на STEM и да се повиши интересът към науките и научните изследвания у учениците.

През 2024-2026г. се реализират:

Проект BG-RRP-1.015-0908-C02 Изграждане на STEM център и БОСКС в ОУ „Цар Симеон I“, с бенефициент ОУ „Цар Симеон I“ на стойност 60 582,92 лв.⁵⁵

Проект BG-RRP-1.015-2042-C01 Изграждане на училищна STEM среда в Професионална гимназия по селско, горско стопанство и туризъм „Никола Йонков Вапцаров“ с ПГСГСТ гр. Чепеларе на стойност 180 870,89 лв.⁵⁶

Проект BG-RRP-1.015-1262-C01 Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (БОСКС) с бенефициент Спортно училище „Олимпийски надежди“ на стойност 60 600 лв.⁵⁷

Проект BG-RRP-1.015-1530-C02 Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (БОСКС). с бенефициент СУ „Васил Дечев“ на стойност 252 499,62 лв.⁵⁸

⁵⁵ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/190/Project/BasicData?contractId=KydFb43Z6rHe4rHYJ1ecGQ%3D%3D&isHistoric=False>

⁵⁶ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/190/Project/BasicData?contractId=s%2FPcsviRwyYpHnkqoWwC%2BQ%3D%3D&isHistoric=False>

⁵⁷ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/190/Project/BasicData?contractId=WA209GKthuAwMD1HUayL9g%3D%3D&isHistoric=False>

⁵⁸ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/190/Project/BasicData?contractId=onmOwvM7nXmNDYtRplXAlA%3D%3D&isHistoric=False>

Дейност 16.1.7. Реновиране и подобряване на енергийната ефективност на общинските училища в община Чепеларе

В процес на изпълнение

През 2021 – 2022 г. е реализиран проект за въвеждане на мерки за повишаване енергийната ефективност на ПГСГСТ гр. Чепеларе с финансиране от общинския и държавния бюджет.

Дейност 16.1.8. Реновиране и подобряване на енергийната ефективност на детските градини в общината

Не е отчетен напредък

Дейност 16.1.9. Оборудване и обзавеждане на детските градини с нови мебели и съвременно оборудване.

В процес на изпълнение

Поетапно се инвестира в подобряване на материално – техническата база на детските градини:

През 2023г.

- ✓ климатици за Детска градина с. Павелско
- ✓ лек автомобил за Детска градина гр.Чепеларе
- ✓ Община Чепеларе осигурява съвременни устройства за поддържане на здравословна среда в занималните на 9-те групи към ДГ Чепеларе.

През 2024г.

- ✓ Климатик за Детска градина с.Павелско;
- ✓ професионална перална машина и кухненско оборудване за ДГ Чепеларе

Дейност 16.1.10. Обновяване и оборудване на помещения за извънучилищни занимания на учениците

В процес на изпълнение

Извънкласната и извънучилищната дейност в общината се осъществява от Център за подкрепа на личностно развитие – Общински детски комплекс (ОДК) гр. Чепеларе.

През 2024 г. е закупен автобус за нуждите на ЦПЛР - ОДК със средства от общинския и държавния бюджет.

Мярка 16.2. Стимулиране на иновационните подходи в работата с децата и учениците и извънкласните занимания.

Дейност 16.2.1. Закупуване на софтуер и хардуер за компютърни кабинети в детските градини

В процес на изпълнение

През периода са закупени:

- ✓ 2021г. за Детска градина с. Павелско – преносим компютър и Програмен продукт TP3
- ✓ 2022г. за Детска градина Чепеларе – компютри и интерактивен дисплей;

Дейност 16.2.2. Обновяване на софтуера и хардуера на училищните компютърни кабинети

 В процес на изпълнение

През периода са закупени:

- ✓ 2021г. - компютър за ОУ „Бачо Киро“ с. Забърдо
- ✓ 2022г. - усилвател за СУ „Васил Дечев“, гр. Чепеларе
- ✓ 2023г. - за СУ „Васил Дечев“: компютри, финансирани със средства от ЕС по проект „Образование в утрешния ден“; програмен продукт „Автоматизирани библиотеки“ - АБ УЕБ
- ✓ 2024г. – за ОУ „Цар Симеон I“ - интерактивен дисплей, за СУ „Васил Дечев“ – компютри и др.; ПГСГСТ „Никола Й. Вапцаров“ - компютърна система и компютри.

Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ на МОН

През периода:

- ✓ Средства за електронен дневник получават: ОУ „Цар Симеон I“; СУ „Васил Дечев“, ПГСГСТ „Никола Й. Вапцаров“, СУ „Олимпийски надежди“
- ✓ Средства за Интернет свързаност получават ОУ „Цар Симеон I“; СУ „Васил Дечев“, ЦПЛР ОДК

Дейност 16.2.3. Създаване и прилагане на екологични програми в детските градини и училищата

 Не е отчетен напредък

Допълнени дейности, допринасящи за изпълнението на Мярка 16.2.

 В процес на изпълнение

Проект „Обичам киното и аз участвам, за да се науча“

През 2024г. се реализира проекта с финансиране от Програма „Ти и Lidl за нашето утре“ на ЛИДЪЛ

Обща стойност: 5000 лв.

Участниците в проекта се запознават с основните принципи и умения, необходими за създаването на документален филм или интервю по конкретна тема, като всеки един от тях избере своята „професия“ – режисьор, оператор, сценарист или репортер.

През периода 2021-2024г. училищата участват активно с проекти по Националните програми на Министерство на образованието и науката

Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“ на МОН

Програмата е насочена към осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности; засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове и изкуства и за изяви в областта на танцовото, музикалното и театралното изкуство, както и в областта на спорта; насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците; изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол в учениците; повишаване на музикалната, танцовата и театралната култура на подрастващите и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности; стимулиране на интереса на учениците към богатото музикално, танцово и театрално наследство, както и към колективните спортове; развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за здравословен начин на живот.

През периода са финансирани проекти на: Основно училище „Цар Симеон I“, С. Павелско, Средно Училище „Васил Дечев“, Професионална гимназия по селско, горско стопанство и туризъм „Никола Йонков Вапцаров“, Спортно училище „Олимпийски надежди“.

Национална програма „България – образователни маршрути“ на МОН

Програмата подпомага създаването на условия за развитие на съвременното образование на XXI век чрез обучение, възпитание и социализация на всички ученици, по всяко време и навсякъде.

През периода е финансиран проект на СУ „Васил Дечев“

Национална програма „Без свободен час“ на МОН

Програмата е свързана с необходимостта от създаване на условия за непрекъснат образователен процес на децата и учениците в детските градини, в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа при отсъствие на педагогически специалист и на условия за провеждането на обучение от разстояние в електронна среда.

През периода са финансирани проекти на: ДГ Чепеларе, ОУ „Цар Симеон I“, СУ „Васил Дечев“.

Национална програма „Иновации в действие“ на МОН

Програмата е насочена към подкрепа на училища и на учители, реализиращи иновативни дейности чрез създаването на иновативна учебна среда в класната стая, иновативни методи на преподаване, както и към училища с иновативни практики и такива с потенциал за развитие на иновации в областта на финансовата грамотност,

екологията и зелената енергия, интегрираното знание, личностното развитие на учениците, позитивното образование и др.

През периода са финансирани проекти на: Основно училище „Цар Симеон I“ и Професионална гимназия по селско, горско стопанство и туризъм „Никола Й. Вапцаров“.

Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик“ на МОН

Личният напредък на ученика в образователния процес е пряко зависим от екипната работа на учителите от различните образователни етапи, насочена към преодоляване на проблемите на приемствеността между етапите на основното образование.

През периода е финансиран проект на СУ „Васил Дечев“

Национална програма „Хубаво е в детската градина“ на МОН

Програмата цели осигуряване на целенасочена подкрепа за прилагане на творчески и иновативни решения за работа на работещите учители, които търсят и постигат промяна за активно взаимодействие с участниците в образователния процес.

През периода е финансиран проект на Детска градина Чепеларе

Национална програма „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия“ на МОН

Програмата подпомага създаването на условия за развитие на съвременното образование на XXI век чрез обучение, възпитание и социализация на всички ученици, по всяко време и навсякъде.

През периода е финансиран проект на Средно Училище „Васил Дечев“, гр. Чепеларе.

Национална програма „Без агресия за сигурна образователна среда“ на МОН

През периода е финансиран проект на ДГ Чепеларе

Мярка 16.3. Повишаване квалификацията на безработни и трудово неактивни лица в различни обучения и стажове;

 Не е отчетен напредък

Мярка 16.4. Мерки за допълнителна квалификация, преквалификация с цел адаптиране към новите изисквания на пазара на труда

 Не е отчетен напредък

Приоритет 17. Културна инфраструктура и културно наследство

Мярка 17.1. Реновиране сградите на читалищата и културните институции в общината.

Дейност 17.1.1. Саниране и подобряване на енергийната ефективност на читалищата в общината

 Не е отчетен напредък

Дейност 17.1.2. „Ремонт и реконструкция на сграда на читалище и вертикална планировка, с. Проглед, община Чепеларе”

 Не е отчетен напредък

Дейност 17.1.3. „Ремонт и реконструкция на сграда на читалище в с. Малево, община Чепеларе”-

 Не е отчетен напредък

Дейност 17.1.4. Съдействие за модернизация, подмяна на оборудването и обзавеждането в читалищата, закупуване на техническо оборудване за читалищните салони и сцени, обновяване на библиотечните фондове.

 В процес на изпълнение

През 2022г. и 2023г. Библиотеката към НЧ „Родопска искра 1880“, град Чепеларе печели проекти за книги по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ за обогатяване на библиотечния фонд.

Дейност 17.1.5. Реставрация на паметници и паметни плочи и благоустрояване на прилежащите им площи

 Не е отчетен напредък

Дейност 17.1.6. Почистване и освежаване на маркировката на Римския път по билото на Чернатица

 Не е отчетен напредък

Мярка 17.2. Съхраняване, развитие и популяризиране на културно-историческото наследство.

Дейност 17.2.1. Популяризиране на местните празници, обичаи и занаяти.

 Не е отчетен напредък

Дейност 17.2.2. Възпроизвеждане на местните празници и обичаи.

 Не е отчетен напредък

Дейност 17.2.3. Провеждане на рекламни кампании, популяризиращи паметниците на културата и местния фолклор.

 Не е отчетен напредък

Дейност 17.2.4. Увеличаване на информацията за недвижимите паметници на културата и обектите на недвижимото културно-историческо наследство.

 Не е отчетен напредък

Дейност 17.2.5. Създаване на демонстрационно-търговски център на занаятите в град Чепеларе.

 Не е отчетен напредък

1.2.7. Напредък по Стратегическа цел 7.

За постигане на Стратегическа цел 7 „Умно управление на общинската администрация, продължаваща модернизация на административните процеси“ са формулирани 2 приоритета

- ✓ Приоритет 18. Благоустрояване на обекти на общественото обслужване и подобряване достъпа до основните административни услуги.
- ✓ Приоритет 19. Подобряване на квалификацията и обmena на добри практики.

Приоритет 18. Благоустрояване на обекти на общественото обслужване и подобряване достъпа до основните административни услуги

Мярка 18.1. Благоустрояване и модернизиране на обекти обслужващи граждани и бизнес.

 В процес на изпълнение

През 2021г. за нуждите на РУ-Чепеларе са закупени с държавен бюджет Мултифункционални устройства, 5 броя компютърни конфигурации и др.

През 2021г. е закупен лек автомобил за кметство Забърдо.

През 2022 г. е извършен основен ремонт на покрив на сграда кметство Забърдо на стойност 34 936 лв., финансиран с целева субсидия.

Мярка 18.2. Подобряване на качеството и видовете административни услуги, предлагане на електронни услуги и намаляване на срока за административни обслужване

Дейност 18.2.1. Въвеждане на електронни административни услуги

	Изпълнен
	От 2024 г. Община Чепеларе предоставя 175 бр. електронни услуги през Портала на електронното управление EGOV.BG

Дейност 18.2.2. Проучване на потребностите от специализирано обучение на общинските служители и последващото им провеждане

	В процес на изпълнение
	Ежегодно се проучват потребностите на служителите от специализирано обучение и съответно се включват и преминават необходимото обучение.

Дейност 18.2.3. Специализирани обучения на служителите, включването им в мрежи и др.

	В процес на изпълнение
	Служителите ежегодно се включват и преминават специализирано обучение в зависимост от заявените потребности.

Дейност 18.2.4. Обучение и обмен на добри практики на служителите на общинската администрация за подобряване качеството на предоставените услуги, за е-община и за разработване на общински политики.

	Не е отчетен напредък

Дейност 18.2.5. Развитие и актуализация на Портала за административни услуги на сайта на общината.

	Изпълнен
	На сайта на Община Чепеларе, от раздел ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ - с линк, потребителите се препращат към Портала на електронното управление EGOV.BG, чрез който Община Чепеларе предоставя 175 бр. електронни услуги. ⁵⁹

Дейност 18.2.6. Непрекъснато измерване удовлетвореността на гражданите за предоставените от общината услуги с цел повишаване на качеството

	В процес на изпълнение
--	------------------------

⁵⁹ <https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/uslugi/obshtina?mId=445>

Мярка 18.3. Обновяване на хардуера и софтуера в общинска администрация.

През периода 2021-2024г. се осигуряват инвестиции в подобряване на техническата обезпеченост на администрацията:

- ✓ 2021г. са закупени: Компютри за общинска администрация; Мултифункционално устройство за ОТП на избори, Община Чепеларе; Преносими компютри за Общински съвет – Чепеларе; Закупуване на ПП ТРЗ за Общинска администрация гр. Чепеларе; Компютър за Кметство с. Забърдо;
- ✓ 2022г.: Водоустойчив LED екран с компютър за управление, с. Забърдо; компютри за Общинска администрация гр. Чепеларе; Програмен продукт ТРЗ и Личен състав – WINDOWS;
- ✓ 2023г.: Преместваем офис за нуждите на горските служители, обработващи документацията на дървения материал, гр. Чепеларе; Закупуване на мултифункционално устройство за общинска администрация;
- ✓ 2024г.: компютри и лаптопи за Общинска администрация, скенер за Общински съвет Чепеларе, гр. Чепеларе; програмни продукти: GISExplorer Municipality, „Микроинвест“, ТРЗ и Личен състав

Дейност 18.3.1. Реклама и публичност на културните, екологичните и социалните общински инициативи.

 Не е отчетен напредък

Дейност 18.3.2. Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите и резултатите при реализацията на различните проекти.

 Не е отчетен напредък

Дейност 18.3.3. Изработване на информационни табла в центъра на града популяризиращи общинските инициативи

 Не е отчетен напредък

Дейност 18.3.4. Техническо осъвременяване на Интернет радиото и по-активното му използване за подобряване информираността сред гражданите.

 Не е отчетен напредък

Дейност 18.3.5. Проучване на общественото мнение за определяне ефективността на реализираните проекти и предлаганите услуги.

 Не е отчетен напредък

Дейност 18.3.6. Допитване до населението по важни за местната общност въпроси, чрез онлайн платформи

Не е отчетен напредък

Дейност 18.3.7. Активно взаимодействие с гражданското общество

В процес на изпълнение

Проект BG05SFOP001-2.025-0095-C02 „Повишаване осведомеността на гражданското общество и бизнеса относно форми за пряко участие в политики и законодателство на местно ниво в Община Чепеларе“

През 2022г. – 2023г. се реализира проектът с финансиране от Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020г.⁶⁰

Водеща организация е Сдружение „Институт за общностно развитие“, а партньор Община Чепеларе.

Стойността е в размер на 59 138,25 лв.

Основната цел е разработване на механизъм/методика за мониторинг, партньорски посещения и прегледи относно упражняване правомощията и отговорностите на местните власти съгласно 12-те принципа на Стратегията за иновации и добро местно ниво на Съвета на Европа - основа за съвместни действия/партньорства между общините и НПО.

Проект BG05SFOP001-2.025-0151-C01 „Провеждане на ефективни политики за добро управление на местно ниво с помощта на гражданския сектор“

През 2022г. – 2024г. се реализира проектът⁶¹, с финансиране от Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020г.

Водеща организация е Сдружение „Съюз за България“, партньори - Община Чепеларе, Община Рудозем и Община Садово.

Стойността е в размер на 59 997,10 лв.

Изпълнението на проекта се стреми да надгради постигнатите до сега резултати, свързани с 12-те принципа на добро демократично управление съгласно Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа (СИДУМН) и така да се стимулира дебатът между заинтересованите страни, да се създадат и укрепят партньорствата между общините и НПО сектора, да се повиши активността на НПО при изпълнение и мониторинг на политики.

Реализират се и следните инициативи:

През 2023г. се провежда Инициативата на Junior Achievement „Мениджър за един ден“ 2023 в сградата на Община Чепеларе, която е най-значимата и мащабна

⁶⁰ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/0/Project/Participants?contractId=aae%2BIFQOyR6DkTB8r28WtQ%3D%3D&isHistoric=False>

⁶¹ <https://2020.eufunds.bg/bg/0/0/Project/BasicData?contractId=hVMrWQEWHoPOq4p9gP92lg%3D%3D&isHistoric=False>

образователна програма в България за младежи над 16 години. В рамките на един ден участниците се запознават с реалната работна среда в компании и организации от цялата страна и получават безценно вдъхновение от топ мениджъри.

През 2024г. е Младежки общински съвет в Чепеларе, по инициатива на Младежки център „Тийнейджърски дух“ (Youth center „Teen spirit“) – гр. Чепеларе.

Младежкият Общински съвет цели да обедини младежи от 15 до 29 годишна възраст от всички населени места в община Чепеларе, както и студенти, учащи извън пределите на общината, чиито идеи да достигат до управляващите по удобен и полесен начин и респективно младежките общности да бъдат запознати с дейностите на Общината и въвлечени в управлението на Общинско ниво.

Дейност 18.3.8. Издаване на месечен информационен бюлетин отразяващ най-важните общински събития.



Изпълнен

През 2021г. до юли 2022г. се издава вестник „Чепеларе“. Периодично се издава туристически бюлетин – www.visitcepelare.bg

Дейност 18.3.9. Откриване на ефирно радио в Чепеларе



Не е отчетен напредък

Дейност 18.3.10. Подобряване на информираността в областта на селското стопанство и популяризиране на изискванията на ПРСР.



Не е отчетен напредък

Приоритет 19. Подобряване на квалификацията и обмена на добри практики.

Мярка 19.1. Повишаване квалификацията на административния персонал и ефективността на проектния мениджмънт, чрез обучение и обмен на добри практики.

Дейност 19.1.1. Обучение за запознаване с новите оперативни програми и разработването на проектни концепции.



В процес на изпълнение

Дейност 19.1.2. Обучение и обмен на добри практики на представителите на общинската администрация за управление на проектите.



В процес на изпълнение

През периода 2021-2024г. служителите на общинска администрация – Чепеларе участват регулярно в различни обучения, семинари и информационни срещи с цел повишаване на знанията и уменията.

През 2022 г. представители на Община Чепеларе участват в двустранен семинар за обмяна на опит в Осло, Кралство Норвегия, финансирано от Фонда за двустранни отношения по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм. Целта на посещението е обмяна на опит и знания, технологии, и добри практики между българските и норвежките общини; намиране на потенциални партньорски организации на територията на страната донор; бъдещо сътрудничество за изпълнение на съвместни проекти по Програмата. Основните разглеждани теми са повишаване капацитета на местните общности за намаляване на емисиите и адаптиране към изменението на климата; зелен транспорт; отпадъци в кръговата икономика; възобновяема енергия; зелени сгради и еко-управление; подобро използване на ресурсите на общинско ниво.

През 2024 г. е проведено работно посещение между Община Чепеларе и Община Троян за обмяна на опит за добри практики, обсъждане на идентични проблеми и възможностите за развитие и управление на бъдещи политики.

Мярка 19.2. Разширяване на вътрешните, международните партньорства и междуобщинското сътрудничество

Дейност 19.2.1. Разширяване на вътрешните партньорства и междуобщинското сътрудничество при изграждане на съвместни инфраструктури, секторни партньорства и клъстери.

В процес на изпълнение

Концепцията за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) е подход за финансиране и реализиране на проекти, който се основава на териториален подход и интегрирано планиране. Този инструмент е част от политиките на Европейския съюз за регионално развитие и има за цел по-ефективно и целенасочено използване на ресурсите, за да се постигне устойчиво развитие в специфични територии.

Община Чепеларе е партньор в 2 КИТИ, разработени през 2023г.

КИТИ №BG16FFPR003-2.001-0156 Развитие на област Смолян чрез инвестиции в устойчив туризъм, създаване на нови атракции и опазване на културно-историческото наследство на териториите на общините Смолян, Чепеларе, Баните и Златоград и подобряване на транспортната свързаност.

Водещ партньор/Кандидат: Община Смолян; Партньори: Община Чепеларе, Община Златоград, Община Баните, Областна администрация – Област Смолян, Регионален

исторически музей „Стою Шишков“- Смолян, ПГСГСТ „Н. Й. Вапцаров“, „Пампорово“ АД, Агенция „Пътна инфраструктура“.

Дейностите, предвидени за реализиране на територията на община Чепеларе са:

Дейност 1: Разработване на нови туристически маршрути и атракции в Община Чепеларе, създаване на условия за устойчив туризъм - изграждане на екопътека на територията на община Чепеларе и община Смолян; създаване на зона за лятна еко занималня с атракционен парк в м. Мечи чал; изграждане на 2 бр. зарядни станции за планински електрически велосипеди и закупени 20 бр. планински електрически велосипеди – По ПРР 2021-2027

Дейност 1: Реализиране на проект за дуално обучение между Професионална гимназия по селско, горско стопанство и туризъм „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Чепеларе и „Пампорово“ АД: Участие на ученици от дуална паралелка по специалност „Мехатроника“ в стажове във връзка с поддръжката на съоръженията от спортно-техническата инфраструктура, стопанисвана от „Пампорово“ АД на стойност 350 000 лв. по Програма „Образование“ 2021-2027г.

Концепцията е одобрена и е в процес на финансиране.

КИТИ №BG16FFPR003-2.001-0072, Развитие и целогодишно предлагане на устойчиви туристически продукти в Средните Родопи

Водещ партньор/Кандидат: Регионално сдружение на научно-технически съюзи, Партньори: Народно читалище „Проф. д-р Асен Златаров 1927“ - с. Смилян, Народно читалище „Христо Ботев -1892 г.“ - с. Чокманово, Сдружение „Тур де България“, „Д И К“ ООД, Община Чепеларе, Община Златоград.

Концепцията е одобрена и е включена в резервен списък с конкретни бенефициенти, поради изчерпване на предвидения финансов ресурс.

През 2024 г. по инициатива на председателят на „Сдружение на хотелиери, ресторантьори и търговци - гр. Чепеларе“ Съби Маданков е организирана среща между ръководството на Община Чепеларе, Председателят на Общински съвет Чепеларе, общински съветници, представители на Консултативния съвет по туризъм, на туристическия бизнес, неправителствени организации, институции и активни граждани, по повод анализ на моментното състояние на туризма и стъпките към неговото подобряване. Целта на срещата е да се провокира вниманието на гражданите и бизнеса за сформирането на работни групи по ресори, които да работят за развитието на комплексния туризъм в региона. Идеята е да се възроди обществения форум като начин за взимане на решения чрез метода на мозъчната атака, да се обединим и всички заедно да работим за съхраняване и развиване на природните, историческите и културните дадености в община Чепеларе и целия регион.

Дейност 19.2.2. Разширяване на международните партньорства и побратимявания между градове и общини.

В процес на изпълнение

През периода община Чепеларе разширява и създава нови международни партньорства. В настоящия доклад са представени само някои от тях.

През 2021г. е проведена среща с представители на Германо-Българската индустриално-търговска камара, които представят проекта „Young Energy Europe“, чиято цел е да подобри мерките за опазване на климата. В рамките на проекта млади специалисти от различни организации се обучават за енергийни скаути, като впоследствие ще могат да следят и намалят енергопотреблението в предприятията, в които са наети.

През 2021г. Община Чепеларе е първата община в България, която участва със свой отбор енергийни скаути в проект „Young Energy Europe“ YEE 2.0. Целта на проекта е да подобри мерките за опазване на климата. Отборът на Община Чепеларе се състои от 7 служители на администрацията, които участват в серия от обучения и на финала представят проект, който цели постигане на енергийна ефективност и намаляване разхода на електроенергия, чрез прилагане на енергийно ефективни мерки в общински сгради.

През 2022 г. в хотел „Борика“, гр.Чепеларе е проведено информационно събитие „Climate Talks Bulgaria“, организирано от Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК). Форумът има за цел да се анализира докъде се е развила реформата с въвеждането на дефиниция за енергийна бедност, както и да се обсъдят и осветлят мерките, които държавата ще предприеме в близко бъдеще за подпомагане на гражданите в тази насока, с особен акцент на това какви възможности имат общините като социална и екологична ползи с тези мерки.

През 2022г. са разменени визити между кмета на Община Чепеларе и кмета на Община Куманово, Република Северна Македония.

През 2024г. кметът на Община Чепеларе присъства на:

- ✓ тържествен прием по повод деня на германското единство в Консулството на Федерална република Германия в Пловдив;
- ✓ прием в Американското посолство по повод националния празник на Америка – Денят на независимостта;
- ✓ прием по повод националния празник на Република Турция в Консулството на Република Турция в Пловдив.

1.2.8. Напредък по Стратегическа цел 8.

За постигане на **Стратегическа цел 8 „Опазване на околната среда, адаптиране към климатичните промени и намаляване риска от бедствия“** са формулирани 7 приоритета

- ✓ Приоритет 20. Подобряване управлението на отпадъците
- ✓ Приоритет 21. Опазване и подобряване на околната среда и превенция на екологичните рискове
- ✓ Приоритет 22. Дейности по опазване на чистотата на въздуха
- ✓ Приоритет 23. Подобряване чистотата на водите
- ✓ Приоритет 24. Подобряване на биоразнообразието
- ✓ Приоритет 25. Превенция и управление на риска от наводнения, свлачища и изменение на климата
- ✓ Приоритет 26. Намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда

Приоритет 20. Подобряване управлението на отпадъците

Мярка 20.1. Премахване на последиците от индустриални и битови замърсявания и тяхното ограничаване

Дейност 20.1.1. Периодично почистване на локалните замърсявания

В процес на изпълнение

През периода се организира и провежда почистването на замърсени площи с отпадъци, вкл. замърсяване с отпадъци на всички реки с притоци и прилежащите им земи на територията на общината; на общинската пътна и улична мрежа на гр. Чепеларе, к.к. Пампорово и населените места от пясъци и отпадъците. Почистват се местата за отдих, край всички общински пътища, на местата с чешми се поставят кошчета. Извършват се регулярни проверки за нерегламентирано изхвърляне на едрогабаритни отпадъци, излезли от употреба гуми, електрическо и електронно оборудване и др.

Дейност 20.1.2. Включване в публични инициативи за масово почистване на общината

В процес на изпълнение

Като част от дейностите свързани с управлението на отпадъците в общината са се утвърдили през годините няколко кампании сред населението, които целят привличането на интереса към дейностите по управлението на отпадъците - такива кампании са „Пролетно почистване“ и участие в кампанията „Да изчистим България заедно“.

Мярка 20.2. Обновяване и модернизиране на оборудването за сметосъбиране и сметоизвозване в общината

Дейност 20.2.1. Обновяване и модернизиране на оборудването за сметосъбиране и сметоизвозване в общината

Не е отчетен напредък

Дейност 20.2.2. Закупуване на снегопочистващи машини-ротори и др.

Не е отчетен напредък

Дейност 20.2.3. Закупуване на специализирани машини и нови съдове тип „Бобър“.

Не е отчетен напредък

Мярка 20.3. Изграждане на система за разделно събиране на отпадъците и повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали.

Дейност 20.3.1. Осъществяване на мерки за разделно събиране на отпадъците и въвеждане на компостиране.

В процес на изпълнение

2021г. е организирано събиране в контейнери на негодни за употреба батерии и акумулатори. От 2023г. в сградата на администрацията има поставен и контейнер за рециклиране на батерии, както и в два търговски обекта в град Чепеларе

През 2022г. се въвежда разделно събиране на битови отпадъци от облекла и текстилни материали на територията. Контейнери са поставени на ул. „Хан Аспарух“ (до блокове „Скиор“, „Българо американска кредитна банка“), ул. „Спартак“ (под Районен съд - Чепеларе) и на ул. „24 май“.

Дейност 20.3.2. Провеждане на информационна кампания сред населението за разделното събиране на отпадъците.

В процес на изпълнение

През 2024г. стартира инициатива на Община Чепеларе за провеждане на конкурс за най-почистена махала в Чепеларе и най-почистено село в община Чепеларе. Критериите за оценяване на седемте махали и единадесетте села включват почистени улици и тротоари, боядисани огради. До 5-то число на всеки следващ месец през 2025 година победителите ще бъдат обявявани на официалната Facebook страница на Община Чепеларе и на специално създадени табла, разположени в сградата на институцията.

Дейност 20.3.3. Обучение на подрастващите и гражданите за формиране на навици за разделно събиране на отпадъците

 Не е отчетен напредък

Дейност 20.3.4. Създаване на организация за разделно събиране на твърдите битови отпадъци.

 Не е отчетен напредък

Мярка 20.4. Изграждане на площадки и съоръжения намаляващи замърсяванията

Дейност 20.4.1. Изграждане на Площадка за временно съхранение на строителни отпадъци

 Не е отчетен напредък

Дейност 20.4.2. Изграждане на съоръжение за компостиране и предварително третиране на отпадъци

 Не е отчетен напредък

Дейност 20.4.3. Изграждане на пунктове за вторични суровини

 Не е отчетен напредък

Мярка 20.5. Проучване на възможностите и развитие на инфраструктура, свързана с управлението на битовите отпадъци за постигане на целите за 2030г. за рециклиране на отпадъците и намаляване на количествата на депонираните отпадъци

 Не е отчетен напредък

Мярка 20.6. Разработване на стандарти за разделно събиране и рециклиране на отпадъците в общината, съобразено с възможностите и степента на инфраструктурна обезпеченост, подготовка за изграждане на система за разделно събиране на отпадъци

 Не е отчетен напредък

Мярка 20.7. Предотвратяване генерирането и насърчаване на рециклиране на отпадъците

Не е отчетен напредък

Мярка 20.8. Информираност и обучение на гражданите (в това число и в училищата), стопанските субекти и на отговорните административни структури в областта на управление на отпадъците и кръговата икономика

Не е отчетен напредък

Мярка 20.9. Мониторинг и запечатване на нерегламентирани депа за отпадъци

Дейност 20.9.1. Рекултивация на общинско депо „Ракида“

В процес на изпълнение

През 2023г. е извършена актуализация на проект: „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в местността „Ракида“, община Чепеларе, област Смолян“ и се търсят възможности за финансиране.

Дейност 20.9.2. Мониторинг и запечатване на нерегламентирани депа за отпадъци

Не е отчетен напредък

Мярка 20.10. Подобряване на базата от знания относно кръговата икономика, мониторинга на отпадъците и потоците от материали.

Не е отчетен напредък

Мярка 20.11. Проучване на възможностите за финансиране и насърчаване на публични – частните партньорства

Не е отчетен напредък

Приоритет 21. Опазване и подобряване на околната среда и превенция на екологичните рискове

Мярка 21.1. Превенция на екологичните рискове

Дейност 21.1.1. Превенция на екологичните рискове.

 Не е отчетен напредък

Дейност 21.1.2. Провеждане на мерки за адаптация към климатичните промени.

 Не е отчетен напредък

Мярка 21.2. Подобряване управлението на водите и управлението на почвите.

 Не е отчетен напредък

Приоритет 22. Дейности по опазване на чистотата на въздуха

Мярка 22.1. Контрол на изисквания за опазване чистотата на околната среда към операторите извършващи строителни дейности

 Не е отчетен напредък

Мярка 22.2. Провеждане на периодичен мониторинг и контрол на състоянието на атмосферния въздух

 Не е отчетен напредък

Мярка 22.3. Намаляване на замърсяването на въздуха от битовото отопление и проучване възможностите за поетапна замяна на отоплителните уредите на твърдо гориво

 Не е отчетен напредък

Мярка 22.4. Намаляване на замърсяването на въздуха от транспорта

 Не е отчетен напредък

Мярка 22.5. Зелени мерки в градска среда, вкл. изграждане на „зелени пояси/зони“

 Не е отчетен напредък

Мярка 22.6. Разработване и актуализация на документи във връзка с качеството на атмосферния въздух

 Не е отчетен напредък

Мярка 22.7. Информационна кампания и обучения за широката общественост и за администрацията за европейските изисквания и национални изисквания за чистота на атмосферния въздух

 Не е отчетен напредък

Приоритет 23. Подобряване чистотата на водите

Мярка 23.1. Изграждане и реконструкция на ВиК инфраструктура

 Не е отчетен напредък

Мярка 23.2. Опазване качеството на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, вкл. установяване на зони за опазването им в района на съоръженията за водовземане

 Не е отчетен напредък

Мярка 23.3. Стриктен мониторинг на микробиологичните показатели на питейната вода и дейности по намаляване на загубите по водопроводната мрежа

 Не е отчетен напредък

Приоритет 24. Подобряване на биоразнообразието

Мярка 24.1. Опазване и възстановяване на видове, хабитати, екосистеми и ландшафти. Опазване на генетичното разнообразие и биологичната сигурност.

 Не е отчетен напредък

Мярка 24.2. Подобряване на информираността и повишаване активността на местната общественост за опазване на биологичното разнообразие.

 Не е отчетен напредък

Мярка 24.3. Развитие на мрежата Натура 2000 и подобряване на природозащитното състояние на природните местообитания и видове

 Не е отчетен напредък

Мярка 24.4. Опазване и възстановяване на екосистемите и присъщото им биологично разнообразие и осигуряване свързаността на мрежата Натура 2000

 Не е отчетен напредък

Мярка 24.5. Подобряване капацитета, включително чрез обучения, на звената, отговорни за управлението на и за прилагането на политиките по биологично разнообразие и по управление на Натура 2000

 Не е отчетен напредък

Приоритет 25. Превенция и управление на риска от наводнения, свлачища и изменение на климата

Мярка 25.1. Превенция, управление и анализ на риска от наводнения и засушаване, свлачища, срутища, ерозии, абразии, горски пожари и др.

Дейност 25.1.1. Преодоляване на последиците от вредното влияние на водите и от активизиран свлачищен процес - укрепване на улица „Прогрес“ в с. Павелско

 Не е отчетен напредък

Дейност 25.1.2. Превенция, управление и анализ на риска от наводнения и засушаване, свлачища, срутища, ерозии, абразии, горски пожари и др.

 Не е отчетен напредък

Мярка 25.2. Управление на риска от природни бедствия и за превенция на риска за живота и здравето на населението

 Не е отчетен напредък

Мярка 25.3. Проучвания и анализи, насочени към обследване на последиците от изменението на климата и отражението им върху водните ресурси на община Чепеларе

 Не е отчетен напредък

Мярка 25.4. Насърчаване на обучението в системата на предучилищното и училищното образование за риска от бедствия, включващо превенция, готовност, реагиране и възстановяване

 Не е отчетен напредък

Мярка 25.5. Изготвяне, преразглеждане и актуализиране на планове за защита при бедствия, както и разработване и актуализиране на съответните програми за намаляване на риска от бедствия

Не е отчетен напредък

Мярка 25.6. Стимулиране на застраховането срещу рискове от бедствия и аварии и такива, породени от изменението в климата

Не е отчетен напредък

Приоритет 26. Намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда

Мярка 26.1. Изготвяне на анализ на изискванията на Директива (ЕС) 2019/904 относно забрани за използване на определени пластмасови продукти и ефектът върху местната икономика, подготовка и проучване на добри практики за замяна на някои видове пластмасови продукти с алтернативни.

Не е отчетен напредък

Мярка 26.2. Провеждане на информационни кампании за актуалните проблеми по предотвратяване изменението на климата за положителния ефект от рециклирането на пластмасовите изделия и кръговата икономика

Не е отчетен напредък

1.2.9. Напредък по Стратегическа цел 9.

За постигане на **Стратегическа цел 9 „Справяне с пандемията COVID-19 и последиците от нея“** са формулирани 4 приоритета

- ✓ Приоритет 27. Подготовка на пакет от мерки за профилактика и готовност за реакция
- ✓ Приоритет 28. Информираност на обществеността за актуалната информация и епидемична обстановка
- ✓ Приоритет 29. Грижа, обучение и превенция на социални групи в риск, малцинствени групи
- ✓ Приоритет 30. Сътрудничество с други общини, трансгранично сътрудничество

Приоритет 27. Подготовка на пакет от мерки за профилактика и готовност за реакция

Мярка 27.1. Осигуряване на снабдяване с необходимими лекарствени и санитарни материали

 Не е отчетен напредък

Мярка 27.2. Организиране и набиране на доброволчески актив

 Не е отчетен напредък

Мярка 27.3. Дейности по превенция на разпространяване на вирусното заболяване

 Не е отчетен напредък

Мярка 27.4. Предприемане на детайлно проучване и информационна кампания, предоставяща актуална, проверена информация за гражданите за възможностите за ваксинация и организиране на дейностите по ваксинация за желаещите граждани

 Не е отчетен напредък

Мярка 27.5. Мерки за недопускане на недостиг от медицински грижи за други заболявания- сърдечно- съдови, мозъчно- съдови, хирургични, педиатрични и др.

 Не е отчетен напредък

Приоритет 28. Информираност на обществеността за актуалната информация и епидемична обстановка

Мярка 28.1. Поддържане на общинските комуникационни канали с най- актуална информация за нормативната уредба, заповеди и решения на компетентните органи

 Не е отчетен напредък

Мярка 28.2. Координация и субординация между общински, областен щаб, НОЩ, МЗ, РЗИ за предоставяне на адекватна и актуална информация на обществеността

 Не е отчетен напредък

Приоритет 29. Грижа, обучение и превенция на социални групи в риск, малцинствени групи

Мярка 29.1. Грижа и разяснителни кампании сред рискови и малцинствени групи

Дейност 29.1.1. Грижа и разяснителни кампании сред рискови и малцинствени групи

 Не е отчетен напредък

Дейност 29.1.2. Активна комуникация и обмяна на опит и добри практики с други общини в страната и чужбина;

 Не е отчетен напредък

Дейност 29.1.3. Участие в разработване на стратегически документи за съвместно действие при бедствия, кризи епидемии

 Не е отчетен напредък

Дейност 29.1.4. Активно участие на общинската администрация в общински, областен оперативни щабове за справяне с епидемията

 Не е отчетен напредък

Дейност 29.1.5. Участие в национални фондове и програми за финансиране за предотвратяване на рисковете и преодоляване на по следствията- здравни, социални и икономически, от пандемията

 Не е отчетен напредък

Приоритет 30. Сътрудничество с други общини, трансгранично сътрудничество

Мярка 30.1. Активна комуникация и размяна на опит и добри практики с други общини в страната и чужбина

 Не е отчетен напредък

Мярка 30.2. Участие в разработване на стратегически документи за съвместно действие при бедствия, кризи епидемии

 Не е отчетен напредък

Мярка 30.3. Активно участие на общинската администрация в общински, областен оперативни щабове за справяне с епидемията

 Не е отчетен напредък

Мярка 30.4. Участие в национални фондове и програми за финансиране за предотвратяване на рисковете и преодоляване на по следствията- здравни, социални и икономически, от пандемията

 Не е отчетен напредък

II. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ПИРО


Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси включва: Оценка на ефективността и ефикасността на използваните финансови инструменти, включително от ЕС и на усвоените ресурси за изпълнение на целите и приоритетите на ПИРО 2021 – 2027г. до етапа на извършване на Междинната оценка; Оценка на организацията и координацията на компетентните органи и ефективността на работата на административната структура в процеса на разработване, изпълнение, наблюдение и оценка на ПИРО 2021 – 2027г., включително по отношение прилагането на принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност за изпълнението на ПИРО.

Оценката на степента на постигане на съответните цели на ПИРО се базира на основата на сравнителен анализ на общата социално-икономическа ситуация, съгласно общи статистически показатели и емпирични данни от проучвания за развитието на Община Чепеларе. Констатирани са възникнали проблеми през периода 2021 – 2024г., който обхваща извършването на Междинна оценка. Преценка и анализ на влиянието им върху изпълнението на ПИРО през останалата част на програмния период 2021 – 2027г.

2.1. Оценка на степента на постигане на целите от изпълнението на ПИРО

За оценката на степента на постигане на целите от изпълнението на ПИРО на Община Чепеларе е направен стойностен анализ на техническото изпълнение на заложените стратегически цели, приоритетите, с които целите се конкретизират и най-вече на мерките и дейностите, имащи основополагаща роля за реализирането на целия план.

Фигура 4. Оценка на постигане на стратегическите цели по категории проекти/дейности

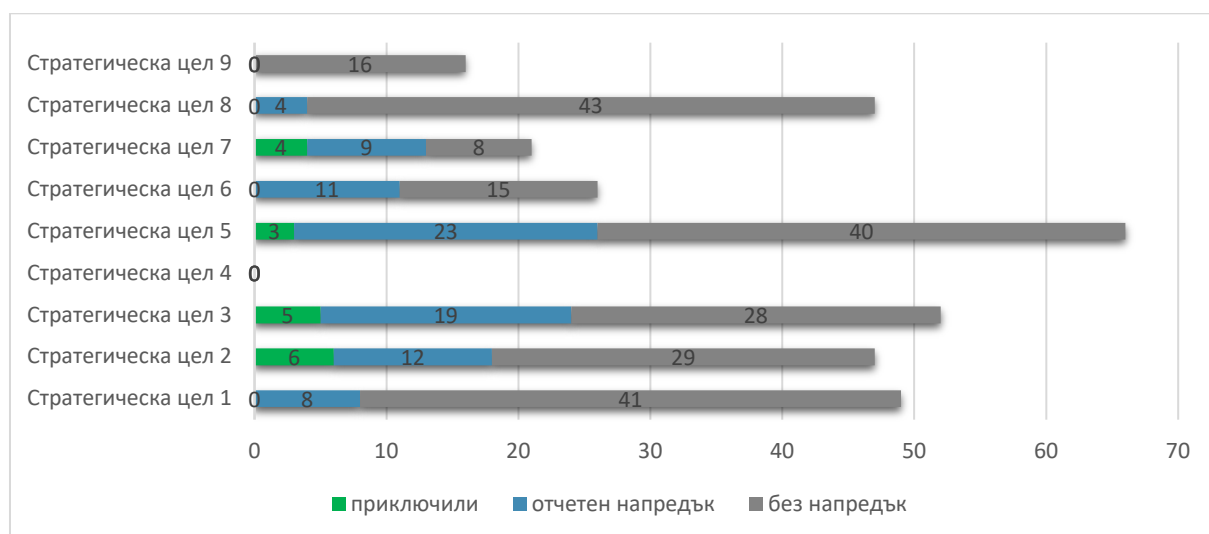


Доклад за резултатите от междинна оценка за периода 2021 – 2024г. на План за интегрирано развитие на община Чепеларе (2021 – 2027г.)

Отчитането на техническия напредък се базира на заложените 9 стратегически цели, 30 приоритета, които включват към момента на междинната оценка 324 проекта/проектни идеи/дейности.

През периода 2021 – 2024г. са приключили **6%** (18 дейности/проекта) и **26%** (86 дейности/проекта) са в процес на изпълнение или за тях е осигурено финансиране след 2024г., като реалното им изпълнение започва през 2025г. Без напредък са **68%** (220 проекта/дейности). Ефективността на техническото изпълнение на ПИРО на Община Чепеларе за периода 2021-2024г. е **45,97%**, формирана от приключили или в процес на изпълнение на дейности/проекти, което се оценява като **добро общо изпълнение**, в съответствие с избраната Методика за качествена оценка на количествени показатели.

Фигура 5. Дял на изпълнените проекти спрямо заложените в ПИРО на Община Чепеларе

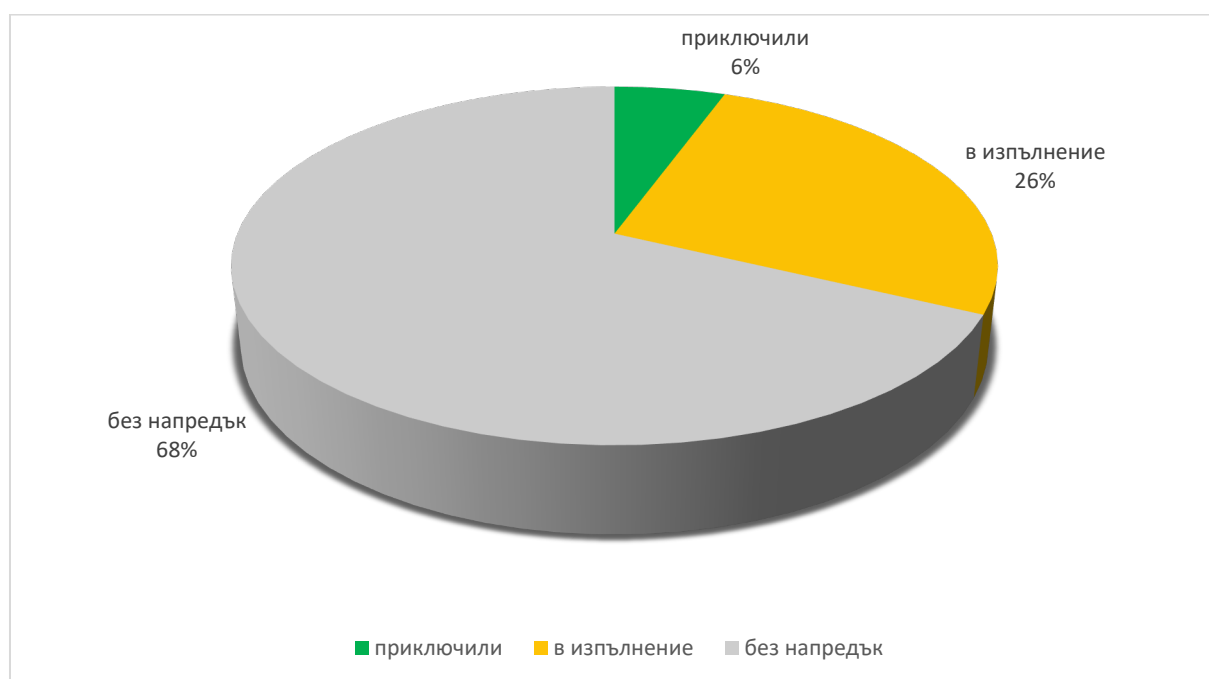


2.1.1. Оценка на напредъка по стратегически цели, приоритети и мерки

Освен анализа на общата реализация на всички мерки спрямо планираните, за целите на Оценката на изпълнението на ПИРО на Община Чепеларе е направена и съпоставка с отчетено изпълнение за всеки приоритет, за да се анализират силните и слабите моменти в изпълнението на заложените приоритети и мерки. Резултатите от този анализ са представени на следващата фигура:

**Доклад за резултатите от междинна оценка за периода 2021 – 2024г.
на План за интегрирано развитие на община Чепеларе (2021 – 2027г.)**

Фигура 6. Оценка на постигане на приоритетите по категории мерки/проекти/дейности

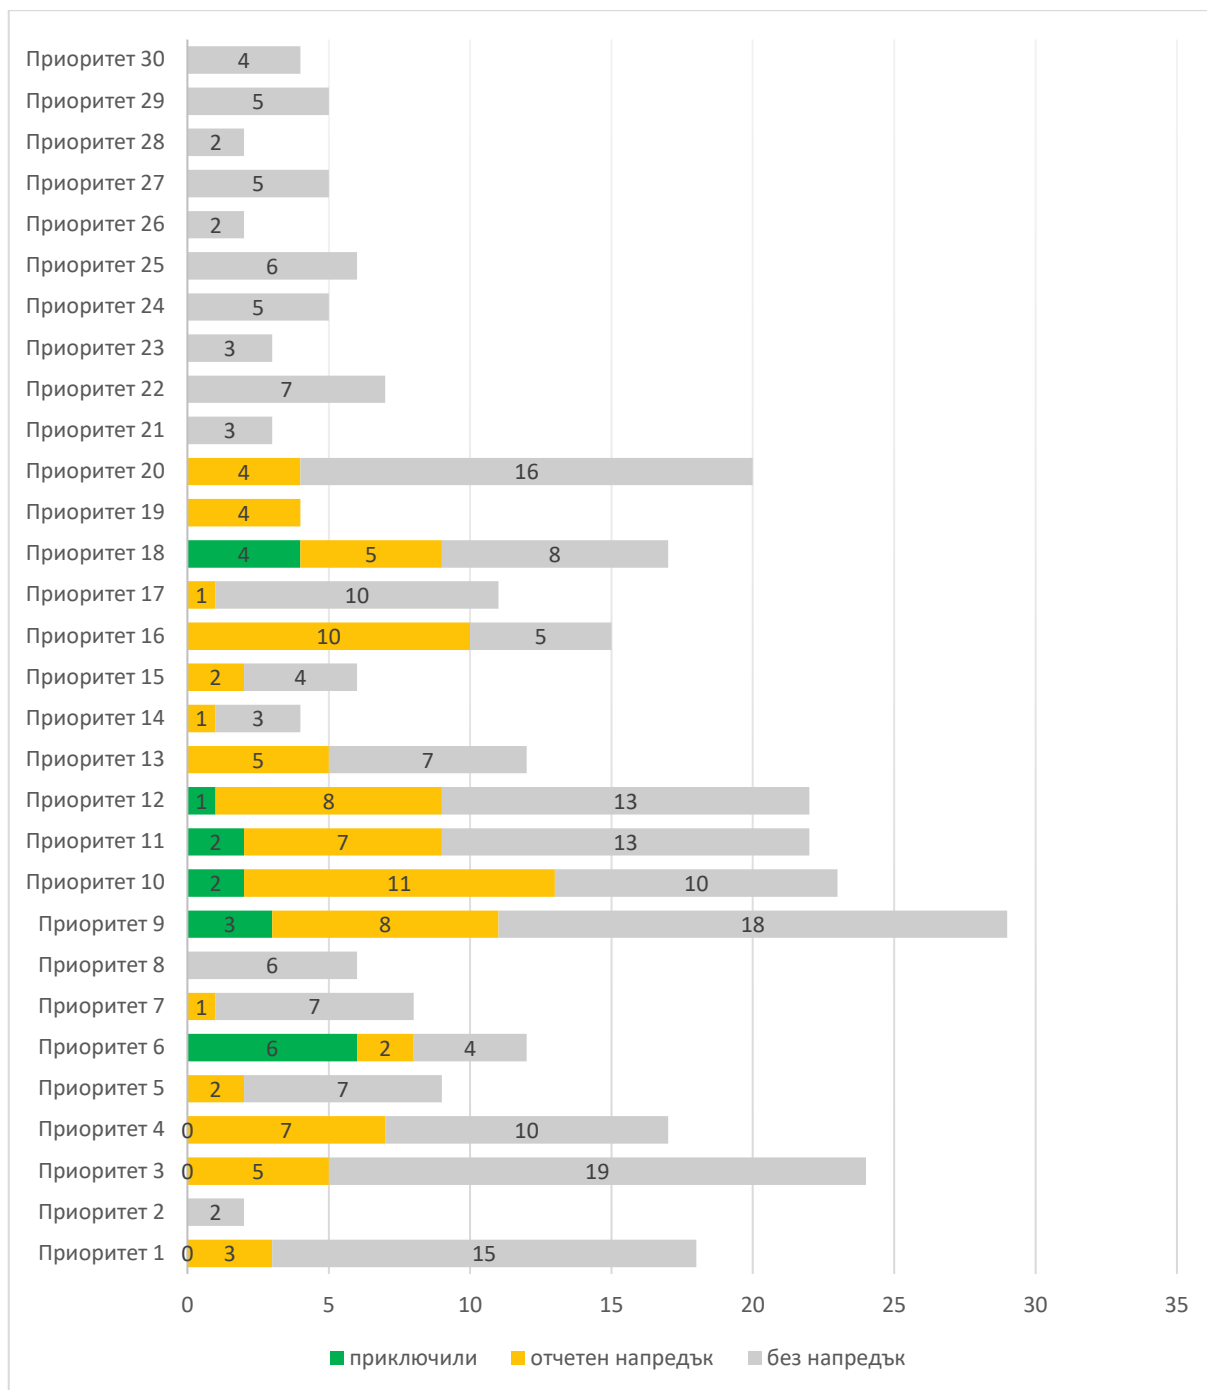

В междинния период на изпълнение са отчетени извършени дейности и техническия напредък на изпълнените мерки, посочени са причините за неизпълнение на някой от мерките и са дадени конкретни препоръки за последващи действия от страна на администрацията.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 - РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ НА ГРАД ЧЕПЕЛАРЕ


Изпълнението на Стратегическа цел 1 „Развитие и модернизация за постигане на интелигентен икономически растеж на град Чепеларе“ е предвидено да бъде постигната чрез 3 приоритета.

- ✓ Приоритет 1. Повишаване конкурентоспособността на частния сектор и МСП в общината, като движеща сила на местната икономика
- ✓ Приоритет 2. Развитие на международното сътрудничество и провеждане на активна инвестиционна политика
- ✓ Приоритет 3. Изграждане на устойчиви партньорства на местно, регионално и трансгранично ниво.

Оценка на напредъка по Приоритет 1. Повишаване конкурентоспособността на частния сектор и МСП в общината, като движеща сила на местната икономика

В ПИРО е предвидено Приоритет 1 да бъде реализиран чрез изпълнението на 3 мерки.

Фигура 7. Оценка на напредъка по Приоритет 1. Повишаване конкурентоспособността на частния сектор и МСП в общината, като движеща сила на местната икономика

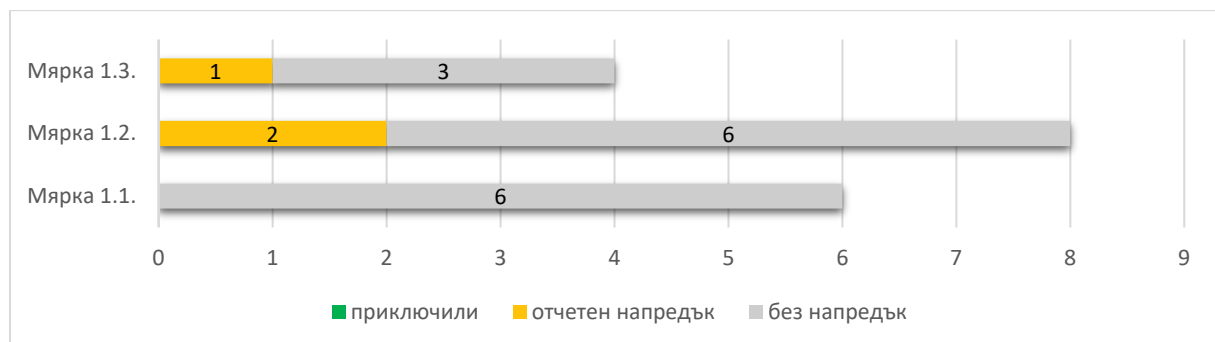

Констатации: Приоритет 1 фигурира в общия стратегически документ и в Приложение 1. Програма за реализация на ПИРО на община Чепеларе за периода 2021-2027 г.

При направения детайлен преглед е установено следното:

Мярка 1.1 Подобряване на достъпа и изграждане на местна инфраструктура, подпомагаща бизнеса – в обхвата на мярката са включени 6 дейности и не е отчетен напредък по нито една от тях.

Мярка 1.2 Стимулиране конкурентоспособността на малкия и средния бизнес, чрез технологично обновяване и иновации – в обхвата на дейността са включени 8 дейности, като по 2 от тях се отчита напредък в резултат на проекти на частни бенефициенти.

Мярка 1.3 Активен маркетинг и реклама на местните производства – в обхвата на мярката са включени 4 дейности и не е отчетен напредък по нито една от тях.

Оценка на Приоритет 1: Оценката на техническото изпълнение е **незадоволителна – 17 %**.

Препоръка: При актуализация на ПИРО да се синхронизират мерките между Текстовата част на документа и в Приложение 1. Програма за реализация на ПИРО на община Чепеларе за периода 2021-2027 г.

Мярка 1.1 Подобряване на достъпа и изграждане на местна инфраструктура, подпомагаща бизнеса

- ✓ *Дейност 1.1.4. Изграждане на многофункционална спортна зала за провеждане на спортни събития свързани с БСФ, които ще увеличат туристопотока - **да отпадне**, поради смислово дублиране на Дейност 9.1.3. Изграждане на многофункционална спортна зала, подходяща за организиране на мероприятия свързани с привличане на чуждестранни експерти и различни федерации.*

Мярка 1.2 Стимулиране конкурентоспособността на малкия и средния бизнес, чрез технологично обновяване и иновации:

- ✓ *Да се прецизира формулировката и дейностите, поради многократно повторение на обучения, проучвания и т.н., които по същество не могат да бъдат окачествени като дейности/проектни идеи, водещи до напредък в изпълнението на мярката.*

Мярка 1.3 Активен маркетинг и реклама на местните производства

- ✓ *Дейност 1.3.3. Разработване и изпълнение на маркетингова и рекламна кампания популяризиращи бранда „Зеленото сърце на България“ - **да отпадне**, поради смислово дублиране на Дейност 4.3.1. Разработване на Маркетингова, рекламна стратегия и провеждане на рекламна кампания за сертифициране и налагане на местни и регионални туристически марки част от бранда „Зеленото сърце на България“*
- ✓ *Дейност 1.3.4. Участие в международни форуми и трансгранични изяви с цел популяризиране на бранда „Зеленото сърце на България“ - **да отпадне**, поради смислово дублиране на Дейност 4.3.2. Изработване и реализация на маркетингова и рекламна стратегия „Чепеларе – зеленото сърце на България“*

Оценка на напредъка по Приоритет 2. Развитие на международното сътрудничество и провеждане на активна инвестиционна политика

В ПИРО е предвидено Приоритет 2 да бъде реализиран чрез изпълнението на 2 мерки.

Констатации: Приоритет 2 фигурира в общия стратегически документ и в Приложение 1. Програма за реализация на ПИРО на община Чепеларе за периода 2021-2027 г.

При направения детайлен преглед е установено следното:

Мярка 2.1 Разработка и изпълнение на местна инвестиционна политика – описаните дейности се дублират смислово с други мерки/дейности включени в ПИРО.

Мярка 2.2 Включване в програми и проекти за трансгранично, европейско и международно сътрудничество – описаните дейности се дублират смислово с други мерки/дейности включени в ПИРО.

Оценка на Приоритет 2: Оценката на техническото изпълнение е **незадоволително – 0%**.

Препоръки: При актуализация на ПИРО да се отрази следното:

За **Мярка 2.1** Разработка и изпълнение на местна инвестиционна политика

- ✓ **Дейност 2.1.1.** Разработване на инвестиционна политика осигуряваща подкрепа и преференции за инвеститорите – **да отпадне**, поради липса на конкретика или да се дефинира ясно описание за същността и обхвата на дейността.
- ✓ **Дейност 2.1.2.** Провеждане на рекламна кампания за промоциране на община Чепеларе и бранда „Зеленото сърце на България“ пред потенциални инвеститори на различни регионални, национални и международни събития – **да отпадне**, поради смислово дублиране на Дейност 4.3.1. Разработване на Маркетингова, рекламна стратегия и провеждане на рекламна кампания за сертифициране и налагане на местни и регионални туристически марки част от бранда „Зеленото сърце на България“

За **Мярка 2.2.** Включване в програми и проекти за трансгранично, европейско и международно сътрудничество


- ✓ **Дейност 2.2.1.** Поддържане на установените партньорски отношения със Сарайлар, Мармара (РТурция), Куманово(Македония) и Просочани (Гърция) - **да отпадне**, поради смислово дублиране на обхвата на Приоритет 3. Изграждане на устойчиви партньорства на местно, регионално и трансгранично ниво.
- ✓ **Дейност 2.2.2.** Устойчиво развитие на територията и природните ресурси – **да отпадне**, направеният запис е формален, липсват конкретни проекти идеи, които да я изпълнят със съдържание. Така формулираната дейност е по – подходяща за цел.

- ✓ **Дейност 2.2.3.** Маркетинг и реклама на спортния, културния и екологичен туризъм в трансграничната област – **да отпадне**, поради смислово дублиране на Дейност 2.2.1. , защото в обхвата на поддържане на отношенията се включва - маркетинг и т.н.
- ✓ **Дейност 2.2.4.** Включване на местни фирми в български и международни мрежи за обмен на бизнес информация и положителни бизнес практики – **да отпадне**, така направения запис е по-скоро инструмент и по същество попада в обхвата на Дейност 4.3.1. Разработване на Маркетингова, рекламна стратегия и провеждане на рекламна кампания за сертифициране и налагане на местни и регионални туристически марки част от бранда „Зеленото сърце на България“
- Дейност 2.2.5.** Подобряване на социалните и здравните услуги и съпътстващата ги инфраструктура в трансграничната област - **да отпадне**, поради смислово дублиране на обхвата на Приоритет 10 Обновяване на социалната и здравната инфраструктура и подобряване качеството на предоставяните от тях услуги.

Оценка на напредъка по Приоритет 3. Изграждане на устойчиви партньорства на местно, регионално и трансгранично ниво.

В ПИРО е предвидено Приоритет 3 да бъде реализиран чрез изпълнението на 5 мерки.

Фигура 8. Оценка на напредъка по Приоритет 3. Изграждане на устойчиви партньорства на местно, регионално и трансгранично ниво.

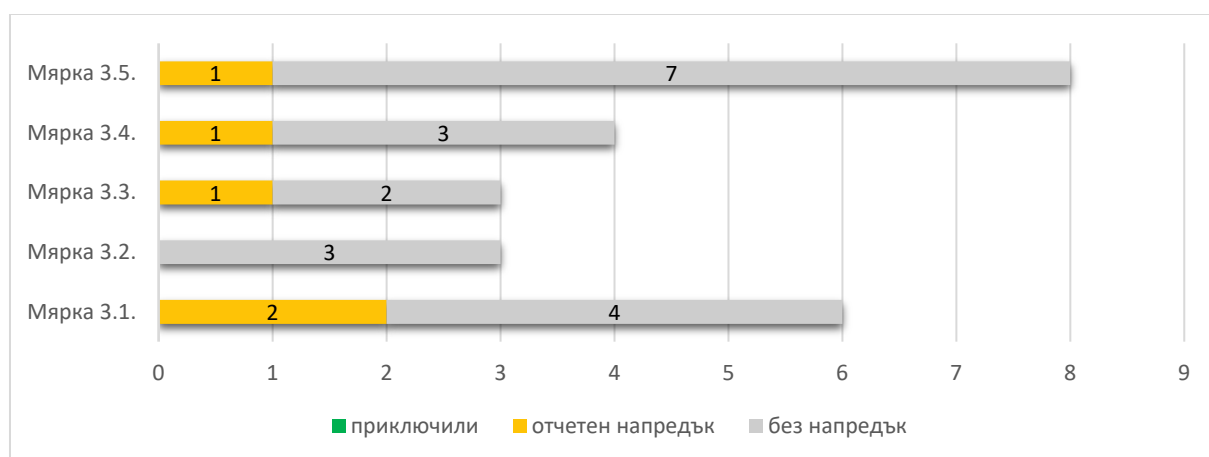

Констатации: Приоритет 3 фигурира в общия стратегически документ и в Приложение 1. Програма за реализация на ПИРО на община Чепеларе за периода 2021-2027 г.

При направения детайлен преглед е установено следното:

Мярка 3.1 Изграждане на устойчиви партньорства с икономически, социални и образователни партньорски организации – в обхвата на мярката са включени 6 дейности,

като по 2 от тях е отчетен напредък, насочени към професионалното образование с нуждите на местния бизнес.

Мярка 3.2 Изграждане на междубщински партньорства за реализация на регионални, национални и трансгранични инициативи – в обхвата на мярката са включени 3 дейности и не е отчетен напредък по нито една от тях.

Мярка 3.3 Увеличаване приноса на Местната Инициативна Група (МИГ) за развитие на местното предприемачество, обществените инфраструктури и услугите. – в обхвата на дейността са включени 3 дейности, като по 1 от тях се отчита напредък в резултат на проекти на частни бенефициенти за развитие на услугите и неземеделските дейности.

Мярка 3.4 Насърчаване на заетостта и подкрепа за мобилността на работната сила – в обхвата на дейността са включени 4 дейности, като по 1 от тях се отчита напредък в резултат на реализиране на програми за временна заетост.

Мярка 3.5 Подобряване качеството на човешките ресурси, чрез повишаване на образованието и квалификацията – в обхвата на дейността са включени 8 дейности, като отчетения напредък е само по 1 от тях - свързване на СУ „Олимпийски надежди“ с Национална спортна академия.

Оценка на Приоритет 3: Оценката на техническото изпълнение е **незадоволителна – 21 %**.

Препоръка: При актуализация на ПИРО да се синхронизират мерките между Текстовата част на документа и в Приложение 1. Програма за реализация на ПИРО на община Чепеларе за периода 2021-2027 г.

Мярка 3.1 Изграждане на устойчиви партньорства с икономически, социални и образователни партньорски организации

- ✓ Да се прецизира формулировката и дейностите, като се отчете обективната необходимост и приложимост от тяхното изпълнение, напр. Дейност 3.1.5. Аутсорсване на част от общинските услуги приоритетно в социалните дейности.
- ✓ Дейност 3.1.6. Изграждане на партньорства с публични и частни субекти – **да отпадне**, защото от така направената формулировка не става ясен обхватът на дейността и към какъв конкретен резултат е насочена

Мярка 3.4 Насърчаване на заетостта и подкрепа за мобилността на работната сила

- ✓ Дейност 3.4.3. Прилагане на различни програми с цел подобряване на трудовата заетост сред младежите – **да отпадне**, защото се включва в обхвата на Дейност 3.4.1. Активно включване в програмата за временна заетост

- ✓ Дейност 3.4.4. Разработване на проекти осигуряващи нови работни места – **да отпадне**, защото този тип проекти обикновено са насочени към друга тематична област и ангажимент е осигуряване на устойчива заетост.

Мярка 3.5 Подобряване качеството на човешките ресурси, чрез повишаване на образованието и квалификацията.

- ✓ Да се прецизира формулировката и дейностите, като се отчете необходимостта им от включване в ПИРО, напр. Дейност 3.5.5. Адаптиране на учебните планове за професионално обучение към нуждите на пазара на труда, което не е в правомощията на общинската администрация.
- ✓ Дейност 3.5.1. Повишаване квалификацията и преквалификацията сред младите хора – **да отпадне**, защото се включва в обхвата на Дейност 3.4.1. Активно включване в програмата за временна заетост.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2. ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ПРИОРИТЕТНИТЕ ОТРАСЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА


Изпълнението на Стратегическа цел 2 „Интегрирано развитие на приоритетните отрасли на територията на общината“ е предвидено да бъде постигната чрез 5 приоритета.

- ✓ Приоритет 4. Развитие на устойчиви форми на туризъм и на туристически атракции
- ✓ Приоритет 5. Изграждане на устойчиво и конкурентно горско стопанство
- ✓ Приоритет 6. Борба с пожарите, наводненията, неблагоприятните климатични промени и вредителите.
- ✓ Приоритет 7. Повишаване на конкурентоспособността на селскостопанската дейност и укрепване жизнеспособността на земеделските стопанства и фермите.
- ✓ Приоритет 8. Развитие на екологично земеделие и животновъдство

Оценка на напредъка по Приоритет 4. Развитие на устойчиви форми на туризъм и на туристически атракции

В ПИРО е предвидено Приоритет 4 да бъде реализиран чрез изпълнението на 6 мерки.

Фигура 9. Оценка на напредъка по Приоритет 4. Развитие на устойчиви форми на туризъм и на туристически атракции

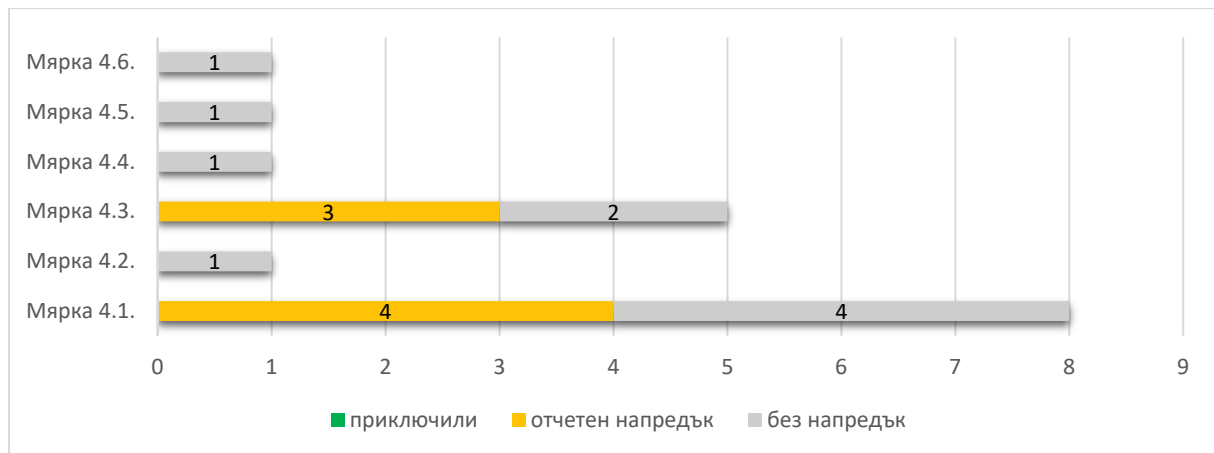

Констатации: Приоритет 4 фигурира в общия стратегически документ и в Приложение 1. Програма за реализация на ПИРО на община Чепеларе за периода 2021-2027 г.

При направения детайлен преглед е установено следното:

Мярка 4.1. Изграждане и обновяване на туристическата инфраструктура – отчетен напредък на база изпълнението на: извършване археологически разкопки на обект „Пещерно жилище – пещера „Чая“ в м. „Бабина вода“, инвестиции в екопътеки и в материалната база на Музей на родопския карст, гр. Чепеларе.

Мярка 4.2. Проучване на възможностите и подпомагане и стимулиране за развитие на различни видове туризъм, в това число еко, спортен и ловен туризъм с максимално усвояване на благоприятните способстващи фактори на средата – не е отчетено изпълнение. В програмата за реализация няма такава мярка. Налична е само в ПИРО.

Мярка 4.3. Подобряване на информираността, маркетинга и рекламата на местните туристически продукти – отчетен напредък на база изпълнението на реализация на маркетингова и рекламна стратегия „Чепеларе – зеленото сърце на България“, изпълнение на проекти за популяризиране туристическия потенциал, организирани събития и др.

Мярка 4.4. Активно участие в разработване на областна стратегия с цел по-пълно и всеобхватно реализиране планинския ресурс – не е отчетено изпълнение. В програмата за реализация няма такава мярка. Налична е само в ПИРО.

Мярка 4.5. Налагане на общ съвместен туристически бранд с общините в областта, съпроводен с комплексна маркетингова стратегия – не е отчетено изпълнение. В програмата за реализация няма такава мярка. Налична е само в ПИРО.

Мярка 4.6. Популяризиране на събития и мероприятия с местно значение, които допринасят за развитието на туризма – не е отчетено изпълнение. В програмата за реализация няма такава мярка. Налична е само в ПИРО.

Оценка на Приоритет 4: Оценката на техническото изпълнение е **добра – 41%**.

Препоръка: При актуализация на ПИРО да се синхронизират мерките между Текстовата част на документа и в Приложение 1. Програма за реализация на ПИРО на община Чепеларе за периода 2021-2027 г.

Мярка 4.4. Активно участие в разработване на областна стратегия с цел по-пълно и всеобхватно реализиране планирания ресурс – **да отпадне**, поради административен ангажимент на общинската администрация и не е необходимо включването в ПИРО.


Мярка 4.5. Налагане на общ съвместен туристически бранд с общините в областта, съпроводен с комплексна маркетингова стратегия – **да се детайлизират дейности** или да се обозначи, че ще се работи по утвърждаване на Родопски туристически район, съгл. териториалното делене на страната на туристически райони.

Мярка 4.6. Популяризиране на събития и мероприятия с местно значение, които допринасят за развитието на туризма - **да отпадне**, поради смислово дублиране с мярка 4.3.

Оценка на напредъка по Приоритет 5. Изграждане на устойчиво и конкурентно горско стопанство

В ПИРО е предвидено Приоритет 5 да бъде реализиран чрез изпълнението на 2 мерки.

Фигура 10. Оценка на напредъка по Приоритет 5. Изграждане на устойчиво и конкурентно горско стопанство

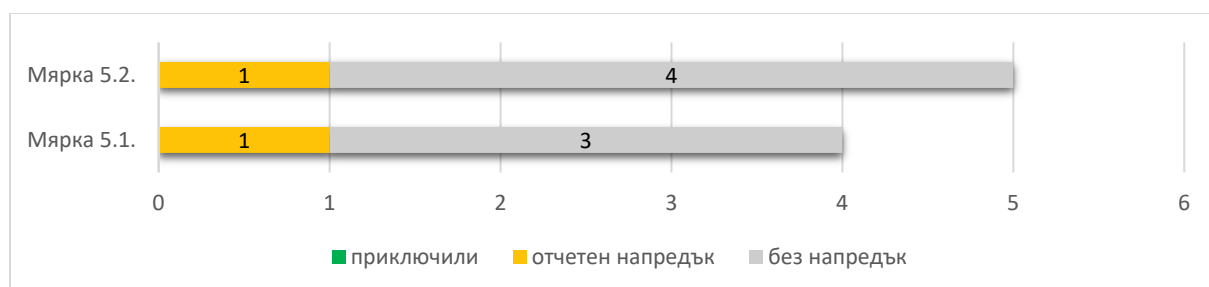

Констатации: Приоритет 5 фигурира в общия стратегически документ и в Приложение 1. Програма за реализация на ПИРО на община Чепеларе за периода 2021-2027 г.

При направения детайлен преглед е установено следното:

Мярка 5.1 Създаване на условия за развитие на съвременно, балансирано и природосъобразно горско стопанство – отчетеният напредък е резултат от реализиран проект за презалесяване на гори с финансиране от ЕС.


Мярка 5.2 Устойчиво управление на горите и горския фонд – отчетеният напредък е резултат от изготвени лесоустройствени планове.

Оценка на Приоритет 5: Оценка на техническото изпълнение е **незадоволителна – 22%**.

Оценка на напредъка по Приоритет 6. Борба с пожарите, наводненията, неблагоприятните климатични промени и вредителите.

В ПИРО е предвидено Приоритет 6 да бъде реализиран чрез изпълнението на 2 мерки.

Фигура 11. Оценка на напредъка по Приоритет 6. Борба с пожарите, наводненията, неблагоприятните климатични промени и вредителите.

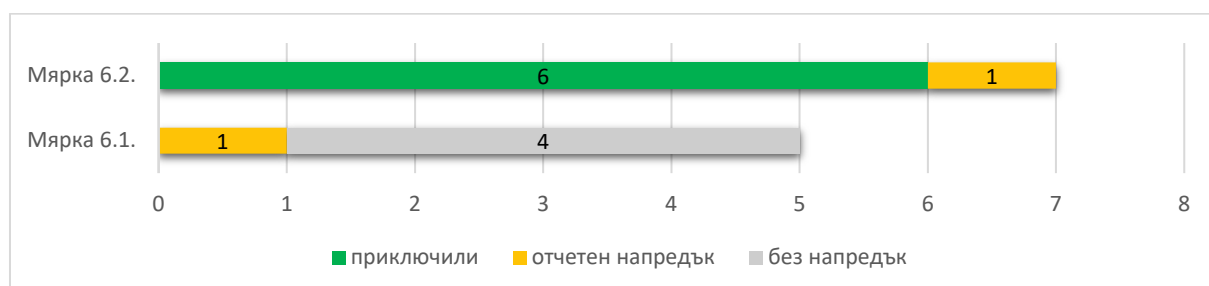

Констатации: Приоритет 6 фигурира в общия стратегически документ, но в Приложение 1. Програма за реализация на ПИРО на община Чепеларе за периода 2021-2027 г. не е включена Мярка 6.2 Борба с ерозията, наводненията, неблагоприятните климатични изменения и вредителите и към нея няма дефинирани дейности.

При направения детайлен преглед е установено следното:

Мярка 6.1 Изграждане на система за наблюдение, превенция и борба с пожарите – по предвидените 5 дейности, напредък се отчита само по Дейност 6.1.1. в резултат на закупени 2 броя високо проходими автомобили за нуждите в ситуации на бедствия и аварии.

Мярка 6.2 Борба с ерозията, наводненията, неблагоприятните климатични изменения и вредителите – реализирани са проекти за укрепване и изграждане на подпорни стени в урбанизираната територия; осигурен е ресурс за укрепване на срутища.

Оценка на Приоритет 6: Оценка на техническото изпълнение е **много добра – 67%**.

Препоръка: При актуализация на ПИРО да се синхронизират мерките между Текстовата част на документа и в Приложение 1. Програма за реализация на ПИРО на община Чепеларе за периода 2021-2027 г.

По **Мярка 6.1** Изграждане на система за наблюдение, превенция и борба с пожарите – да се прецизират включените дейности и се прецени възможността и степента на

готовност на Община Чепеларе за тяхната реализация в периода до 2027г., напр. Дейност 6.1.5. Изграждане на хеликоптерна площадка – **да отпадне**. Така формулираните дейности за изграждане на минерализовани ивици, поставяне на предупредителни табели, устройване на противопожарни депа могат да се разглеждат като елементи на общ проект за превенция срещу пожарите.

Оценка на напредъка по Приоритет 7. Повишаване на конкурентоспособността на селскостопанската дейност и укрепване жизнеспособността на земеделските стопанства и фермите.

В ПИРО е предвидено Приоритет 7 да бъде реализиран чрез изпълнението на 2 мерки.

Фигура 12. Оценка на напредъка по Приоритет 7. Повишаване на конкурентоспособността на селскостопанската дейност и укрепване жизнеспособността на земеделските стопанства и фермите.



Констатации: Приоритет 7 фигурира в общия стратегически документ, но в Приложение 1. Програма за реализация на ПИРО на община Чепеларе за периода 2021-2027 г. не е включена Мярка 7.2. Обмяна на ноу-хау със съседни общини и с трансгранични партньори за приложими иновативни технологии и практики в земеделието.

При направения детайлен преглед е установено следното:

Мярка 7.1 Изграждане на съвременно, иновативно селско стопанство – отчита се напредък само по 1 от планираните дейности - Дейност 7.1.4. Съдействие за реконструкция и осъвременяване на земеделските стопанства, към която са отнесени проекти на частни бенефициенти, финансирани от ПРСР 2014-2020г.

Мярка 7.2. Обмяна на ноу-хау със съседни общини и с трансгранични партньори за приложими иновативни технологии и практики в земеделието – не е отчетено изпълнение.

Оценка на Приоритет 7: Оценката на техническото изпълнение е **незадоволително – 13%**.

Препоръка: При актуализация на ПИРО да се синхронизират мерките между Текстовата част на документа и в Приложение 1. Програма за реализация на ПИРО на община Чепеларе за периода 2021-2027 г.

Мярка 7.2. Обмяна на ноу-хау със съседни общини и с трансгранични партньори за приложими иновативни технологии и практики в земеделието – **да отпадне.**

Оценка на напредъка по Приоритет 8. Развитие на екологично земеделие и животновъдство

В ПИРО е предвидено Приоритет 8 да бъде реализиран чрез изпълнението на 1 мярка, в която са включени 6 дейности.

Констатации: Приоритет 8 фигурира в общия стратегически документ и в Приложение 1. Програма за реализация на ПИРО на община Чепеларе за периода 2021-2027 г.

Оценка на Приоритет 8: Оценката на техническото изпълнение е **незадоволително – 0%.**

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3. ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО КАЧЕСТВЕНИ ЗДРАВНИ, СОЦИАЛНИ, КУЛТУРНИ УСЛУГИ И СПОРТ


Изпълнението на Стратегическа цел 3 „Подобряване на достъпа до качествени здравни, социални, културни услуги и спорт“ е предвидено да бъде постигната чрез 2 приоритета.

- ✓ Приоритет 9. Превръщане на град Чепеларе в разпознаваем център на спорта с налагането на бранд „Чепеларе-европейски град на спорта“, чрез развитие на атрактивни и устойчиви форми на спорт и тренировъчна дейност
- ✓ Приоритет 10. Обновяване на социалната и здравната инфраструктура и подобряване качеството на предоставяните от тях услуги

Оценка на напредъка по 9. Превръщане на град Чепеларе в разпознаваем център на спорта с налагането на бранд „Чепеларе-европейски град на спорта“, чрез развитие на атрактивни и устойчиви форми на спорт и тренировъчна дейност

В ПИРО е предвидено Приоритет 9 да бъде реализиран чрез изпълнението на 3 мерки.

Фигура 13. Оценка на напредъка по Приоритет 9. Превръщане на град Чепеларе в разпознаваем център на спорта с налагането на бранд „Чепеларе-европейски град на спорта“, чрез развитие на атрактивни и устойчиви форми на спорт и тренировъчна дейност

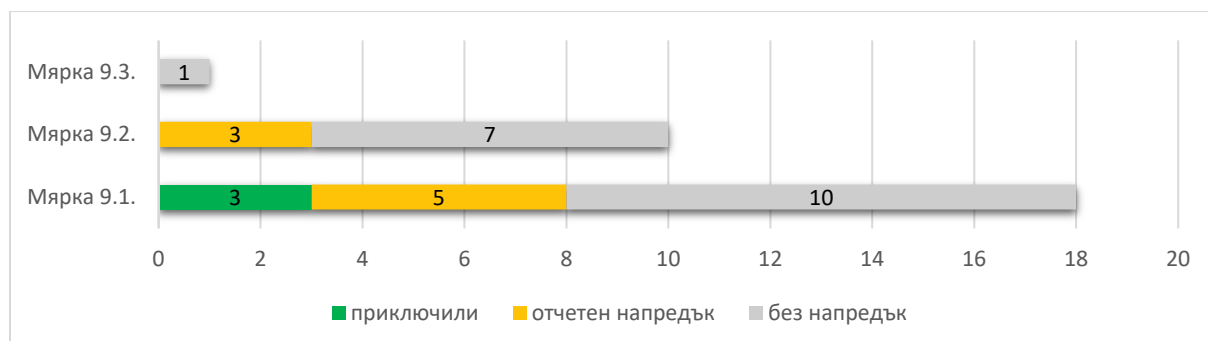

Констатации: Приоритет 9 фигурира в общия стратегически документ, но в Приложение 1. Програма за реализация на ПИРО на община Чепеларе за периода 2021-2027 г. не се включена **Мярка 9.3.** Дейности по разработване и популяризиране на този бранд и превръщането му на разпознаваем и привлекателен слоган за общината.

При направения детайлен преглед е установено следното:

Мярка 9.1. Изграждане и обновяване на спортната инфраструктура и услуги на територията на общината – отчетеният напредък е в резултат на значими проекти на Община Чепеларе.

Мярка 9.2. Реконструкция и изграждане на паркове и градини – отчетеният напредък е на база както на проекти на Община Чепеларе, финансирани от ЕС и целеви трансфери, така и на кметствата.

Мярка 9.3. Дейности по разработване и популяризиране на този бранд и превръщането му на разпознаваем и привлекателен слоган за общината – не се отчита напредък

Оценка на Приоритет 9: Оценката на техническото изпълнение е **добра – 38%.**

Препоръка: При актуализация на ПИРО да се синхронизират мерките между Текстовата част на документа и в Приложение 1. Програма за реализация на ПИРО на община Чепеларе за периода 2021-2027 г.

По Мярка 9.1. Изграждане и обновяване на спортната инфраструктура и услуги на територията на общината

- ✓ **Да се прецизират дейностите, които водят до изпълнение на мярката, напр. Дейност 9.1.2. Реконструкция на съществуващата спортна база е много обща формулирана, а следващи дейности включват конкретни обекти.**

По Мярка 9.2 Реконструкция и изграждане на паркове и градини:

- ✓ **Дейност 9.2.2. Обособяване, благоустрояване и озеленяване на нови междублокови и паркови пространства и Дейност 9.2.3. Рехабилитация на**

съществуващите паркови и междублокови пространства – **да се предефинират**, напр. Дейност 9.2.2. да стане „Рехабилитация и изграждане на нови паркови и междублокови пространства в град Чепеларе“, а дейност 9.2.3. да стане „Благоустрояване на малките населени места в общината“. Така ще се постигне ясно разграничаване при насочване на инвестиции към общинския център и към селата, както и ще се обособи дейност към са релевантни проектите за подобряване на градската среда в малките населени места.


- ✓ Дейност 9.2.8. Благоустрояване на Градски парк - **да отпадне**, поради смислово дублиране с Дейност 9.2.6. „Обновяване на централен градски парк с площад и пешеходна алея в УПИ VII-Централен градски парк с пешеходна алея в град Чепеларе“

По Мярка 9.3. Дейности по разработване и популяризиране на този бранд и превръщането му на разпознаваем и привлекателен слоган за общината - **да отпадне**, поради неяснота във формулировката: „този бранд“, а популяризирането се дублира на много места в ПИРО.

Оценка на напредъка по Приоритет 10. Обновяване на социалната и здравната инфраструктура и подобряване качеството на предоставяните от тях услуги

В ПИРО е предвидено Приоритет 10 да бъде реализиран чрез изпълнението на 4 мерки.

Фигура 14. Оценка на напредъка по Приоритет 10. Обновяване на социалната и здравната инфраструктура и подобряване качеството на предоставяните от тях услуги

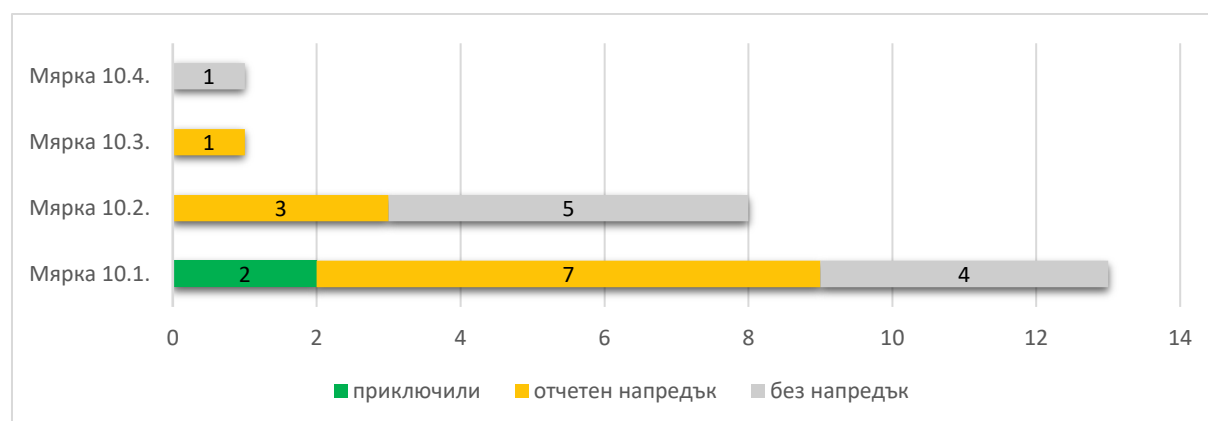

Констатации: Приоритет 10 фигурира в общия стратегически документ, но в Приложение 1. Програма за реализация на ПИРО на община Чепеларе за периода 2021-2027 г. не са включени следните мерки: **Мярка 10.3.** Подкрепа за медицинските практики и аптечната мрежа във всички населени места от общината и **Мярка 10.4.** Насърчаване на

раждаемостта чрез пакет от финансови стимули и предоставяне на допълнителни социални услуги в помощ на родителите

При направения детайлен преглед е установено следното:

Мярка 10.1. Насърчаване на социалното приобщаване и намаляването на бедността, чрез осигуряване на адекватна социална инфраструктура и интеграция на групите в неравностойно положение – отчетеният напредък е в резултат от изпълнението на проекти с бенефициент Община Чепеларе, с финансиране от ЕС, държавен и общински бюджет, Агенция за хората с увреждания и др., насочени към развитие на социалните услуги.

Мярка 10.2. Предоставяне на по-качествени здравни грижи и осъвременяване на здравната инфраструктура в общината – отчетеният напредък е в резултат на проекти с финансиране от ЕС на частни бенефициенти.

Мярка 10.3. Подкрепа за медицинските практики и аптечната мрежа във всички населени места от общината – не се отчита напредък

Мярка 10.4. Насърчаване на раждаемостта чрез пакет от финансови стимули и предоставяне на допълнителни социални услуги в помощ на родителите – отчита се ежегоден напредък.

Оценка на Приоритет 10: Оценката на техническото изпълнение е много **добра – 57%**.

Препоръка: При актуализация на ПИРО да се синхронизират мерките между Текстовата част на документа и в Приложение 1. Програма за реализация на ПИРО на община Чепеларе за периода 2021-2027 г.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4.

Относно Стратегическа цел има открито несъответствие в документа.

В общия стратегически документ са изведени Стратегическа цел 3 (стр. 131) и Стратегическа цел 5 (стр. 133).

В Приложение 1. Програма за реализация на ПИРО на община Чепеларе за периода 2021-2027 г. – стратегическите цели са без номерация, но от направената проверка – няма текстови запис са Стратегическа цел 4.

В Приложение 3. Матрица на индикаторите – индикатори за резултат е посочена Стратегическа цел 4. Подобряване и развитие на общинска инфраструктурата, повишаване на енергийната ефективност в публичния и частния сектор, чиято формулировка изцяло съответства на Стратегическа цел 5.

С оглед спазване на номерацията, посочена в ПИРО е запазена номерацията.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 5. ПОДОБРЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРАТА, ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ПУБЛИЧНИЯ И ЧАСТНИЯ СЕКТОР


Изпълнението на Стратегическа цел 6 „Подобряване и развитие на общинска инфраструктурата, повишаване на енергийната ефективност в публичния и частния сектор“ с е предвидено да бъде постигната чрез 5 приоритета.

- ✓ Приоритет 11 Подобряване на свързаността и достъпността на пътната инфраструктура и уличната мрежа.
- ✓ Приоритет 12 Обновяване на водоснабдителната инфраструктура и услуги.
- ✓ Приоритет 13 Повишаване на енергийната ефективност, чрез изграждане на алтернативни енергийни източници и обновяване на енергийната инфраструктура.
- ✓ Приоритет 14 Обновяване и осъвременяване на съобщителната мрежа и цифрова свързаност
- ✓ Приоритет 15 Изграждане и благоустрояване на специализираните инфраструктури

Оценка на напредъка по Приоритет 11 Подобряване на свързаността и достъпността на пътната инфраструктура и уличната мрежа

В ПИРО е предвидено Приоритет 11 да бъде реализиран чрез изпълнението на 3 мерки.

Фигура 15. Оценка на напредъка по Приоритет 11 Подобряване на свързаността и достъпността на пътната инфраструктура и уличната мрежа

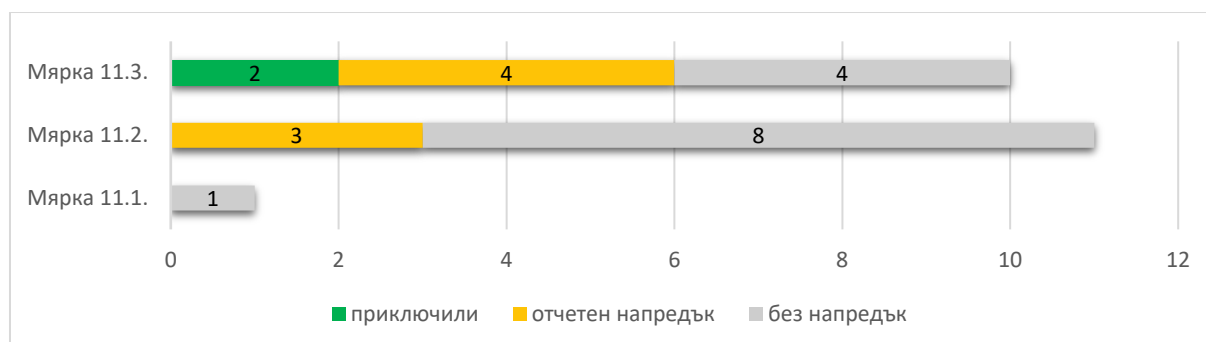

Констатации: Приоритет 11 фигурира в общия стратегически документ и в Приложение 1. Програма за реализация на ПИРО на община Чепеларе за периода 2021-2027 г.

При направения детайлен преглед е установено следното:

Мярка 11.1. Изграждане на регионалната транспортна свързаност – не се отчита напредък по изпълнението на проекта за изграждане на обходна пътна артерия през град Чепеларе

Мярка 11.2. Изграждане и рехабилитация на общинската пътна инфраструктура и привеждането ѝ в съответствие с европейските изисквания – отчетеният напредък е в резултат на изпълнени ремонти на път към Чудните мостове, с.Забърдо; път SML 3320 с. Богутево, Острица и Лилеково; път в Горна махала в с. Зорница


Мярка 11.3. Изграждане и рехабилитация на вътрешно-уличната мрежа – отчетеният напредък е на проекти с финансиране от ЕС, целеви трансфер от държавния бюджет, общински бюджет и проектите, включени за финансиране от Инвестиционната програма за общински проекти по чл. 107, ал. 13 от ЗДБРБ.

Оценка на Приоритет 11: Оценката на техническото изпълнение е **добра – 41%**.

Оценка на напредъка по Приоритет 12 Обновяване на водоснабдителната инфраструктура и услуги

В ПИРО е предвидено Приоритет 12 да бъде реализиран чрез изпълнението на 3 мерки.

Фигура 16. Оценка на напредъка по Приоритет 12 Обновяване на водоснабдителната инфраструктура и услуги

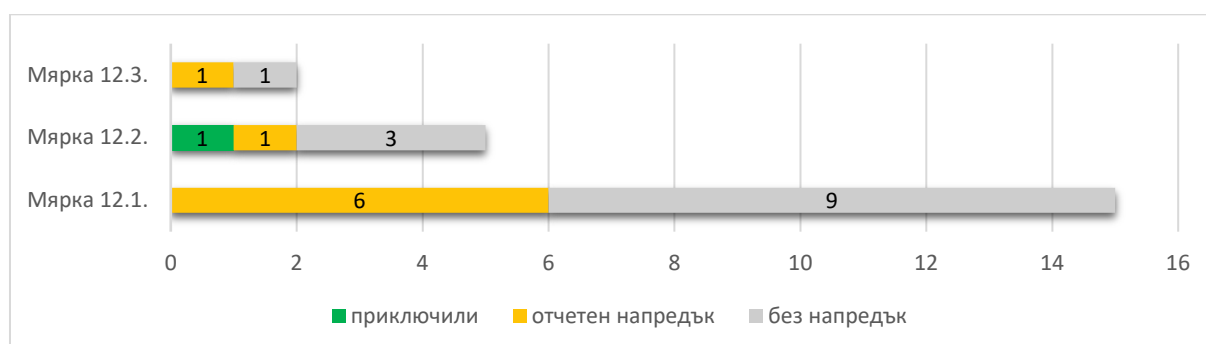

Констатации: Приоритет 12 фигурира в общия стратегически документ и в Приложение 1. Програма за реализация на ПИРО на община Чепеларе за периода 2021-2027 г.

При направения детайлен преглед е установено следното:

Мярка 12.1. Изграждане и реконструкция на ВИК мрежа, ПСОВ и пречиствателни станции за питейна вода – отчита се напредък на база изпълнение на 6 от дейностите, като при извършване на оценката са идентифицирани 2 проекта за които е осигурено финансиране: Проект „Рехабилитация на магистрален водопровод за водоснабдителна група Орехово – Малево – Хвойна – Павелско и Проект „Реконструкция на ул. „Ручей“ от км 0+000 до км 0+195 – гр. Чепеларе, включени за финансиране от Инвестиционната програма за общински проекти по чл. 107, ал. 13 от ЗДБРБ.

Мярка 12.2. Изграждане на водоизточници, санитарно-охранителни зони около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване и нови водохващания – отчита се напредък в резултат изпълнената дейност за възстановяване на подпорна стена и водосток под УПИ III и УПИ IV кв. 57- гр. Чепеларе и възстановяване на подпорна стена за укрепване на десния бряг на р. Камбурска, под УПИ X на ул. К. Ванчева - гр. Чепеларе.


Мярка 12.3. Регулиране на речните корита с цел намаляване на опасностите от наводнения - отчита се напредък на база изпълнение на подпорните стени по десния бряг на река Сивковска, гр. Чепеларе.

Оценка на Приоритет 12: Оценката на техническото изпълнение е **добра – 41%**.

Оценка на напредъка по Приоритет 13 Повишаване на енергийната ефективност, чрез изграждане на алтернативни енергийни източници и обновяване на енергийната инфраструктура

В ПИРО е предвидено Приоритет 13 да бъде реализиран чрез изпълнението на 7 мерки.

Фигура 17. Оценка на напредъка по Приоритет 13 Повишаване на енергийната ефективност, чрез изграждане на алтернативни енергийни източници и обновяване на енергийната инфраструктура

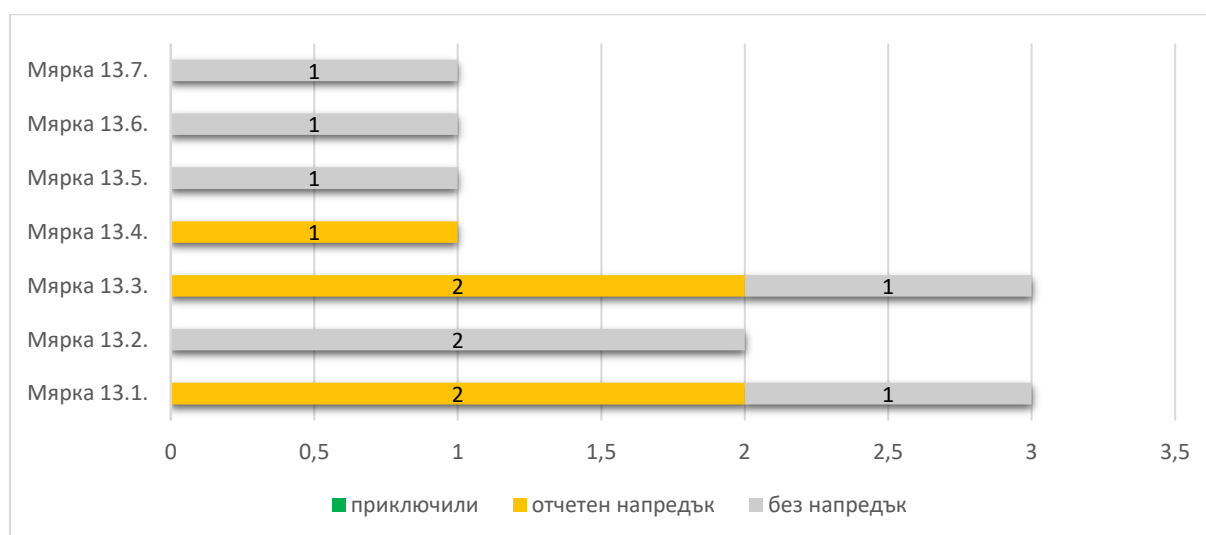

Констатации: Приоритет 13 фигурира в общия стратегически документ и в Приложение 1. Програма за реализация на ПИРО на община Чепеларе за периода 2021-2027 г.

При направения детайлен преглед е установено следното:

Мярка 13.1. Изграждане и обновяване на електропреносната мрежа - отчита се напредък на база изпълнение на 2 от дейностите за рехабилитация и модернизация на системите за външно изкуствено осветление в населените места на общината.

Мярка 13.2. Изграждане и експлоатация на енергийната инфраструктура и алтернативните източници на енергия – не е отчетен напредък при изпълнението на 2-те планирани дейности.

Мярка 13.3. Подобряване на енергийната ефективност на общинския сграден фонд – отчита се напредък на база изпълнение на 2 от дейностите за реализиране на проекти за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни и еднофамилни жилищни сгради и производствени сгради.

Мярка 13.4. Широко популяризиране сред обществеността на ползите, възможностите и задълженията за енергийна ефективност и спестявания съгласно българското и европейско законодателство – не са предвидени дейности и не е планиран бюджет.

Марка 13.5. Стимулиране ползването на алтернативни/възобновяеми енергийни източници – не са предвидени дейности и не е планиран бюджет.

Мярка 13.6. Широко популяризиране сред обществеността на ползите, възможностите и задълженията за Ползване на ВЕИ енергия съгласно българското и европейско законодателство – не са предвидени дейности и не е планиран бюджет.

Мярка 13.7. Проучване на възможността за насърчителни мерки, в това число данъчни стимули при изпълнение на мерки за енергийна ефективност и нови ВЕИ мощности– не са предвидени дейности и не е планиран бюджет.

Оценка на Приоритет 13: Оценката на техническото изпълнение е **добра – 42%**.


Препоръки: При актуализация на ПИРО да се предвидят конкретни дейности за изпълнение на Марка 13.5., Мярка 13.7., които са в компетенциите на общинската администрация или **да отпаднат**.

Мярка 13.6. – да отпадне, поради дублиране на Мярка 13.4.

Оценка на напредъка по Приоритет 14 Обновяване и осъвременяване на съобщителната мрежа и цифрова свързаност

В ПИРО е предвидено Приоритет 14 да бъде реализиран чрез изпълнението на 3 мерки.

Фигура 18. Оценка на напредъка по Приоритет 14. Обновяване и осъвременяване на съобщителната мрежа и цифрова свързаност

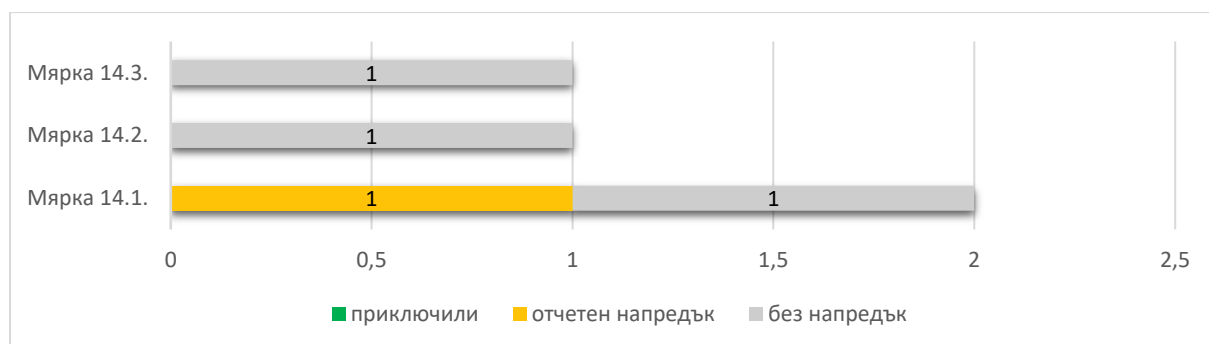

Констатации: Приоритет 14 фигурира в общия стратегически документ и в Приложение 1. Програма за реализация на ПИРО на община Чепеларе за периода 2021-2027 г.

При направения детайлен преглед е установено следното:

Мярка 14.1. Модернизация на телекомуникационната мрежа на територията на общината са предвидени 2 дейности, като реален напредък има от 2025г. с изпълнението на проект BG-RRP-7.008-0004-C01 Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) на Република България - Южен централен район за планиране

Мярка 14.2. Проучване на възможностите и изпълнение на дейности по изграждане на свръхбърза широколентова инфраструктура – не са предвидени дейности и не е планиран бюджет.

Мярка 14.3. Осигуряване на свързаност към единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на държавната администрация – не са предвидени дейности и не е планиран бюджет.


Оценка на Приоритет 14: Оценката на техническото изпълнение е **незадоволителна – 25%.**

Препоръки: При актуализация на ПИРО да се предвидят конкретни дейности за изпълнение на Мярка 14.2. и Мярка 14.3., или **да отпаднат.**

Оценка на напредъка по Приоритет 15 Изграждане и благоустрояване на специализираните инфраструктури

В ПИРО е предвидено Приоритет 15 да бъде реализиран чрез изпълнението на 2 мерки.

Фигура 19. Оценка на напредъка по Приоритет 15 Изграждане и благоустрояване на специализираните инфраструктури

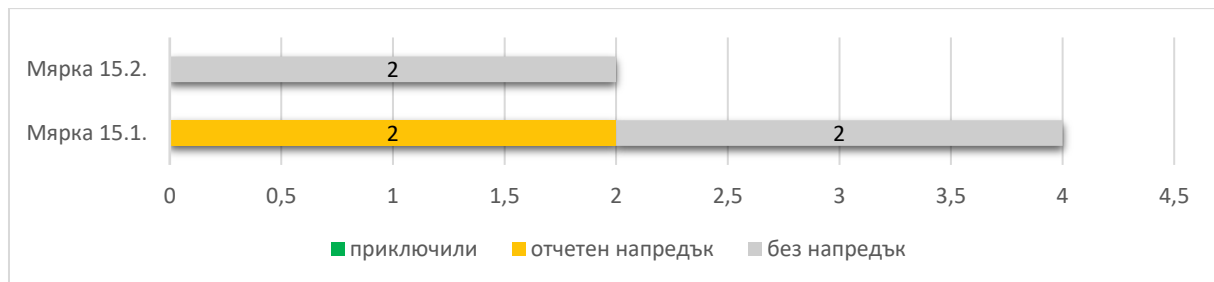

Констатации: Приоритет 15 фигурира в общия стратегически документ и в Приложение 1. Програма за реализация на ПИРО на община Чепеларе за периода 2021-2027 г.

При направения детайлен преглед е установено следното:

Мярка 15.1. Благоустрояване на специализираните инфраструктури се изпълнява чрез планирани 4 дейности, като отчетения напредък е в резултат на покупка на земя за разширяване на гробищен парк в гр. Чепеларе и възстановяване на подпорна стена на улица и основен ремонт на улица към гробищен парк в с. Забърдо.

Мярка 15.2. Актуализиране на кадастралните карти и регулационните планове -не се отчита изпълнение на предвидените 2 дейности.

Оценка на Приоритет 15: Оценката на техническото изпълнение е **добра – 33%**.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 6. ПОВИШАВАНЕ НА ЖИЗНЕНИЯ СТАНДАРТ ЧРЕЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ, КУЛТУРА И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО


Изпълнението на Стратегическа цел 6 „Повишаване на жизнения стандарт чрез конкурентоспособно образование и обучение, култура и културно-историческо наследство“ с е предвидено да бъде постигната чрез 2 приоритета

- ✓ Приоритет 16. Инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия живот
- ✓ Приоритет 17. Културна инфраструктура и културно наследство

Оценка на напредъка по Приоритет 16. Инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия живот

В ПИРО е предвидено Приоритет 16 да бъде реализиран чрез изпълнението на 4 мерки.

Фигура 20. Оценка на напредъка по Приоритет 16. Инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия живот

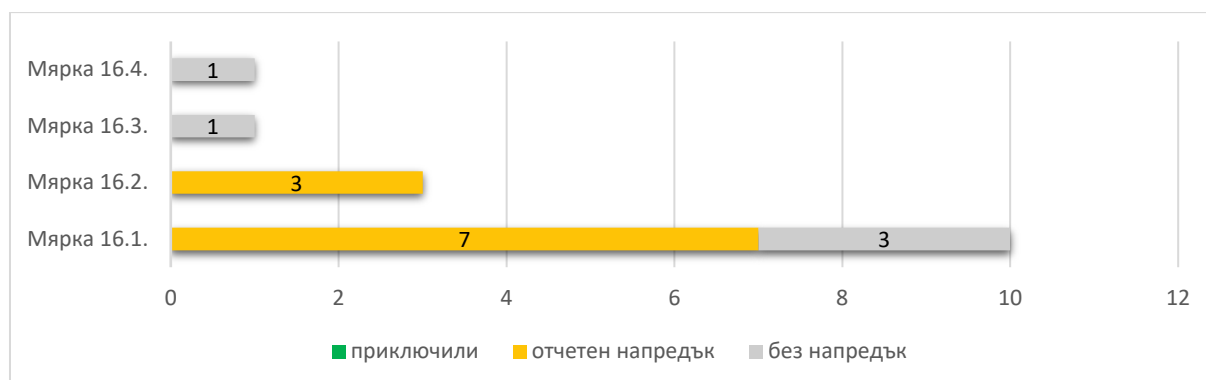

Констатации: Приоритет 16 фигурира в общия стратегически документ и в Приложение 1. Програма за реализация на ПИРО на община Чепеларе за периода 2021-2027 г.

При направения детайлен преглед е установено следното:

Мярка 16.1. Обновяване на образователната инфраструктура и подобряване степента на образованост сред гражданите се изпълнява чрез 10 планирани дейности, като инвестициите са насочени към подобряване качеството на образователната инфраструктура, вкл. детски и спортни площадки.

Мярка 16.2. Стимулиране на иновационните подходи в работата с децата и учениците и извънкласните занимания се изпълнява чрез 3 планирани дейности по които се отчита напредък чрез инвестиции за нови информационно-комуникационни активи и реализиране проекти на училищата с финансиране основно от Националните програми на Министерство на образованието и науката.

Мярка 16.3. Повишаване квалификацията на безработни и трудово неактивни лица в различни обучения и стажове – не са предвидени дейности и не е планиран бюджет.

Мярка 16.4. Мерки за допълнителна квалификация, преквалификация с цел адаптиране към новите изисквания на пазара на труда – не са предвидени дейности и не е планиран бюджет.

Оценка на Приоритет 16: Оценката на техническото изпълнение е **много добра – 67%**.

Препоръки: При актуализация на ПИРО да се отрази следното:

Мярка 16.3. Повишаване квалификацията на безработни и трудово неактивни лица в различни обучения и стажове – **да отпадне**, попада в обхвата на Мярка 3.5 Подобряване качеството на човешките ресурси, чрез повишаване на образованието и квалификацията.

Мярка 16.4. Мерки за допълнителна квалификация, преквалификация с цел адаптиране към новите изисквания на пазара на труда – **да отпадне**, попада в обхвата на Мярка 3.5

Подобряване качеството на човешките ресурси, чрез повишаване на образованието и квалификацията.

Оценка на напредъка по Приоритет 17. Културна инфраструктура и културно наследство

В ПИРО е предвидено Приоритет 17 да бъде реализиран чрез изпълнението на 2 мерки, към всяка от които са посочени конкретни дейности.

Фигура 21. Оценка на напредъка по Приоритет 17. Културна инфраструктура и културно наследство



Констатации: Приоритет 17 фигурира в общия стратегически документ и в Приложение 1. Програма за реализация на ПИРО на община Чепеларе за периода 2021-2027 г.

При направения детайлен преглед е установено следното:

Мярка 17.1. Реновиране сградите на читалищата и културните институции в общината се отчита напредък само по Дейност 17.1.4. в резултат на обновяване на библиотечния фонд на библиотека към НЧ „Родопска искра 1880“ град Чепеларе.

Мярка 17.2. Съхраняване, развитие и популяризиране на културно-историческото наследство включва дейности, които дублират дейности, включени основно в Приоритет 4 и са отчетени към него.

Оценка на Приоритет 17: Оценката на техническото изпълнение е **незадоволително – 9%**.

Препоръки: За **Мярка 17.1.** Реновиране сградите на читалищата и културните институции в общината - **да се предприеме изпълнение на планираните дейности.**

При актуализация на ПИРО да се отрази следното:

Мярка 17.2. Съхраняване, развитие и популяризиране на културно-историческото наследство.

**Доклад за резултатите от междинна оценка за периода 2021 – 2024г.
на План за интегрирано развитие на община Чепеларе (2021 – 2027г.)**

- ✓ Дейност 17.2.1. Популяризиране на местните празници, обичаи и занаяти – **да отпадне**, поради дублиране на Дейност 4.3.5. Популяризиране на местните културни традиции, обреди и обичаи
- ✓ Дейност 17.2.2. Възпроизвеждане на местните празници и обичаи – **да отпадне**, поради смислово Дублира Дейност 4.3.5. Популяризиране на местните културни традиции, обреди и обичаи
- ✓ Дейност 17.2.3. Провеждане на рекламни кампании, популяризиращи паметниците на културата и местния фолклор. – **да отпадне**, поради дублиране на Дейност 4.3.3. Провеждане на рекламна кампания за популяризиране на културните и природните забележителности на територията на общината
- ✓ Дейност 17.2.4. Увеличаване на информацията за недвижимите паметници на културата и обектите на недвижимото културно-историческо наследство. – **да отпадне**, поради дублиране на Дейност 4.3.3. Провеждане на рекламна кампания за популяризиране на културните и природните забележителности на територията на общината
- ✓ Дейност 17.2.5. Създаване на демонстрационно-търговски център на занаятите в град Чепеларе – да се препозиционира в стратегическата рамка и **да се допълни към Мярка 1.1** Подобряване на достъпа и изграждане на местна инфраструктура, подпомагаща бизнеса.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 7. „УМНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРОДЪЛЖАВАЩА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ПРОЦЕСИ“

Изпълнението на 7 „Умно управление на общинската администрация, продължаваща модернизация на административните процеси“ е предвидено да бъде постигната чрез 7 приоритета:

- ✓ Приоритет 18. Благоустрояване на обекти на общественото обслужване и подобряване достъпа до основните административни услуги.
- ✓ Приоритет 19 Подобряване на квалификацията и обmena на добри практики.


Оценка на напредъка по Приоритет 18. Благоустрояване на обекти на общественото обслужване и подобряване достъпа до основните административни услуги.

В ПИРО е предвидено Приоритет 18 да бъде реализиран чрез изпълнението на 3 мерки.

**Доклад за резултатите от междинна оценка за периода 2021 – 2024г.
на План за интегрирано развитие на община Чепеларе (2021 – 2027г.)**

В Приоритет 18 оценката за напредъка е направена на база дефинирани дейности към всяка от мерките.

Фигура 22. Оценка на напредъка по Приоритет 18. Благоустрояване на обекти на общественото обслужване и подобряване достъпа до основните административни услуги

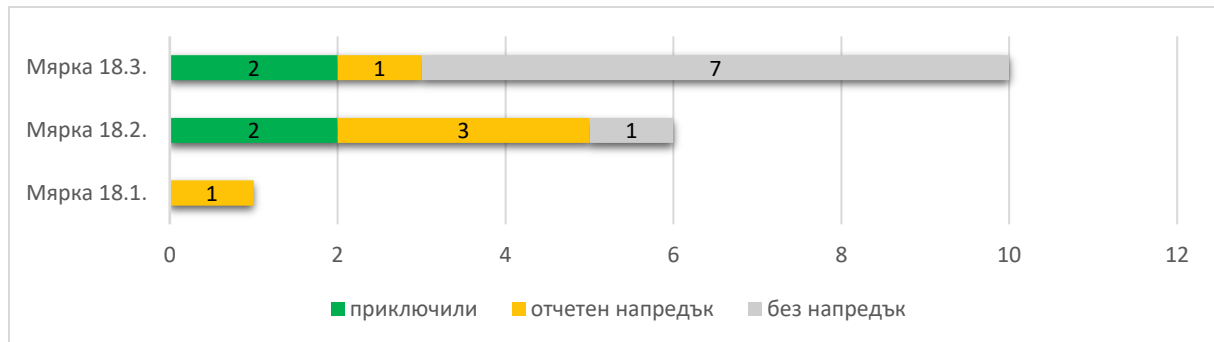

Констатации: Приоритет 18 фигурира в общия стратегически документ и в Приложение 1. Програма за реализация на ПИРО на община Чепеларе за периода 2021-2027 г.

При направения детайлен преглед е установено следното:

Мярка 18.1. Благоустрояване и модернизиране на обекти обслужващи граждани и бизнес, няма предвидени дейности, но към тях са отнесени изпълнени инициативи за ремонт, оборудване и др.

Мярка 18.2. Подобряване на качеството и видовете административни услуги, предлагане на електронни услуги и намаляване на срока за административни обслужване – отчетен напредък. Част от описаните дейности се дублират смислово с други мерки/дейности включени в ПИРО.

Мярка 18.3. Обновяване на хардуера и софтуера в общинска администрация. Описаните дейности в обхвата на тази мярка не съответстват на предполагаемото съдържание на мярката. По същество обновяването на хардуера и софтуера на общинската администрация не е мярка, а е дейност която пряко е свързана с подобряване на административното обслужване.

Оценка на Приоритет 18: Оценката на техническото изпълнение е много добра – 53%.

Препоръки: При актуализация на ПИРО да се отрази следното:

За Мярка 18.2. Подобряване на качеството и видовете административни услуги, предлагане на електронни услуги и намаляване на срока за административни обслужване, **да се редуцират дейностите** с цел избягване на дублиране в други раздели на ПИРО.

- ✓ Дейност 18.2.2.Проучване на потребностите от специализирано обучение на общинските служители и последващото им провеждане – **да отпадне**

- ✓ Дейност 18.2.3. Специализирани обучения на служителите, включването им в мрежи и др. **да отпадне** поради смислово дублиране с Дейност 19.1.2. Обучение и обмен на добри практики на представителите на общинската администрация за управление на проектите.
- ✓ Дейност 18.2.4. Обучение и обмен на добри практики на служителите на общинската администрация за подобряване качеството на предоставените услуги, за е-община и за разработване на общински политики. – **да отпадне** поради смислово дублиране с Дейност 19.1.2. Обучение и обмен на добри практики на представителите на общинската администрация за управление на проектите.
- ✓ Дейност 18.2.6. Непрекъснато измерване удовлетвореността на гражданите за предоставените от общината услуги с цел повишаване на качеството – **да отпадне**.

Мярка 18.3. Обновяване на хардуера и софтуера в общинска администрация – **да отпадне**.

Към Мярка 18.2. да се релокират следните дейности, защото реално имат принос към подобряване на качеството и видовете административни услуги:

- ✓ Дейност 18.3.7. Активно взаимодействие с гражданското общество
- ✓ Дейност 18.3.8. Издаване на месечен информационен бюлетин отразяващ най-важните общински събития.
- ✓ Дейност 18.3.3. Изработване на информационни табла в центъра на града популяризиращи общинските инициативи
- ✓ Дейност 18.3.4. Техническо осъвременяване на Интернет радиото и по-активното му използване за подобряване информираността сред гражданите.
- ✓ Дейност 18.3.9. Откриване на ефирно радио в Чепеларе

Предлага се да отпаднат:

- ✓ Дейност 18.3.1. Реклама и публичност на културните, екологичните и социалните общински инициативи – многократно дублиране и смислово преповтаряне с дейности, предвидени в други мерки.
- ✓ Дейност 18.3.2. Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите и резултатите при реализацията на различните проекти – дейността е неделима част от цялостното изпълнение на проекта, затова следва да се отчита към него и не е необходимо изкуствено отделяне.
- ✓ Дейност 18.3.5. Проучване на общественото мнение за определяне ефективността на реализираните проекти и предлаганите услуги – смислово дублиране с Дейност 18.2.6., предложена за отпадане.

- ✓ Дейност 18.3.6. Допитване до населението по важни за местната общност въпроси, чрез онлайн платформи – това е нормативно задължение на администрацията и не е необходимо да бъде включено в ПИРО.
- ✓ Дейност 18.3.10. Подобряване на информираността в областта на селското стопанство и популяризиране на изискванията на ПРСР – дейността е нерелевантна към мярка 18.3. към която е отнесена. **Да отпадне, поради наличие на сходни мерки в Приоритет 7 и Приоритет 8.**

Оценка на напредъка по Приоритет 19 Подобряване на квалификацията и обmena на добри практики.

В ПИРО е предвидено Приоритет 19 да бъде реализиран чрез изпълнението на 2 мерки.

В Приоритет 19 оценката за напредъка е направена на база 4-те дефинирани дейности.

Фигура 23. Оценка на напредъка по Приоритет 19 Подобряване на квалификацията и обmena на добри практики.



Констатации: Приоритет 19 фигурира в общия стратегически документ и в Приложение 1. Програма за реализация на ПИРО на община Чепеларе за периода 2021-2027 г.

Напредък се отчита и по 2-те планирани мерки, както и за включените в тях дейности, които са в процес на изпълнение, насочени към повишаване квалификацията на административния персонал и ефективността на проектния мениджмънт, чрез обучение и обмен на добри практики; разширяване на вътрешните, международните партньорства и междуобщинското сътрудничество.

Оценка на Приоритет 19: Оценката на техническото изпълнение е **отлично – 100%**, с оглед на реализираните дейности през периода 2021 – 2024г.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 8 „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, АДАПТИРАНЕ КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И НАМАЛЯВАНЕ РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ“

Изпълнението на 8 „Опазване на околната среда, адаптиране към климатичните промени и намаляване риска от бедствия“ е предвидено да бъде постигната чрез 7 приоритета:

- ✓ Приоритет 20. Подобряване управлението на отпадъците
- ✓ Приоритет 21. Опазване и подобряване на околната среда и превенция на екологичните рискове
- ✓ Приоритет 22. Дейности по опазване на чистотата на въздуха
- ✓ Приоритет 23. Подобряване чистотата на водите
- ✓ Приоритет 24. Подобряване на биоразнообразието
- ✓ Приоритет 25. Превенция и управление на риска от наводнения, свлачища и изменение на климата
- ✓ Приоритет 26. Намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда

Оценка на напредъка по Приоритет 20. Подобряване управлението на отпадъците


В ПИРО е предвидено Приоритет 20 да бъде реализиран чрез изпълнението на 11 мерки. В Приоритет 20 оценката за напредъка е направена на база 4 проекта.

Констатации: Приоритет 20 фигурира в общия стратегически документ и в Приложение 1. Програма за реализация на ПИРО на община Чепеларе за периода 2021-2027 г. Само по 2 от мерките се отчита напредък:

Мярка 20.1. Премахване на последиците от индустриални и битови замърсявания и тяхното ограничаване в резултат на почистване на замърсени площи с отпадъци и включване на общината в публични инициативи за масово почистване на общината.

Мярка 20.3. Изграждане на система за разделно събиране на отпадъците и повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали. Към настоящият момент на територията на община Чепеларе не функционира система за разделно събиране на отпадъци от бита – хартия и картон, пластмаса, метал и стъкло. На територията на общината няма разположени съдове за разделно събиране на „зелени“ и биоразградими отпадъци. Те се предават посредством контейнерите за смесен битов отпадък и се извозват до „Регионално депо за битови отпадъци – Смолян“. Общината предоставя единствено кошчета за сгурия, които се използват основно през зимните месеци.

Фигура 24. Оценка на напредъка по Приоритет 20. Подобряване управлението на отпадъците

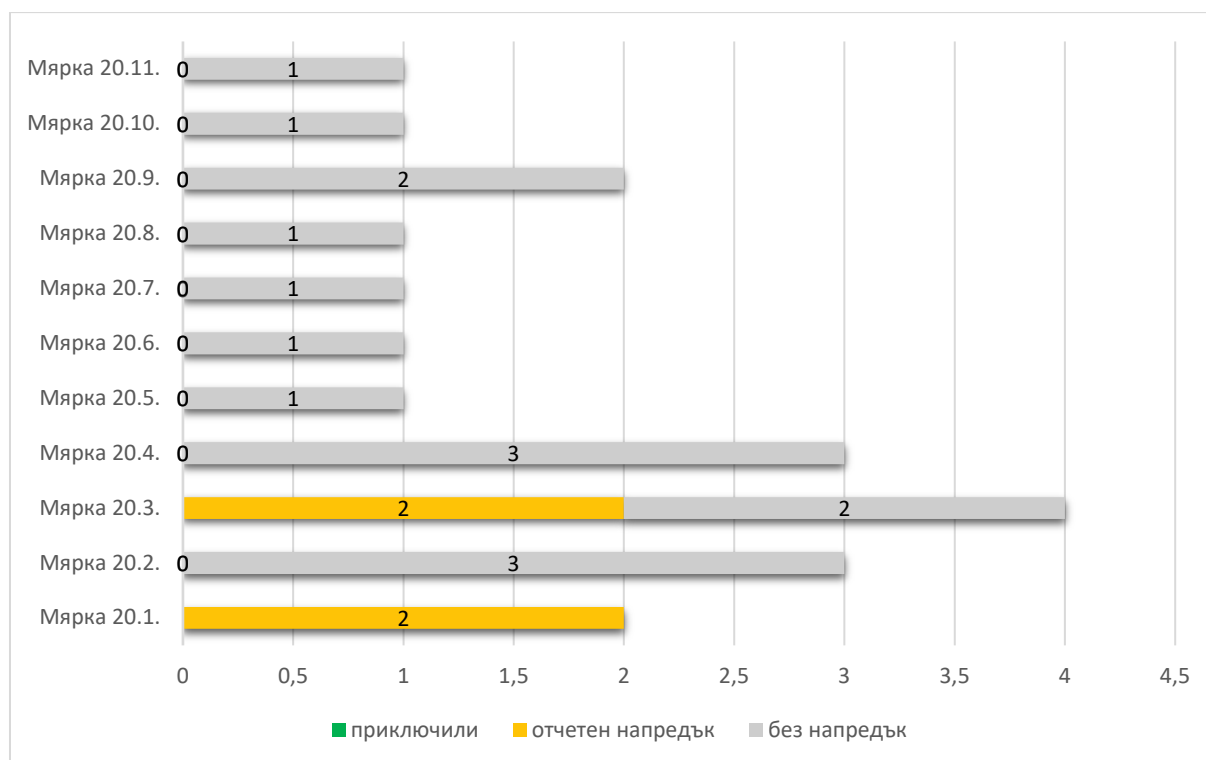

Оценка на Приоритет 20: Оценката на техническото изпълнение е незадоволително – 20%

Препоръка: Политиката за управление на отпадъците следва да се изпълнява в съответствие с Програмата за управление на отпадъците на община Чепеларе (период на действие 2022 – 2028 г.)⁶² В ПИРО следва да се включат проекти, за които приоритетно ще бъде търсено финансиране от фондовете на ЕС, държавен и общински бюджет и други алтернативни източници.

При актуализация на ПИРО да се отрази следното:

Мярка 20.2. Обновяване и модернизиране на оборудването за сметосъбиране и сметоизвозване в общината – **да отпадне**. В мярката са включени дейности, насочени към инфраструктурата за управление на отпадъци. Сметосъбирането в община Чепеларе е възложено на външна фирма „Глобъл Клинър“ ООД. Техниката, контейнерите и кофите за битови отпадъци са предоставени от фирмата изпълнител, като при възникнала необходимост тя ги подменя или доставя нови. Ако предстои промяна в модела на управление на отпадъците, то предвидените дейности следва да се актуализират.

⁶² Бележка: Публично достъпен е само „Работен вариант!“

Мярка 20.3. Дейност 20.3.4. Създаване на организация за разделно събиране на твърдите битови отпадъци - **да отпадне** поради смислово дублиране с Дейност 20.3.1.

Мярка 20.4. Изграждане на площадки и съоръжения намаляващи замърсяванията – **да се предприемат действия** по изпълнението на: Дейност 20.4.1. Изграждане на Площадка за временно съхранение на строителни отпадъци. В община Чепеларе няма определена отделна площадка за депониране на строителните отпадъци, където строителните фирми и граждани да извозват отпадналите от ремонтни дейности материали. На територията на общината не функционира и не е отредено депо за строителни отпадъци. Строителните отпадъци, когато съответната фракция и произход на отпадъка го позволяват - се използват частично за запръстяване и насипване. Понастоящем не е застъпена практиката за повторна употреба и рециклиране на отпадъци от строителство и разрушаване. Общината има сключен договор с „АРТСТРОЙ“ ООД от 2023г. за третиране на строителни отпадъци

Дейност 20.4.2. Изграждане на съоръжение за компостиране и предварително третиране на отпадъци. Община Чепеларе не разполага със собствена инсталация за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци. Всички събрани, от територията на общината, биоразградими отпадъци се транспортират на Регионално депо за неопасни отпадъци – Смолян, където се обработват в инсталацията за компостиране. На територията на община Чепеларе няма въведено фамилно компостиране като мярка за намаляване изхвърлянето на биоразградими и биологични отпадъци от домакинствата.

Дейност 20.4.3. Изграждане на пунктове за вторични суровини - **да отпадне** или да се конкретизира обхвата и конкретно инвестиционно намерение.

Мярка 20.5. Проучване на възможностите и развитие на инфраструктура, свързана с управлението на битовите отпадъци за постигане на целите за 2030г. за рециклиране на отпадъците и намаляване на количествата на депонираните отпадъци - **да отпадне**.

Мярка 20.6. Разработване на стандарти за разделно събиране и рециклиране на отпадъците в общината, съобразено с възможностите и степента на инфраструктурна обезпеченост, подготовка за изграждане на система за разделно събиране на отпадъци – в мярката няма посочени конкретни дейности - **да отпадне**, с оглед преминаване към нова основа за определяне на такса битови отпадъци през 2026г. и влизане в сила на новите разпоредби на Закона за местните данъци и такси.

Мярка 20.7. Предотвратяване генерирането и насърчаване на рециклиране на отпадъците – в мярката няма посочени конкретни дейности - **да отпадне**.

Мярка 20.8. Информираност и обучение на гражданите (в това число и в училищата), стопанските субекти и на отговорните административни структури в областта на

управление на отпадъците и кръговата икономика – в мярката няма посочени конкретни дейности - **да отпадне.**

Мярка 20.9. Мониторинг и запечатване на нерегламентирани депа за отпадъци – да се предприемат действия за изпълнението на предвидените дейности: Дейност 20.9.1. Рекултивация на общинско депо „Ракида“ и Дейност 20.9.2. Мониторинг и запечатване на нерегламентирани депа за отпадъци.

Мярка 20.10. Подобряване на базата от знания относно кръговата икономика, мониторинга на отпадъците и потоците от материали – в мярката няма посочени конкретни дейности - **да отпадне.**

Мярка 20.11. Проучване на възможностите за финансиране и насърчаване на публични – частните партньорства – в мярката няма посочени конкретни дейности - **да отпадне.**

Оценка на напредъка по Приоритет 21. Опазване и подобряване на околната среда и превенция на екологичните рискове

В ПИРО е предвидено Приоритет 21 да бъде реализиран чрез изпълнението на 2 мерки:

Мярка 21.1. Превенция на екологичните рискове

Мярка 21.2. Подобряване управлението на водите и управлението на почвите.

Констатации: Приоритет 21 фигурира в общия стратегически документ и в Приложение 1. Програма за реализация на ПИРО на община Чепеларе за периода 2021-2027 г.

За Мярка 21.1. Превенция на екологичните рискове са изведени 2 дейности: Дейност 21.1.1. Превенция на екологичните рискове на стойност 100 000 лв. и Дейност 21.1.2. Провеждане на мерки за адаптация към климатичните промени на стойност 50 000 лв. В краткото описание на дейността не са посочени обекти или обхват на конкретната проектна идея или дейност.

Мярка 21.2. Подобряване управлението на водите и управлението на почвите на стойност 1 000 000 лв. В обхвата на мярката не са изведени конкретни дейности и кратко описание, а текста между тях е идентичен.

Оценка на Приоритет 21: Не е отчетен напредък

Препоръка: При актуализация на ПИРО **Приоритет 21. Опазване и подобряване на околната среда и превенция на екологичните рискове да отпадне.**

В ПИРО е налице Приоритет 6 Борба с пожарите, наводненията, неблагоприятните климатични промени и вредителите, в чиито обхват са включени описани идентични дейности.

Оценка на напредъка по Приоритет 22. Дейности по опазване на чистотата на въздуха

В ПИРО е предвидено Приоритет 22 да бъде реализиран чрез изпълнението на 7 мерки:

Мярка 22.1. Контрол на изисквания за опазване чистотата на околната среда към операторите извършващи строителни дейности

Мярка 22.2. Провеждане на периодичен мониторинг и контрол на състоянието на атмосферния въздух

Мярка 22.3. Намаляване на замърсяването на въздуха от битовото отопление и проучване възможностите за поетапна замяна на отоплителните уреди на твърдо гориво

Мярка 22.4. Намаляване на замърсяването на въздуха от транспорта

Мярка 22.5. Зелени мерки в градска среда, вкл. изграждане на „зелени пояси/зони“

Мярка 22.6. Разработване и актуализация на документи във връзка с качеството на атмосферния въздух

Мярка 22.7. Информационна кампания и обучения за широката общественост и за администрацията за европейските изисквания и национални изисквания за чистота на атмосферния въздух

Констатации: Приоритет 22 фигурира в общия стратегически документ и в Приложение 1. Програма за реализация на ПИРО на община Чепеларе за периода 2021-2027 г., като не са изведени конкретни дейности и кратко описание, а текста между тях е идентичен. Не е посочен индикативен финансов ресурс.

Оценка на Приоритет 22: Мерките не могат да бъдат оценени.

Препоръка: При актуализация на ПИРО **Приоритет 22. Дейности по опазване на чистотата на въздуха да отпадне.**

Изведените мерки в ПИРО не са релевантни на ситуацията в община Чепеларе. В аналитичната част на ПИРО многократно е подчертана чистотата на въздуха в резултат на наличието на иглолистните дървета, които увеличават йонизацията на въздуха. Високата фитонцидната наситеност е вид природен антибиотик, когато цъфтят боровите /когато боровите правят любов/ техните връхчета са особено богати на този феномен. Експерти отчитат, че района има лечебно съчетание на

ниска влага, много слънчеви дни и висока йонизация на въздуха. Не случайно курортната зона е насочена към климато-лечебен туризъм.

Някой от предвидените дейности смислово дублират мерки/дейности в други приоритети на ПИРО, напр. Мярка 9.2 Реконструкция и изграждане на паркове и градини включва в обхвата си Зелени мерки в градска среда, вкл. изграждане на „зелени пояси/зони“ и т.н.

Оценка на напредъка по Приоритет 23. Подобряване чистотата на водите

В ПИРО е предвидено Приоритет 23 да бъде реализиран чрез изпълнението на 3 мерки:

Мярка 23.1. Изграждане и реконструкция на ВиК инфраструктура

Мярка 23.2. Опазване качеството на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, вкл. установяване на зони за опазването им в района на съоръженията за водовземане

Мярка 23.3. Стриктен мониторинг на микробиологичните показатели на питейната вода и дейности по намаляване на загубите по водопроводната мрежа

Констатации: Приоритет 23 фигурира в общия стратегически документ и в Приложение 1. Програма за реализация на ПИРО на община Чепеларе за периода 2021-2027 г., като не са изведени конкретни дейности и кратко описание, а текста между тях е идентичен. Не е посочен индикативен финансов ресурс.

Оценка на Приоритет 23: Мерките не могат да бъдат оценени.

Препоръка: При актуализация на ПИРО **Приоритет 23. Подобряване чистотата на водите да отпадне.**

В ПИРО е налице Приоритет 12 Обновяване на водоснабдителната инфраструктура и услуги с идентични мерки и дейности.

Оценка на напредъка по Приоритет 24. Подобряване на биоразнообразието

В ПИРО е предвидено Приоритет 24 да бъде реализиран чрез изпълнението на 5 мерки:

Мярка 24.1. Опазване и възстановяване на видове, хабитати, екосистеми и ландшафти. Опазване на генетичното разнообразие и биологичната сигурност.

Мярка 24.2. Подобряване на информираността и повишаване активността на местната общественост за опазване на биологичното разнообразие.

Мярка 24.3. Развитие на мрежата Натура 2000 и подобряване на природозащитното състояние на природните местообитания и видове

Мярка 24.4. Опазване и възстановяване на екосистемите и присъщото им биологично разнообразие и осигуряване свързаността на мрежата Натура 2000

Мярка 24.5. Подобряване капацитета, включително чрез обучения, на звената, отговорни за управлението на и за прилагането на политиките по биологично разнообразие и по управление на Натура 2000

Констатации: Приоритет 24 фигурира в общия стратегически документ и в Приложение 1. Програма за реализация на ПИРО на община Чепеларе за периода 2021-2027 г., като не са изведени конкретни дейности и кратко описание, а текста между тях е идентичен. Не е посочен индикативен финансов ресурс.

Оценка на Приоритет 24: Мерките не могат да бъдат оценени.

Препоръка: При актуализация на ПИРО **Приоритет 24. Подобряване на биоразнообразието да отпадне.**

В ПИРО е налице Приоритет 5 Изграждане на устойчиво и конкурентно горско стопанство в чиито обхват са включени Мярка 5.2 Устойчиво управление на горите и горския фонд, Дейност 5.2.2. Интегриране на мерки в областта на биоразнообразието в планове за управление на горите.

С цел оптимизиране структурата на стратегическата част на документа е препоръчително, в обхвата на Приоритет 5 да се допълнят дейности, кореспондиращи със съдържанието на описаните по-горе мерки.

Оценка на напредъка по Приоритет 25. Превенция и управление на риска от наводнения, свлачища и изменение на климата

В ПИРО е предвидено Приоритет 25 да бъде реализиран чрез изпълнението на 6 мерки:

Мярка 25.1. Превенция, управление и анализ на риска от наводнения и засушаване, свлачища, срутища, ерозии, абразии, горски пожари и др.

Мярка 25.2. Управление на риска от природни бедствия и за превенция на риска за живота и здравето на населението

Мярка 25.3. Проучвания и анализи, насочени към обследване на последиците от изменението на климата и отражението им върху водните ресурси на община Чепеларе

Мярка 25.4. Насърчаване на обучението в системата на предучилищното и училищното образование за риска от бедствия, включващо превенция, готовност, реагиране и възстановяване

Мярка 25.5. Изготвяне, преразглеждане и актуализиране на планове за защита при бедствия, както и разработване и актуализиране на съответните програми за намаляване на риска от бедствия

Мярка 25.6. Стимулиране на застраховането срещу рискове от бедствия и аварии и такива, породени от изменението в климата

Констатации: Приоритет 25 фигурира в общия стратегически документ и в Приложение 1. Програма за реализация на ПИРО на община Чепеларе за периода 2021-2027 г., като не са изведени конкретни дейности и кратко описание, а текста между тях е идентичен. Не е посочен индикативен финансов ресурс.

Изключение е Мярка 25.1. Превенция, управление и анализ на риска от наводнения и засушаване, свлачища, срутища, ерозии, абразии, горски пожари и др., за която са дефинирани 2 дейности:

Дейност 25.1.1. Преодоляване на последиците от вредното влияние на водите и от активизиран свлачищен процес - укрепване на улица „Прогрес“ в с. Павелско на стойност 93 537,01 лв.

Дейност 25.1.2. Превенция, управление и анализ на риска от наводнения и засушаване, свлачища, срутища, ерозии, абразии, горски пожари и др. – без стойност.

Оценка на Приоритет 25: Мерките не могат да бъдат оценени.

Препоръка: При актуализация на ПИРО **Приоритет 25. Превенция и управление на риска от наводнения, свлачища и изменение на климата да отпадне.**

В ПИРО е налице Приоритет 6 Борба с пожарите, наводненията, неблагоприятните климатични промени и вредителите, в чиито обхват са включени описани идентични дейности.

Дейност 25.1.1. Преодоляване на последиците от вредното влияние на водите и от активизиран свлачищен процес - укрепване на улица „Прогрес“ в с. Павелско на стойност 93 537,01 лв. да бъде отнесена към Мярка 6.2 Борба с ерозията, наводненията, неблагоприятните климатични изменения и вредителите.

Оценка на напредъка по Приоритет 26. Намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда

В ПИРО е предвидено Приоритет 26 да бъде реализиран чрез изпълнението на 2 мерки:

Мярка 26.1. Изготвяне на анализ на изискванията на Директива (ЕС) 2019/904 относно забрани за използване на определени пластмасови продукти и ефектът върху местната икономика, подготовка и проучване на добри практики за замяна на някои видове пластмасови продукти с алтернативни.

Мярка 26.2. Провеждане на информационни кампании за актуалните проблеми по предотвратяване изменението на климата за положителния ефект от рециклирането на пластмасовите изделия и кръговата икономика

Констатации: Приоритет 26 фигурира в общия стратегически документ и в Приложение 1. Програма за реализация на ПИРО на община Чепеларе за периода 2021-2027 г., като не са изведени конкретни дейности и кратко описание, а текста между тях е идентичен.

Не е посочен индикативен финансов ресурс.

Оценка на Приоритет 26: Мерките не могат да бъдат оценени.

Препоръка: При актуализация на ПИРО **Приоритет 26. Намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда да отпадне.**

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 9 „СПРАВЯНЕ С ПАНДЕМИЯТА COVID-19 И ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ НЕЯ“

Изпълнението на 9 „Справяне с пандемията covid-19 и последиците от нея“ е предвидено да бъде постигната чрез 4 приоритета:

- ✓ Приоритет 27. Подготовка на пакет от мерки за профилактика и готовност за реакция
- ✓ Приоритет 28. Информираност на обществеността за актуалната информация и епидемична обстановка
- ✓ Приоритет 29. Грижа, обучение и превенция на социални групи в риск, малцинствени групи
- ✓ Приоритет 30. Сътрудничество с други общини, трансгранично сътрудничество

Оценка на напредъка по Приоритет 27. Подготовка на пакет от мерки за профилактика и готовност за реакция

В ПИРО е предвидено Приоритет 27 да бъде реализиран чрез изпълнението на 5 мерки:

Мярка 27.1. Осигуряване на снабдяване с необходимими лекарствени и санитарни материали

Мярка 27.2. Организиране и набиране на доброволчески актив

Мярка 27.3. Дейности по превенция на разпространяване на вирусното заболяване

Мярка 27.4. Предприемане на детайлно проучване и информационна кампания, предоставяща актуална, проверена информация за гражданите за възможностите за ваксинация и организиране на дейностите по ваксинация за желаещите граждани

Мярка 27.5. Мерки за недопускане на недостиг от медицински грижи за други заболявания- сърдечно- съдови, мозъчно- съдови, хирургични, педиатрични и др.

Констатации: Приоритет 27 фигурира в общия стратегически документ, а в Приложение 1. Програма за реализация на ПИРО на община Чепеларе за периода 2021-2027 г. е вписан като Мярка, а като дейности са вписани съответните мерки. Не е посочен индикативен финансов ресурс.

Оценка на Приоритет 27: Мерките не могат да бъдат оценени.

Препоръка: При актуализация на ПИРО **Приоритет 27. Подготовка на пакет от мерки за профилактика и готовност за реакция да отпадне.**

Оценка на напредъка по Приоритет 28. Информираност на обществеността за актуалната информация и епидемична обстановка

В ПИРО е предвидено Приоритет 28 да бъде реализиран чрез изпълнението на 2 мерки:

Мярка 28.1. Поддържане на общинските комуникационни канали с най- актуална информация за нормативната уредба, заповеди и решения на компетентните органи

Мярка 28.2. Координация и субординация между общински, областен щаб, НОЩ, МЗ, РЗИ за предоставяне на адекватна и актуална информация на обществеността

Констатации: Приоритет 28 фигурира в общия стратегически документ, а в Приложение 1. Програма за реализация на ПИРО на община Чепеларе за периода 2021-2027 г. е вписан

като Мярка, а като дейности са вписани съответните мерки. Не е посочен индикативен финансов ресурс.

Оценка на Приоритет 28: Мерките не могат да бъдат оценени.

Препоръка: При актуализация на ПИРО **Приоритет 28.** Информираност на обществеността за актуалната информация и епидемична обстановка **да отпадне.**

Оценка на напредъка по Приоритет 29. Грижа, обучение и превенция на социални групи в риск, малцинствени групи

В ПИРО е предвидено Приоритет 29 да бъде реализиран чрез изпълнението на 1 мярка:

Мярка 29.1. Грижа и разяснителни кампании сред рискови и малцинствени групи

Констатации: Приоритет 29 фигурира в общия стратегически документ, а в Приложение 1. Програма за реализация на ПИРО на община Чепеларе за периода 2021-2027 г. е вписан като Мярка, но са посочени следните дейности:

Дейност 29.1.1. Грижа и разяснителни кампании сред рискови и малцинствени групи

Дейност 29.1.2. Активна комуникация и обмяна на опит и добри практики с други общини в страната и чужбина;

Дейност 29.1.3. Участие в разработване на стратегически документи за съвместно действие при бедствия, кризи епидемии

Дейност 29.1.4. Активно участие на общинската администрация в общински, областен оперативни щабове за справяне с епидемията

Дейност 29.1.5. Участие в национални фондове и програми за финансиране за предотвратяване на рисковете и преодоляване на по следствията- здравни, социални и икономически, от пандемията

Не е посочен индикативен финансов ресурс.

Оценка на Приоритет 29: Мерките не могат да бъдат оценени.

Препоръка: При актуализация на ПИРО **Приоритет 29.** Грижа, обучение и превенция на социални групи в риск, малцинствени групи **да отпадне.**

Оценка на напредъка по Приоритет 30. Сътрудничество с други общини, трансгранично сътрудничество

В ПИРО е предвидено Приоритет 30 да бъде реализиран чрез изпълнението на 4 мерки:

Мярка 30.1. Активна комуникация и размяна на опит и добри практики с други общини в страната и чужбина

Мярка 30.2. Участие в разработване на стратегически документи за съвместно действие при бедствия, кризи епидемии

Мярка 30.3. Активно участие на общинската администрация в общински, областен оперативни щабове за справяне с епидемията

Мярка 30.4. Участие в национални фондове и програми за финансиране за предотвратяване на рисковете и преодоляване на по следствията- здравни, социални и икономически, от пандемията

Констатации: Приоритет 30 фигурира само в общия стратегически документ, но не е включен в Приложение 1. Програма за реализация на ПИРО на община Чепеларе за периода 2021-2027 г.; не са изведени дейности/проектни идеи за нито една от мерките и не е посочен индикативен финансов ресурс.

Оценка на Приоритет 30: Мерките не могат да бъдат оценени.

Препоръка: При актуализация на ПИРО **Приоритет 30. Сътрудничество с други общини, трансгранично сътрудничество да отпадне.**

2.1.2. Оценка на финансовия напредък

В настоящата точка е представено финансовото изпълнение на ПИРО на Община Чепеларе, на база количествен анализ, при който единичните финансови параметри на остойностените проекти/ дейности са обобщени в общо финансово изпълнение. Получените стойности и тяхното съпоставяне с планирания финансов ресурс в Програмата за реализация на ПИРО (Приложение 1) позволява да се направи количествена оценка за степента на изпълнение на приоритетите - финансовото изпълнение се използва като индикатор за степента на постигане на приоритетите.

Разработването на ПИРО се базира на „интегрирания подход“ в стратегическото планиране. В резултат, отделните приоритети са с дефиниции и обхват, така че да допринасят заедно за постигането на стратегическите цели.

**Доклад за резултатите от междинна оценка за периода 2021 – 2024г.
на План за интегрирано развитие на община Чепеларе (2021 – 2027г.)**

Всеки приоритет има определен принос към изпълнение ПИРО и по този начин проследените резултати отразяват степента на постигане на планирания индикативен ресурс. Методиката на работа включва: разпределение на бюджета на даден проект според наличната информация за дяловете на различните финансови източници; сумиране на общите стойности за всички изпълнени проекти; разпределение на общата сума по приоритети и източници.

Таблица 2. Финансово изпълнение на ПИРО на Община Чепеларе за периода 2021-2024 г. (в хил. лв.)

Приоритет	Програма за реализация на ПИРО (Приложение 1)			
	индикативен бюджет 2021 – 2027 (в хил.лв.)	отчетено изпълнение 2021 – 2024 (в хил.лв.)	% на изпълнение	Договорен финансов ресурс след 2024 г. (в хил.лв.)
Приоритет 1. Повишаване конкурентоспособността на частния сектор и МСП в общината, като движеща сила на местната икономика.	2 500	1 860	74,38%	2 768
Приоритет 2. Развитие на международното сътрудничество и провеждане на активна инвестиционна политика.	1 000	0	0%	0
Приоритет 3. Изграждане на устойчиви партньорства на местно, регионално и трансгранично ниво.	1 630	1 435	88,04%	399
Приоритет 4. Развитие на устойчиви форми на туризъм и на туристически атракции	4 360	473	10,85%	232
Приоритет 5. Изграждане на устойчиво и конкурентно горско стопанство.	2 910	75	2,56%	0
Приоритет 6. Борба с пожарите, наводненията, неблагоприятните климатични промени и вредителите.	157	1 523	969,95%	209
Приоритет 7. Повишаване на конкурентоспособността на селскостопанската дейност и укрепване жизнеспособността на земеделските стопанства и фермите.	1 420	3 382	238,16%	2 353
Приоритет 8. Развитие на екологично земеделие и животновъдство	1 200	0	0%	0
Приоритет 9. Превръщане на град Чепеларе в разпознаваем център на спорта с налагането на бранд „Чепеларе-европейски град на спорта“, чрез развитие на атрактивни и устойчиви форми на спорт и тренировъчна дейност	12 000	3 195	26,63%	754

**Доклад за резултатите от междинна оценка за периода 2021 – 2024г.
на План за интегрирано развитие на община Чепеларе (2021 – 2027г.)**

Приоритет	Програма за реализация на ПИРО (Приложение 1)			
	индикативен бюджет 2021 – 2027 (в хил.лв.)	отчетено изпълнение 2021 – 2024 (в хил.лв.)	% на изпълнение	Договорен финансов ресурс след 2024 г. (в хил.лв.)
Приоритет 10. Обновяване на социалната и здравната инфраструктура и подобряване качеството на предоставяните от тях услуги	8 355	4 301	51,47%	537
Приоритет 11. Подобряване на свързаността и достъпността на пътната инфраструктура и уличната мрежа.	18 000	9 900	55,00%	4 983
Приоритет 12. Обновяване на водоснабдителната инфраструктура и услуги.	37 000	2 787	7,53%	8 548
Приоритет 13. Повишаване на енергийната ефективност, чрез изграждане на алтернативни енергийни източници и обновяване на енергийната инфраструктура	3 000	397	13,24%	2 046
Приоритет 14. Обновяване и осъвременяване на съобщителната мрежа и цифрова свързаност	400	0	0%	0
Приоритет 15. Изграждане и благоустрояване на специализираните инфраструктури.	700	363	51,82%	0
Приоритет 16. Инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия живот	9 000	500	5,56%	499
Приоритет 17. Културна инфраструктура и културно наследство	3 500	2	0,05%	0
Приоритет 18. Благоустрояване на обекти на общественото обслужване и подобряване достъпа до основните административни услуги.	1 100	193	17,54%	0
Приоритет 19. Подобряване на квалификацията и обмена на добри практики.	100	0	0%	0
Приоритет 20. Подобряване управлението на отпадъците	5 000	5 694	113,87%	0
Приоритет 21. Опазване и подобряване на околната среда и превенция на екологичните рискове	1 500	0	0%	0
Приоритет 22. Дейности по опазване на чистотата на въздуха	0	0	0%	0
Приоритет 23. Подобряване чистотата на водите	0	0	0%	0
Приоритет 24. Подобряване на биоразнообразието	0	0	0%	0
Приоритет 25. Превенция и управление на риска от наводнение, свлачища и изменение на климата	93,54	0	0%	0

**Доклад за резултатите от междинна оценка за периода 2021 – 2024г.
на План за интегрирано развитие на община Чепеларе (2021 – 2027г.)**

Приоритет	Програма за реализация на ПИРО (Приложение 1)			
	индикативен бюджет 2021 – 2027 (в хил.лв.)	отчетено изпълнение 2021 – 2024 (в хил.лв.)	% на изпълнение	Договорен финансов ресурс след 2024 г. (в хил.лв.)
Приоритет 26. Намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда	0	0	0%	0
Приоритет 27. Подготовка на пакет от мерки за профилактика и готовност за реакция	0	0	0%	0
Приоритет 28. Информираност на обществеността за актуалната информация и епидемична обстановка	0	0	0%	0
Приоритет 29. Грижа, обучение и превенция на социални групи в риск, малцинствени групи	0	0	0%	0
Приоритет 30. Сътрудничество с други общини, трансгранично сътрудничество	0	0	0%	0
ОБЩО	114 832	36 079	31,42%	23 327

За изпълнение на ПИРО на Община Чепеларе през периода 2021 – 2024 г. реално инвестираният финансов ресурс в публичния и частния сектор е **36 078 965,17 лв.**, което формира **31,42%** изпълнение от планирания индикативен бюджет. Анализът, който по същество е част от параметъра „ефикасност на използваните ресурси“ показва, че общите разходи за финансовото изпълнение на ПИРО на Община Чепеларе за периода 2021-2024 г. на етап междинна оценка е показателен за постигнато **добро финансово изпълнение**.


По-детайлен анализ на финансовото изпълнение на междинния етап от изпълнение на ПИРО на Община Чепеларе показва, че най – много инвестиции са направени за Приоритет 11. Подобряване на свързаността и достъпността на пътната инфраструктура и уличната мрежа.

С най-висока динамика на инвестиции за изпълнение на ПИРО е 2023г., когато все още се реализират проекти, финансирани от оперативните програми за периода 2014 – 2020 г. както от Община Чепеларе, така и от публичните организации и частния бизнес и стартиране на новите програми за периода 2021-2027г. Забавянето на отваряне на схеми за финансиране по одобрените от Европейската комисия програми за новия период 2021 – 2027 забави темповете за кандидатстване, продължителните процедури по оценка на проектни предложения, както за публичните институции, така и за частния бизнес, дават пряко отражение върху резултатите за 2024г. С договорения през 2024г. реално ще се ускори процесът за постигане целите на ПИРО на община Чепеларе.

**Доклад за резултатите от междинна оценка за периода 2021 – 2024г.
на План за интегрирано развитие на община Чепеларе (2021 – 2027г.)**

При анализа на Програмата за реализация на ПИРО ясно се вижда дисбаланса между приоритетите както по отношение натовареността с проекти, така и при планирания финансов ресурс.

Фигура 25. Разпределение на финансовото изпълнение по години (хил. лв.)

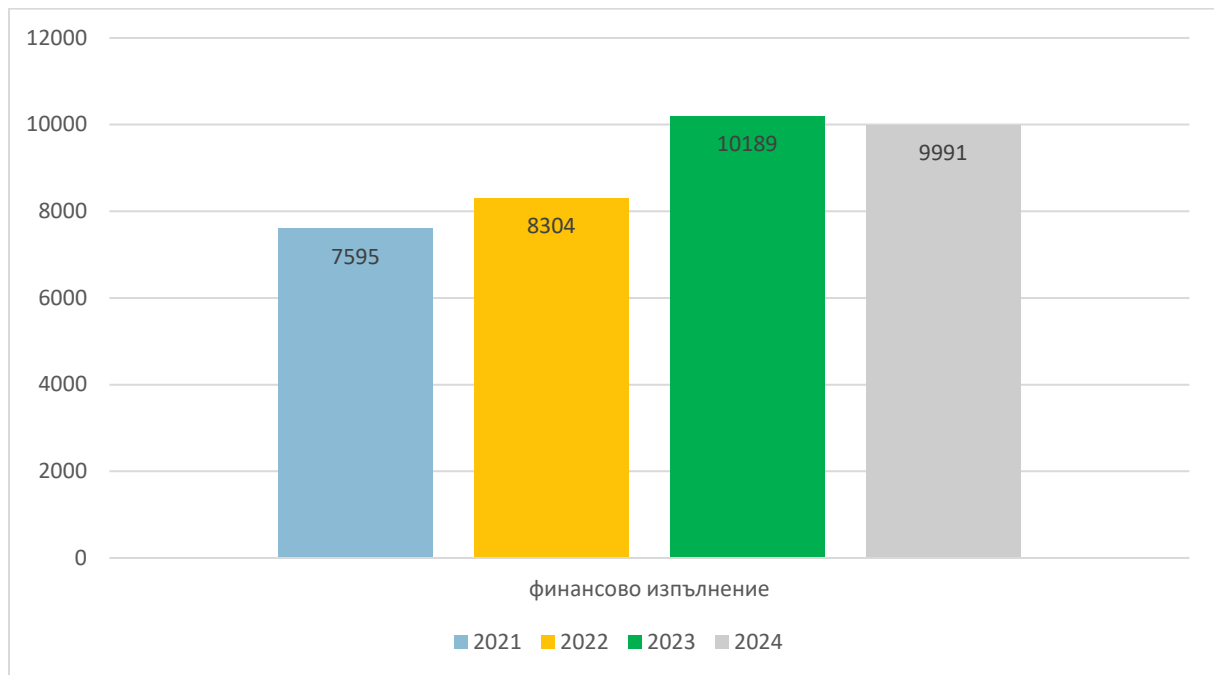

За обективно отчитане на напредъка по изпълнението е необходимо да се прибави и договореният финансов ресурс през 2024г. в резултат на подписани договори за безвъзмездна помощ на обща стойност 23 327 107,39 лв., резултат на разработени и класирани проектни предложения на конкурентен принцип както на Община Чепеларе, така и проекти на други публични организации и неправителствени организации и на частни бенефициенти.

Без финансов напредък са 14 приоритета (посочени в таблица 2, по-горе). Затова в следващите редове са разгледани само онези приоритети по които има реален финансов напредък:

Финансовото изпълнение на **Приоритет 1.** „Повишаване конкурентоспособността на частния сектор и МСП в общината, като движеща сила на местната икономика“ е много добро – 74,38%, като изпълнението е в размер на 1 859 592,37 лв. от общо планираните 2 500 000 лв. Основен принос имат реализираните проекти на частния бизнес за повишаване конкурентоспособността на местния бизнес. За изпълнението на проектите, заложиени в Приоритет 1 след 2024 г. е осигурен финансов ресурс в размер на 2 768 068,66 лв., като прогнозата е, че към периода на изготвяне на последващата оценка през 2028г. ще бъде постигнато преизпълнение на заложения индикативен ресурс.

Приоритет 3. „Изграждане на устойчиви партньорства на местно, регионално и трансгранично ниво“ постига **отлично изпълнение** - 88,04%, като вложените инвестиции са в размер на 1 435 041,52 лв. от общо планираните 1 630 000 лв. Съществен принос имат проектите на частни бенефициенти, насочени към развитие на услугите и неземеделските дейности; съвместната работа на Община Чепеларе и Дирекция „Бюро по труда“ – Смолян за активно включване в програмата за временна заетост и др. За изпълнението на проектите, заложи в Приоритет 3 след 2024 г. е осигурен финансов ресурс в размер на 398 777,62 лв., като прогнозата е, че към периода на изготвяне на последващата оценка през 2028г. ще бъде постигнато преизпълнение на заложения индикативен ресурс.

Приоритет 4. „Развитие на устойчиви форми на туризъм и на туристически атракции“ постига **незадоволително изпълнение** – 10,85%, като вложените инвестиции са в размер на 473 099,00 лв. от общо планираните 4 360 000 лв. Реален принос имат проектите за археологически разкопки за пещерно обиталище „Чая“, за популяризиране на местните културни традиции, обреди и обичаи на общинската администрация и др. За изпълнението на проектите, заложи в Приоритет 4 след 2024 г. е осигурен финансов ресурс в размер на 231 912,50 лв., като прогнозата е, че към периода на изготвяне на последващата оценка през 2028г. ще бъде постигнато изпълнение едва от 16,17% от планирания индикативен ресурс.

Приоритет 5. „Изграждане на устойчиво и конкурентно горско стопанство“ постига **незадоволително изпълнение** – 2,56%, като вложените инвестиции са в размер на 74 541,99лв. от общо планираните 2 910 000 лв. Принос има проекта на общинската администрация за презалесяване на гори, пострадали от пожари, абиотични и биотични фактори на територията на община Чепеларе. За изпълнението на проектите, заложи в Приоритет 5 след 2024 г. не осигурен финансов ресурс към периода на изготвяне на настоящата междинна оценка.

Приоритет 6. „Борба с пожарите, наводненията, неблагоприятните климатични промени и вредителите“ постига **изключително изпълнение**, като вложените инвестиции са в размер на 1 522 815,00 лв. от общо планираните 157 000 лв. Принос има проекта на общинската администрация за укрепване на срутища и изграждане/рехабилитация на подпорни стени на територията на общината. За изпълнението на проектите, заложи в Приоритет 6 след 2024 г. е осигурен финансов ресурс в размер на 208 878,00 лв.

Приоритет 7. „Повишаване на конкурентоспособността на селскостопанската дейност и укрепване жизнеспособността на земеделските стопанства и фермите“ постига **изключително изпълнение**, като вложените инвестиции са в размер на 3 381 844,13 лв. от общо планираните 1 420 000 лв. За това финансово изпълнение допринасят проекти на частните бенефициенти за инвестиции в земеделските стопанства, стартова помощ за развитието на малки стопанства и за млади земеделски стопани. За изпълнението на

проектите, заложи в Приоритет 7 след 2024 г. е осигурен финансов ресурс в размер на 2 352 782,63 лв.

Приоритет 9. „Превръщане на град Чепеларе в разпознаваем център на спорта с налагането на бранд „Чепеларе-европейски град на спорта“, чрез развитие на атрактивни и устойчиви форми на спорт и тренировъчна дейност“ постига **добро изпълнение – 26,63%**, като вложените инвестиции са в размер на 3 195 014,64 лв. от общо планираните 12 000 000 лв. За финансово изпълнение допринасят инвестициите в спортна инфраструктура – детската ски писта; трибуни към игрище за мини футбол в гр. Чепеларе; обновяване на спортни площадки, паркове и общи пространства, проведени спортни състезания и събития и др. За изпълнението на проектите, заложи в Приоритет 9 след 2024 г. е осигурен финансов ресурс в размер на 754 063,56 лв., като прогнозата е, че към периода на изготвяне на последващата оценка през 2028г. ще бъде постигнато изпълнение едва от 32,91% от планирания индикативен ресурс.

Приоритет 10. „Обновяване на социалната и здравната инфраструктура и подобряване качеството на предоставяните от тях услуги“ постига **много добро изпълнение – 51,47%**, като вложените инвестиции са в размер на 4 300 691,69 лв. от общо планираните 8 355 000 лв. За финансово изпълнение допринасят социалните проекти, които община Чепеларе изпълнява. За изпълнението на проектите, заложи в Приоритет 10 след 2024 г. е осигурен финансов ресурс в размер на 537 373,18 лв., като прогнозата е, че към периода на изготвяне на последващата оценка през 2028г. ще бъде постигнато изпълнение едва от 57,91% от планирания индикативен ресурс.

Приоритет 11. „Подобряване на свързаността и достъпността на пътната инфраструктура и уличната мрежа“ постига **много добро изпълнение – 55%**, като вложените инвестиции са в размер на 9 900 191,40 лв. от общо планираните 18 000 000 лв. За изпълнението на проектите, заложи в Приоритет 11 след 2024 г. е осигурен финансов ресурс в размер на 4 982 686,90 лв., като прогнозата е, че към периода на изготвяне на последващата оценка през 2028г. ще бъде постигнато изпълнение едва от 82,68% от планирания индикативен ресурс.

Приоритет 12. „Обновяване на водоснабдителната инфраструктура и услуги“ постига **незадоволително изпълнение – 7,53%**, като вложените инвестиции са в размер на 2 787 408,00 лв. от общо планираните 37 000 000 лв. За финансово изпълнение допринасят проектите на общинската администрация за доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа в с. Павелско, с. Богутево и др. За изпълнението на проектите, заложи в Приоритет 12 след 2024 г. е осигурен финансов ресурс в размер на 8 547 700,00 лв., като прогнозата е, че към периода на изготвяне на последващата оценка през 2028г. ще бъде постигнато изпълнение едва от 30,64% от планирания индикативен ресурс.

Приоритет 13. „Повишаване на енергийната ефективност, чрез изграждане на алтернативни енергийни източници и обновяване на енергийната инфраструктура“ постига

незадоволително изпълнение – 13,24%, като вложените инвестиции са в размер на 397 166 лв. от общо планираните 3 000 000 лв. За финансово изпълнение допринася проектът на общинската администрация за рехабилитация и модернизация на системите за външно изкуствено осветление в селата Павелско, Хвойна, Забърдо, Богутево, Зорница, Лилеково, Малево, Острица, Орехово, Проглед, Студенец и к.к. Пампорово, на територията на община Чепеларе. За изпълнението на проектите, заложиени в Приоритет 13 след 2024 г. е осигурен финансов ресурс в размер на 2 046 239,26 лв., като прогнозата е, че към периода на изготвяне на последващата оценка през 2028г. ще бъде постигнато изпълнение от 81,45% от планирания индикативен ресурс.

Приоритет 15. „Изграждане и благоустрояване на специализираните инфраструктури“ постига **много добро изпълнение – 51,82%**, като вложените инвестиции са в размер на 362 745 лв. от общо планираните 700 000 лв. За финансово изпълнение допринасят инвестициите на общинската администрация за подобряване състоянието на улиците към гробищните паркове в с. Забърдо и с. Проглед. За изпълнението на проектите, заложиени в Приоритет 15 след 2024 г. не осигурен финансов ресурс към момента на изготвяне на настоящата оценка.

Приоритет 16. „Инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия живот“ постига **незадоволително изпълнение – 5,56%**, като вложените инвестиции са в размер на 500 445,35 лв. от общо планираните 9 000 000 лв. За финансово изпълнение допринасят проекти за подобряване на пешеходния подход за достъп до образователни институции, обновяване на детски площадки в гр. Чепеларе и в малките населени места, модернизиране на материално – техническата база на училища и детски градини, реализиране на проекти на училищата както за създаване на STEM среда, така и по Националните програми на МОН и др. За изпълнението на проектите, заложиени в Приоритет 16 след 2024 г. е осигурен финансов ресурс в размер на 498 625,08 лв., като прогнозата е, че към периода на изготвяне на последващата оценка през 2028г. ще бъде постигнато изпълнение едва от 11,10% от планирания индикативен ресурс.

Приоритет 17. „Културна инфраструктура и културно наследство“ постига **незадоволително изпълнение – 0,05%**, като вложените инвестиции са в размер на 1 800,66 лв. формирани от проекти на читалищата за подобряване основно на библиотечния фонд, от общо планираните 3 500 000 лв. За изпълнението на проектите, заложиени в Приоритет 17 след 2024 г. не осигурен финансов ресурс към момента на изготвяне на настоящата оценка.

Приоритет 18. „Благоустрояване на обекти на общественото обслужване и подобряване достъпа до основните административни услуги“ постига **незадоволително изпълнение – 17,54%**, като вложените инвестиции са в размер на 192 945,70 лв. от общо планираните 1 100 000 лв. За изпълнението на проектите, заложиени в Приоритет 18 след 2024 г. не осигурен финансов ресурс към момента на изготвяне на настоящата оценка.

Приоритет 20. „Подобряване управлението на отпадъците“ постига **отлично изпълнение – 113,87%**, на база разходите, които Община Чепеларе прави ежегодно за управление на битовите отпадъци - вложените инвестиции са в размер на 5 693 622,72 лв. от общо планираните 5 000 000 лв. За изпълнението на проектите, заложи в Приоритет 20 след 2024 г. не осигурен финансов ресурс към момента на изготвяне на настоящата оценка, но е необходимо да се търси финансиране за изграждане на ключова инфраструктура за управление на отпадъците.

2.1.3. Оценка на Зоните за прилагане на интегриран подход

В ПИРО на Община Чепеларе за периода 2021 – 2027 г. са определени са 3 приоритетни зони, които имат най-голям потенциал да повлияят върху социално-икономическото развитие на общината.

Приоритетните зони, които е идентифицирала община Чепеларе са една териториална и няколко секторни както следва:

1. Урбанизирани селищни територии

Териториален обхват: гр. Чепеларе; с. Богутево; с. Хвойна; с. Орехово; с. Павелско; с. Проглед; с. Забърдо; с. Зорница; с. Дряновец; с. Лилеково; с. Малево; с. Острица и с. Студенец.

Дейностите в зоната са насочени към подобряване на жизнената и икономическата среда в община Чепеларе; привличане на инвеститори; развитие на конкурентоспособна икономика.

2. Секторни зони за прилагане на интегриран подход: развитие на туризма; повишаване на качеството на човешките ресурси; подобряване на образованието; намаляване на нивото на безработица в общината; предвид ситуацията с пандемичната обстановка и тежките последствия от COVID-19, общинската администрация определя секторна зона здравеопазване като приоритетна с фокус подсигуриране на повече здравни специалисти, които да полагат грижа за жителите на общината.

Така определените секторни зони обхващат: Образование; Здравеопазване; Социални услуги; Култура; Туризм; Развитие на човешките ресурси; Икономическо развитие; Селско стопанство и земеделие; Спорт; Енергийна ефективност; Опазване на околната среда; Стратегическо планиране; Гражданско общество и неправителствен сектор.

3. Зони за отдих и спорт извън урбанизираните селищни зони.

Териториален обхват: Ски център „Мечи чал“ – Чепеларе; к.к. Пампорово

Зоната е приоритетна поради огромния потенциал за привличане на туристопоток и въздействието върху нея ще рефлектира положително върху развитието на община Чепеларе.

Съгласно Методическите указания по дефиниция „зона за прилагане на интегриран подход“ (зона за въздействие) е „пространствено обособена територия с определена характеристика и състояние на физическата среда, социалната и/или етническа структура на населението и характер и структура на основните фондове“. Зоните са част от територията на общината с конкретно функционално предназначение или собствен потенциал за развитие.

При извършване на оценката се наблюдава реализирането на дейности/проекти и изразходването на финансов ресурс да се насочва към цялата територия на общината, което допринася за реалното развитие на полицентричната мрежа на населените места.

2.1.4. Оценка на Приложение 1А

Неразделна част от Програмата за реализация е Приложение №1А Индикативен списък на важни за общината проекти. Приложение 1А не е публикувано към ПИРО, а за целите на оценката е предоставено от общинската администрация. За целите на междинната оценка, информацията в приложението е реструктурирано в съответствие с Приложение №1 Програма за реализация, за по-коректно проследяване на напредъка.

Важните за общината проекти, включени в Приложение 1А са 32, като напредък се отчита по 14 проекта или 43,75% в резултат на инвестициите в уличната и водопроводната мрежи.

От направения преглед е констатирано, че при изготвяне на Приложение №1А **не са спазени** „Методическите указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027г.“ на МРРБ:

- ✓ Приложение №1А не изготвено по образец от Методическите указания, в който изрично са посочени колоните за попълване: Приоритет, Мярка, Проекти, Проектна готовност, Индикативен срок на изпълнение (месеци), Общ индикативен бюджет на проектната идея (в хил. лв.), Допълнителна информация. В Приложение №1А на Община Чепеларе не е спазена последователността на колоните и са допълнени други колони – проектиране, разрешение за строеж, изпълнител и т.н.
- ✓ Попълнената информация не съответства на Стратегическата част на ПИРО и на Приложение №1 Програма за реализация, като вместо приоритети са посочени мерки, вместо мерки – дейности и т.н., както и са вписани обекти, които липсват в Приложение №1 А, напр. „СМР местен път село Асенец“ и др.

- ✓ Има разминаване и между индикативните стойности в Приложение 1 и в Приложение 1А, а за някои дейности не е посочен бюджет.
- ✓ За част от проектите липсва информация за степента на проектна готовност, а проектите включени в Приложение № 1А следва да се реализират приоритетно, но за да бъдат включени в него е необходимо общината да има **известна степен на проектна готовност** и общината заедно с партньорите да е преценила, че съответният проект е от особена важност за развитието ѝ.

Препоръка: Препоръчително е да бъде извършена актуализация на Приложение №1А при стриктно спазване на „Методическите указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027г.“ на МРРБ.

2.2. Констатирани проблеми през периода 2021 – 2024г.

Водещите проблеми при прилагане на ПИРО на община Чепеларе са предимно от глобално, европейско и национално ниво и са извън компетенциите и възможностите за въздействие на местната власт. Макроикономическите фактори, включително високата инфлация, нестабилните цени на строителните материали и енергийните ресурси, затрудниха планирането и реализацията на някои от заложените проекти. Освен това, продължаващите промени в законодателството и сложните процедури за кандидатстване по различни програми на европейско и национално ниво създадоха допълнителни административни предизвикателства.

Като основен проблем се очертава липсата на достатъчно конкретни възможности за финансиране на проекти, поради сложните процедури за одобрение на концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) и забавеното разпределение на средствата по европейските и национални програми.

Трудностите, възпрепятстващи изпълнението на ПИРО, могат да бъдат систематизирани в следните основни направления:

- ✓ Липса на достатъчно свободни финансови ресурси – Възниква необходимост от търсене на допълнителни източници на финансиране за успешната реализация на проектите, включително чрез публично-частни партньорства и участие в международни програми.
- ✓ Проблеми, свързани със собствеността на обекти – Ограниченията при изпълнението на проекти върху терени с неуредена собственост продължават да представляват сериозна пречка.
- ✓ Затруднен процес на събиране на статистически данни – Няма централизирана система за събиране на актуална информация относно социално-икономическото

състояние на общината и инвестиционните намерения на бизнеса и неправителствения сектор.

- ✓ Регулаторни ограничения – Нови нормативни изисквания налагат изпълнението на допълнителни дейности от страна на общините, без да е осигурено необходимото финансово обезпечение.⁶³

От друга страна проблем за обективността на отчитане на напредъка е към претоварване на стратегическата рамка на ПИРО. Напр. в Интегрираната стратегия за териториално развитие (ИТСР) на Южен централен район са изведени 3 стратегически приоритета, а в ПИРО на Община Чепеларе – 30 приоритета. Наблюдава се смислово дублиране на приоритети/мерки/дейности; липса на дейности при изведени мерки; липса на стойности; повтаряне на дейности (напр. проекта за Градски парк – 2 пъти и т.н.); липса на съответствие между Стратегическата рамка в ПИРО и Приложение 1 и др.

Приоритетите следва да са насочени към осъществяване на визията и отразяване на конкретната специфика на община Чепеларе, като са съобразени с предназначението на ПИРО да бъде **инструмент за управление и да отразява действителните нужди** на местната общност в рамките на плановите документи от регионално, национално и европейско ниво. Те трябва да са формулирани ясно и кратко и да дават направленията на развитие.

Стратегическият документ има за задача **да фокусира управленските процеси и да даде рамката за използване на наличните ресурси** по такъв начин, че община Чепеларе да подобри икономическата си жизнеспособност, повиши качествено на живот на своите жители и осъществи ефективно междуобщинско сътрудничество.

⁶³ Годишен доклад ПИРО 2024 на Община Чепеларе

III. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ РЕСУРСИ

В настоящия раздел е извършена оценка на ефективността и ефикасността на използваните финансови инструменти, включително от ЕС и на усвоените ресурси за изпълнение на целите и приоритетите на ПИРО 2021 – 2027г. до етапа на извършване на Междинната оценка и е оценена организацията и координацията на компетентните органи и ефективността на работата на административната структура в процеса на разработване, изпълнение, наблюдение и оценка на ПИРО 2021 – 2027г., включително по отношение прилагането на принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност за изпълнението на ПИРО.

3.1. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните финансови ресурси

Експертната оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси при изпълнението на ПИРО на Община Чепеларе в междинния етап на плановия период се базира на аналитичния преглед и на обобщените резултати от изпълнените проекти и дейности в периода, обхванат от междинната оценка, финансирани със средства от бюджета на общината, държавния бюджет, фондове на ЕС и други източници. За извършването на оценката са използвани събраните данни по отношение на техническото и финансово изпълнение на проектите и дейностите в Програмата за реализация на ПИРО, Индикативната финансова таблица, както и определените индикатори за наблюдение и оценка на плана.

При извършването на междинната оценка на реализацията на ПИРО на Община Чепеларе важно значение има обратната връзка по постигнатите резултати, въздействието на предприетите интервенции върху територията и съответно тяхната релевантност и адекватност на текущата ситуация.

Настоящата оценка ще провери два аспекта:

- (1) доколко използваните ресурси са довели до очакваните резултати (цели, приоритети и завършени проекти от Програмата за реализация) – ефективност;
- (2) доколко начинът за изпълнение на ПИРО се основава на добро управление на ресурсите – ефикасност.

3.1.1. Оценка на ефективността

Ефективността на използваните ресурси показва отношението на постигнатия резултат спрямо поставената цел. В тази част от оценката не се отчитат разходите, а единствено постигнатите цели на базата на предварително идентифицираните резултати. Ефективността измерва степента, до която провежданите политики чрез програми, мерки, инициативи или проекти постига предварително поставените цели.

За целите на настоящата Междинна оценка за периода 2021-2024 г., ефективността на използваните ресурси при реализацията на ПИРО на Община Чепеларе се оценява в два аспекта. От една страна се прави съпоставяне на дела на реализираните проекти и дейности спрямо първоначално планираните и от друга страна се оценява степента на постигане на стойностите по заложените индикатори, отчитащи изпълнението на стратегическите цели и приоритети.

Системата от индикатори обединява два основни компонента – индикатори за резултат, проследяващи степента на изпълнение на целите, както и индикатори за продукт, измерващи ефектите от изпълнението на мерките в рамките на приоритетните области. Двата вида индикатори са въведени в следствие на предписанията от „Методическите указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027г.“.

След оценката за степента на техническо и финансово изпълнение на проектите, следва отчитане на актуалните стойности на индикаторите за измерване на целите и приоритетите от ПИРО. Сравнението между реалните и целевите стойности позволява втори подход за преценка на степента в реализацията на ПИРО. Разгледани са индикаторите с достоверен източник на информация към момента на изготвяне на оценката.

Приложение №3. Матрица на индикаторите не е публикувана към официалния документ, независимо, че в Раздел IX. Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка плана за интегрирано развитие на Община Чепеларе за периода 2021-2027 г. от ПИРО е посочено, че „Индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО на община Чепеларе за периода 2021-2027 г. са посочени в матрица на индикаторите - Приложение № 3.“(стр.240 от публикувания ПИРО).

В Годишните доклади за 2021г., 2022г., 2023г. и 2024г. за изпълнението на ПИРО не са отчитани индикаторите, съобразно Приложение №3. Описанието на напредъка по мерки/ дейности е представяно в колона „индикатори“.

При извършване на оценката на Приложение №3, предоставено ни от общинската администрация, е установено, че изведените индикатори са редуцирани и не обхващат всички планирани стратегически цели и приоритети, напр. По стратегическа цел 9.

**Доклад за резултатите от междинна оценка за периода 2021 – 2024г.
на План за интегрирано развитие на община Чепеларе (2021 – 2027г.)**

Справяне с пандемията Covid-19 и последиците от нея няма изведени индикатори за продукт.

Идентифицираните проблеми на матрицата на индикаторите – Приложение №3 са следните:

- ✓ И при двата вида индикатори: за продукт и за резултат липсват стойности, които следва да бъдат постигнати, което води **до невъзможност за отчитане на напредъка** от изпълнението на ПИРО;
- ✓ Наблюдава се смесица от индикатори, както и посочване на индикатори за продукт, които по същество са индикатори за резултат;
- ✓ Противоречие между мярка и индикатор, вкл. често използваните „планове“, „проверки“, нормативни документи и др.
- ✓ Планираните индикатори **не са съобразени** с „Методическите указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.“ на МРРБ и с Приложение За – Списък на общите индикатори в областта на регионалната политика и за постигане на растеж и заетост чрез ЕСИФ за периода 2021-2027 г. (Съгласно проекта на Регламент за ЕФРР за периода 2021-2027).

Приложените таблици с индикатори по-долу са единствено с цел да се онагледят липсата за възможност за оценка.

Таблица 3. Индикатори за резултат

Цел/Индикатори за резултат	Мерна единица	Източник на информация	Период на отчитане	Базова стойност	Целева стойност	Отчетна междинна стойност 2024
Стратегическа цел 1. Развитие и модернизация за постигане на интелигентен икономически растеж на град Чепеларе						
Брой проекти за развитие и модернизация; Размер на вложените инвестиции;	Брой, лева, %	Община, Информация на ниво проект, ИСУН	годишно			
Стратегическа цел 2. Интегрирано развитие на приоритетните отрасли на територията на общината						
Обработваема земя от общата земеделска площ; Размер на инвестициите в горскостопанския сектор; Леглова база; Изготвени инвестиционни проекти; Реконструкция и рехабилитация на общинската пътна мрежа;	Брой, кв. метри, лева, %, декари	Община, Информация на ниво проект, НСИ	годишно			
Стратегическа цел 3. Подобряване на достъпа до качествени здравни, социални, културни услуги и спорт						

**Доклад за резултатите от междинна оценка за периода 2021 – 2024г.
на План за интегрирано развитие на община Чепеларе (2021 – 2027г.)**

Цел/Индикатори за резултат	Мерна единица	Източник на информация	Период на отчитане	Базова стойност	Целева стойност	Отчетна междинна стойност 2024
Брой ново изградени обекти, ремонти, оборудване, ДМА; Брой съоръжения за достъпна среда; Разкрити алтернативни социални услуги;	Брой, лева, %, декари	Община, Информация на ниво проект, ИСУН	годишно			
Стратегическа цел 4. Подобряване и развитие на общинска инфраструктурата, повишаване на енергийната ефективност в публичния и частния сектор						
Икономии от внедрени общински мерки за енергийна ефективност	Брой, кв. метри, лева, %	Община, Информация на ниво проект, ИСУН	годишно			
Стратегическа цел 5. Повишаване на жизнения стандарт чрез конкурентоспособно образование и обучение, култура и културно-историческо наследство						
Ученици в училищата, деца в детските градини, заетост на населението; Намаляване нивото на безработицата; Брой посещения на обектите на културното и историческото наследство и природните обекти;	Брой, кв. метри, лева, %, км	Община, Информация на ниво, проект, ИСУН, АЗ	годишно			
Стратегическа цел 6. Умно управление на общинската администрация, продължаваща модернизация на административните процеси						
Съкратени срокове на административно обслужване, услуги он-лайн	Брой, лева, %	Община, Информация на ниво проект, ИСУН	годишно			
Стратегическа цел 7. Опазване на околната среда, адаптиране към климатичните промени и намаляване риска от бедствия						
Икономии от внедрени общински мерки за енергийна ефективност; Разделно събиране; Мероприятия за превенция;	(mW), брой, лева	Община, Информация на ниво проект, ИСУН	годишно			

Таблица 4. Индикатори за продукт

Приоритет, мярка/ Индикатор за продукт	Мерна единица	Източник на информация	Период на отчитане	Целева стойност	Отчетна междинна стойност 2024	Степен на изпълнение
Приоритет 1. Повишаване конкурентоспособността на частния сектор и МСП в общината, като движеща сила на местната икономика.						
Мярка 1.1 Подобряване на достъпа и изграждане на местна инфраструктура, подпомагаща бизнеса.						
Брой регистрирани нови микро и малки предприятия; Брой МСП; Брой обучения; Брой проучвания;	Брой, лева, %	Община, ИСУН	годишно			

**Доклад за резултатите от междинна оценка за периода 2021 – 2024г.
на План за интегрирано развитие на община Чепеларе (2021 – 2027г.)**

Приоритет, мярка/ Индикатор за продукт	Мерна единица	Източник на информация	Период на отчитане	Целева стойност	Отчетна междинна стойност 2024	Степен на изпълнение
Мярка 1.2 Стимулиране конкурентоспособността на малкия и средния бизнес, чрез технологично обновяване и иновации.						
Брой проекти за технологична модернизация на предприятията	брой, %, лева	Общината Информация ниво проект, ИСУН	годишно			
Мярка 1.3 Активен маркетинг и реклама на местните производства						
Брой кампании; Регистриран собствен бранд;	брой, лева	Общината	годишно			
Приоритет 2. Развитие на международното сътрудничество и провеждане на активна инвестиционна политика.						
Мярка 2.1 Разработка и изпълнение на местна инвестиционна политика.						
Разработена политика; Проведена рекламна кампания;	брой, лева	Общината Информация ниво проект; ИСУН	годишно			
Мярка 2.2 Включване в програми и проекти за трансгранично, европейско и международно сътрудничество.						
Брой съвместни проекти на Община Чепеларе с международно участие; Брой местни фирми включени в международни мрежи за обмен; Брой проучвания;	брой, лева	Общината	годишно			
Приоритет 3. Изграждане на устойчиви партньорства на местно, регионално и трансгранично ниво.						
Мярка 3.1 Изграждане на устойчиви партньорства с икономически, социални и образователни партньорски организации.						
Брой инициативи за развитие, сътрудничеството и партньорство; Участие и сътрудничество с регионалните и международни сдружения;	брой	Общината	годишно			
Мярка 3.2 Изграждане на междуобщински партньорства за реализация на регионални, национални и трансгранични инициативи.						
Брой проекти; Брой маршрути; Реализирани инициативи с побратимени градове;	брой	Общината	годишно			
Мярка 3.3 Увеличаване приноса на Местната Инициативна Група (МИГ) за развитие на местното предприемачество, обществените инфраструктури и услугите.						
Брой обсъждания, предложения	брой	Общината	годишно			
Мярка 3.4 Насърчаване на заетостта и подкрепа за мобилността на работната сила.						
Брой проекти; Брой програми за заетост;	брой	Общината	годишно			

**Доклад за резултатите от междинна оценка за периода 2021 – 2024г.
на План за интегрирано развитие на община Чепеларе (2021 – 2027г.)**

Приоритет, мярка/ Индикатор за продукт	Мерна единица	Източник на информация	Период на отчитане	Целева стойност	Отчетна междинна стойност 2024	Степен на изпълнение
Мярка 3.5 Подобряване качеството на човешките ресурси, чрез повишаване на образованието и квалификацията.						
Брой съвместни проекти с образователни институции, професионални организации	брой	Общината	годишно			
Приоритет 4. Развитие на устойчиви форми на туризъм и на туристически атракции						
Мярка 4.1. Изграждане и обновяване на туристическата инфраструктура.						
Брой изградени и ремонтирани ДМА; Изградени зони за отдих; Леглова база	Брой, лева, %, декари	Община, Информация на ниво проект, ИСУН	годишно			
Мярка 4.2. Проучване на възможностите и подпомагане и стимулиране за развитие на различни видове туризъм, в това число еко, спортен и ловен туризъм с максимално усвояване на благоприятните способстващи фактори на средата						
Брой проучвания и оценка за нови възможности на условията за развитие	брой, лева	Общината	годишно			
Мярка 4.3. Подобряване на информираността, маркетинга и рекламата на местните туристически продукти						
Брой кампании;	брой, лева	Общината	годишно			
Мярка 4.4. Активно участие в разработване на областна стратегия с цел по-пълно и всеобхватно реализиране планирания ресурс.						
Работна група	брой	Общината	годишно			
Мярка 4.5. Налагане на общ съвместен туристически бранд с общините в областта, съпроводен с комплексна маркетингова стратегия.						
Приета маркетингова стратегия	брой	Общината	годишно			
Мярка 4.6. Популяризиране на събития и мероприятия с местно значение, които допринасят за развитието на туризма						
Брой мероприятия на общината	брой	Общината	годишно			
Приоритет 5. Изграждане на устойчиво и конкурентно горско стопанство.						
Мярка 5.1 Създаване на условия за развитие на съвременно, балансирано и природосъобразно горско стопанство.						
Брой изградени нови горски пътища; Направени плащания по екологични мерки; Залесени горски площи;	брой, лева, километри, декари	Община, Информация на ниво проект,	годишно			
Мярка 5.2 Устойчиво управление на горите и горския фонд.						
Брой мероприятия за прозрачност и публичност при планиране на лесоустройството	брой	Общината	годишно			

**Доклад за резултатите от междинна оценка за периода 2021 – 2024г.
на План за интегрирано развитие на община Чепеларе (2021 – 2027г.)**

Приоритет, мярка/ Индикатор за продукт	Мерна единица	Източник на информация	Период на отчитане	Целева стойност	Отчетна междинна стойност 2024	Степен на изпълнение
Приоритет 6. Борба с пожарите, наводненията, неблагоприятните климатични промени и вредителите.						
Мярка 6.1 Изграждане на система за наблюдение, превенция и борба с пожарите.						
Изградена система за наблюдение; Брой изградени и проведени противопожарни мероприятия;	брой, лева, километри, декари	Общината	годишно			
Мярка 6.2 Борба с ерозията, наводненията, неблагоприятните климатични изменения и вредителите						
Приложен лесоустройствен план	брой	Общината				
Приоритет 7. Повишаване на конкурентоспособността на селскостопанската дейност и укрепване жизнеспособността на земеделските стопанства и фермите.						
Мярка 7.1 Изграждане на съвременно, иновативно селско стопанство						
Брой програми за подпомагане отделните сектори; Програми за помощ от страна на администрацията; Брой мерки намаляване замърсяването;	брой, лева	Общината	годишно			
Мярка 7.2. Обмяна на ноу-хау със съседни общини и с трансгранични партньори за приложими иновативни технологии и практики в земеделието						
Брой участия	брой, лева	Общината	годишно			
Приоритет 8. Развитие на екологично земеделие и животновъдство						
Мярка 8.1 Стимулиране развитието на биодинамичното земеделие и животновъдство.						
Наредба за стимулиране био производствата; Мерки за намаляване замърсяванията от преработващата и хранително-вкусовата промишленост	брой, лева	Общината	годишно			
Приоритет 9. Превръщане на град Чепеларе в разпознаваем център на спорта с налагането на бранд „Чепеларе-европейски град на спорта“, чрез развитие на атрактивни и устойчиви форми на спорт и тренировъчна дейност						
Мярка 9.1 Изграждане и обновяване на спортната инфраструктура и услуги на територията на общината.						
Брой ново изградени, ремонтирани, реконструирани спортни съоръжения, ДМА; Активно спортуващи лица	брой, лева	Общината	годишно			

**Доклад за резултатите от междинна оценка за периода 2021 – 2024г.
на План за интегрирано развитие на община Чепеларе (2021 – 2027г.)**

Приоритет, мярка/ Индикатор за продукт	Мерна единица	Източник на информация	Период на отчитане	Целева стойност	Отчетна междинна стойност 2024	Степен на изпълнение
Мярка 9.2 Реконструкция и изграждане на паркове и градини.						
Брой ново изградени, ремонтирани, реконструирани паркове, между блокови пространства, multifunctional площадки;	брой, лева	Общината	годишно			
Мярка 9.3. Дейности по разработване и популяризиране на този бранд и превръщането му на разпознаваем и привлекателен слоган за общината						
Брой домакинства и организирани спортни събития, състезания по видове спортове;	лева, брой	Общината	годишно			
Приоритет 10. Обновяване на социалната и здравната инфраструктура и подобряване качеството на предоставяните от тях услуги						
Мярка 10.1. Насърчаване на социалното приобщаване и намаляването на бедността, чрез осигуряване на адекватна социална инфраструктура и интеграция на групите в неравностойно положение.						
Брой ново изградени обекти, ремонти, оборудване, ДМА; Брой съоръжения за достъпна среда; Разкрити алтернативни социални услуги; Обслужени потребители на социални услуги;	брой, лева	Общината	годишно			
Мярка 10.2. Предоставяне на по-качествени здравни грижи и осъвременяване на здравната инфраструктура в общината.						
Брой услуги предлагани от общината; Брой изградени, ремонтирани здравни заведения; Брой ново оборудване; Брой проучвания;	брой, лева	Общината	годишно			
Мярка 10.3. Подкрепа за медицинските практики и аптечната мрежа във всички населени места от общината						
Брой медицински практики, аптеки в населените места в общината; Брой население на 1 лекар; Брой население на 1 дентален лекар	брой	Общината, НЦЗИ	годишно			
Мярка 10.4. Насърчаване на раждаемостта чрез пакет от финансови стимули и предоставяне на допълнителни социални услуги в помощ на родителите						
Наредба с мерки за насърчаване на раждаемостта	брой	Общината	годишно			
Приоритет 11. Подобряване на свързаността и достъпността на пътната инфраструктура и уличната мрежа.						
Мярка 11.1. Изграждане на регионалната транспортна свързаност.						

**Доклад за резултатите от междинна оценка за периода 2021 – 2024г.
на План за интегрирано развитие на община Чепеларе (2021 – 2027г.)**

Приоритет, мярка/ Индикатор за продукт	Мерна единица	Източник на информация	Период на отчитане	Целева стойност	Отчетна междинна стойност 2024	Степен на изпълнение
Реализиран проект за изграждане на обходна пътна артерия през град Чепеларе	лева, км.;	Общината	годишно			
Мярка 11.2. Изграждане и рехабилитация на общинската пътна инфраструктура и привеждането ѝ в съответствие с европейските изисквания.						
Изграждане и рехабилитация на пътища	Брой, лева, %, километри	Общината	годишно			
Мярка 11.3. Изграждане и рехабилитация на вътрешно-уличната мрежа.						
Изграждане и рехабилитация на улична мрежа; Изграден паркинг;	Брой, лева, километри	Общината	годишно			
Приоритет 12. Обновяване на водоснабдителната инфраструктура и услуги.						
Мярка 12.1. Изграждане и реконструкция на ВИК мрежа, ПСОВ и пречиствателни станции за питейна вода						
Дължина на новите или консолидираните тръби за битови нужди; Подземни комуникации-ВиК; ПСОВ и пречиствателни станции за питейна вода	брой, %, лева, километри	Общината, ВИК	годишно			
Мярка 12.2. Изграждане на водоизточници, санитарно-охранителни зони около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване и нови водохващания.						
Изградени съоръжения	брой, лева	Общината	годишно			
Мярка 12.3. Регулиране на речните корита с цел намаляване на опасностите от наводнения.						
Проведени мероприятия	брой, лева	Общината	годишно			
Приоритет 13. Повишаване на енергийната ефективност, чрез изграждане на алтернативни енергийни източници и обновяване на енергийната инфраструктура						
Мярка 13.1. Изграждане и обновяване на електропреносната мрежа						
Брой реконструкции на електропреносната система, енергоспестяващо улично осветление;	брой, лева	Общината	годишно			
Мярка 13.2. Изграждане и експлоатация на енергийната инфраструктура и алтернативните източници на енергия.						
Изградена газопреносна мрежа	брой, лева, %	Общината	годишно			
Мярка 13.3. Подобряване на енергийната ефективност на общинския сграден фонд.						
Ремонтирана и обновена материално- техническа база с мерки за енергийна ефективност на сгради с обществено предназначение	брой, лева, %	Общината	годишно			

**Доклад за резултатите от междинна оценка за периода 2021 – 2024г.
на План за интегрирано развитие на община Чепеларе (2021 – 2027г.)**

Приоритет, мярка/ Индикатор за продукт	Мерна единица	Източник на информация	Период на отчитане	Целева стойност	Отчетна междинна стойност 2024	Степен на изпълнение
Мярка 13.4. Широко популяризиране сред обществеността на ползите, възможностите и задълженията за енергийна ефективност и спестявания съгласно българското и европейско законодателство						
Информационни кампании	брой	Общината	годишно			
Марка 13.5. Стимулиране ползването на алтернативни/възобновяеми енергийни източници						
Наредба за стимулиране	брой	Общината	годишно			
Мярка 13.6. Широко популяризиране сред обществеността на ползите, възможностите и задълженията за Ползване на ВЕИ енергия съгласно българското и европейско законодателство						
Информационни кампании	брой, лева	Общината	годишно			
Мярка 13.7. Проучване на възможността за насърчителни мерки, в това число данъчни стимули при изпълнение на мерки за енергийна ефективност и нови ВЕИ мощности						
Брой проучвания	брой	Общината	годишно			
Приоритет 14. Обновяване и осъвременяване на съобщителната мрежа и цифрова свързаност						
Мярка 14.1. Модернизация на телекомуникационната мрежа на територията на общината						
Широколендов Интернет до всички обществени сгради в общината.	брой	Общината	годишно			
Мярка 14.2. Проучване на възможностите и изпълнение на дейности по изграждане на свръхбърза широколендова инфраструктура						
Проучване	брой, лева	Община	годишно			
Мярка 14.3. Осигуряване на свързаност към единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на държавната администрация						
Програми за свързаност	брой, лева	Общината	годишно			
Приоритет 15. Изграждане и благоустрояване на специализираните инфраструктури.						
Мярка 15.1. Благоустрояване на специализираните инфраструктури						
Ремонти и ДМА	брой, лева	Общината	годишно			
Мярка 15.2. Актуализиране на кадастралните карти и регулационните планове.						
Актуализирани кадастрални карти, дигитализация	брой, лева, %	Общината	годишно			
Приоритет 16 . Инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия живот						
Мярка 16.1. Обновяване на образователната инфраструктура и подобряване степента на образованост сред гражданите.						
Ремонти и нови ДМА в училища и детски градини; Изградена инфраструктура около учебните заведения; Повишена енергийна ефективност;	км., брой, %, лева	Община, Информация на ниво проект, ИСУН	годишно			
Мярка 16.2. Стимулиране на иновационните подходи в работата с децата и учениците и извънкласните занимания.						

**Доклад за резултатите от междинна оценка за периода 2021 – 2024г.
на План за интегрирано развитие на община Чепеларе (2021 – 2027г.)**

Приоритет, мярка/ Индикатор за продукт	Мерна единица	Източник на информация	Период на отчитане	Целева стойност	Отчетна междинна стойност 2024	Степен на изпълнение
Закупени софтуерни продукти; Въведени екологични програми;	брой	Общината	годишно			
Мярка 16.3. Повишаване квалификацията на безработни и трудово неактивни лица в различни обучения и стажове;						
Програми за преквалификация	брой	Община, АЗ	годишно			
Мярка 16.4. Мерки за допълнителна квалификация, преквалификация с цел адаптиране към новите изисквания на пазара на труда						
Оборудвани кабинети със съвременно оборудване	брой	Общината	годишно			
Приоритет 17. Културна инфраструктура и културно наследство						
Мярка 17.1. Реновиране сградите на читалищата и културните институции в общината.						
Брой реновирани сгради; Обогатен библиотечен фонд; ДМА; Подновено информационно оборудване и хранилища	брой	Общината	годишно			
Мярка 17.2. Съхраняване, развитие и популяризиране на културно-историческото наследство.						
Създаден демонстрационен център; Проведени рекламни кампании; Поддръжка паметници; Организиране на различни форми за - изява – прегледи на любителското творчество, фестивали, конкурси, изложби и др.	брой	Община	годишно			
Приоритет 18. Благоустрояване на обекти на общественото обслужване и подобряване достъпа до основните административни услуги.						
Мярка 18.1. Благоустрояване и модернизиране на обекти обслужващи граждани и бизнес.						
Ремонти, поддръжка и достъпност на обекти обслужващи граждани;	брой, лева	Общината	годишно			
Мярка 18.2. Подобряване на качеството и видовете административни услуги, предлагане на електронни услуги и намаляване на срока за административни обслужване						
Брой електронни услуги; Срокове на административни услуги; Контрол на качеството; Изпълнени проекти по оперативни програми от Община Чепеларе;	брой, лева	Общината	годишно			
Мярка 18.3. Обновяване на хардуера и софтуера в общинска администрация.						
Нови електронни продукти;	брой	Общината	годишно			

**Доклад за резултатите от междинна оценка за периода 2021 – 2024г.
на План за интегрирано развитие на община Чепеларе (2021 – 2027г.)**

Приоритет, мярка/ Индикатор за продукт	Мерна единица	Източник на информация	Период на отчитане	Целева стойност	Отчетна междинна стойност 2024	Степен на изпълнение
Приоритет 19. Подобряване на квалификацията и обmena на добри практики.						
Мярка 19.1. Повишаване квалификацията на административния персонал и ефективността на проектния мениджмънт, чрез обучение и обмен на добри практики.						
Брой обучения; Стойност на реализирани съвместни проекти;	брой, лева	Общината	годишно			
Мярка 19.2. Разширяване на вътрешните, международните партньорства и междуобщинското сътрудничество						
Проведени обучения съвместно с представители на други общини и администрации;	брой	Общината				
Приоритет 20. Подобряване управлението на отпадъците						
Мярка 20.1. Премахване на последиците от индустриални и битови замърсявания и тяхното ограничаване						
Проведени рекултивационни мероприятия	брой, лева, декари	Общината	годишно			
Мярка 20.2. Обновяване и модернизиране на оборудването за сметосъбиране и сметоизвозване в общината						
ДМА	брой, лева	Общината	годишно			
Мярка 20.3. Изграждане на система за разделно събиране на отпадъците и повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали.						
Изградена система за разделно събиране и рециклиране;	брой	Общината	годишно			
Мярка 20.4. Изграждане на площадки и съоръжения намаляващи замърсяванията						
Изградени площадки и съоръжения	брой, лева	Общината	годишно			
Мярка 20.5. Проучване на възможностите и развитие на инфраструктура, свързана с управлението на битовите отпадъци за постигане на целите за 2030г. за рециклиране на отпадъците и намаляване на количествата на депонираните отпадъци						
Проведено проучване	брой, лева	Общината	годишно			
Мярка 20.6. Разработване на стандарти за разделно събиране и рециклиране на отпадъците в общината, съобразено с възможностите и степента на инфраструктурна обезпеченост, подготовка за изграждане на система за разделно събиране на отпадъци						
Разработени стандарти	брой	Общината	годишно			
Мярка 20.7. Предотвратяване генерирането и насърчаване на рециклиране на отпадъците						
Наредба за рециклиране на отпадъците	брой	Общината	годишно			
Мярка 20.8. Информираност и обучение на гражданите (в това число и в училищата), стопанските субекти и на отговорните административни структури в областта на управление на отпадъците и кръговата икономика						
Проведени информационни кампании	брой	Общината	годишно			
Мярка 20.9. Мониторинг и запечатване на нерегламентирани депа за отпадъци						

**Доклад за резултатите от междинна оценка за периода 2021 – 2024г.
на План за интегрирано развитие на община Чепеларе (2021 – 2027г.)**

Приоритет, мярка/ Индикатор за продукт	Мерна единица	Източник на информация	Период на отчитане	Целева стойност	Отчетна междинна стойност 2024	Степен на изпълнение
Въвеждане на ефективни системи за мониторинг за резултатите от мерките; Затворени депа;	брой	Общината	годишно			
Мярка 20.10. Подобряване на базата от знания относно кръговата икономика, мониторинга на отпадъците и потоците от материали.						
Мониторинг на кръговата икономика в общината	брой	Общината	годишно			
Мярка 20.11. Проучване на възможностите за финансиране и насърчаване на публични – частните партньорства						
Проведено проучване;	брой	Общината	годишно			
Приоритет 21. Опазване и подобряване на околната среда и превенция на екологичните рискове						
Мярка 21.1. Превенция на екологичните рискове						
Проверки и препоръки за установяване екологични рискове;	брой	Общината	годишно			
Мярка 21.2. Подобряване управлението на водите и управлението на почвите.						
Изпълнени мерки за предотвратяване свлачища и наводнения	брой	Общината	годишно			
Приоритет 22. Дейности по опазване на чистотата на въздуха						
Мярка 22.1. Контрол на изисквания за опазване чистотата на околната среда към операторите извършващи строителни дейности						
Проверки на извършвани СМР	брой	Общината	годишно			
Мярка 22.2. Провеждане на периодичен мониторинг и контрол на състоянието на атмосферния въздух						
Бюлетин за състоянието на атмосферния въздух	брой	Общината	годишно			
Мярка 22.3. Намаляване на замърсяването на въздуха от битовото отопление и проучване възможностите за поетапна замяна на отоплителните уреди на твърдо гориво						
Брой домакинства преминали на екологично отопление;	брой	Общината	годишно			
Мярка 22.4. Намаляване на замърсяването на въздуха от транспорта						
Подновен автопарк;	брой	Общината	годишно			
Мярка 22.5. Зелени мерки в градска среда, вкл. изграждане на „зелени пояси/зони“						
Изградени "зелени пояси/зони"	брой, декари	Общината	годишно			
Мярка 22.6. Разработване и актуализация на документи във връзка с качеството на атмосферния въздух						
Разработени документи	брой	Общината	годишно			
Мярка 22.7. Информационна кампания и обучения за широката общественост и за администрацията за европейските изисквания и национални изисквания за чистота на атмосферния въздух						
Информационни кампании	брой	Общината	годишно			
Приоритет 23. Подобряване чистотата на водите						
Мярка 23.1. Изграждане и реконструкция на ВиК инфраструктура						

**Доклад за резултатите от междинна оценка за периода 2021 – 2024г.
на План за интегрирано развитие на община Чепеларе (2021 – 2027г.)**

Приоритет, мярка/ Индикатор за продукт	Мерна единица	Източник на информация	Период на отчитане	Целева стойност	Отчетна междинна стойност 2024	Степен на изпълнение
Изградени и реконструирани подземни ВиК съоръжение	брой, км. Лева, %	Общината, ВиК	годишно			
Мярка 23.2. Опазване качеството на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, вкл. установяване на зони за опазването им в района на съоръженията за водовземане						
Брой санитарно-охранителни зони около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване и нови водохващания	брой	Общината, ВиК	годишно			
Мярка 23.3. Стриктен мониторинг на микробиологичните показатели на питейната вода и дейности по намаляване на загубите по водопроводната мрежа						
Контрол на качеството и минимизиране на загубите по водопроводната мрежа;	брой	Общината, ВиК	годишно			
Приоритет 24. Подобряване на биоразнообразието						
Мярка 24.1. Опазване и възстановяване на видове, хабитати, екосистеми и ландшафти. Опазване на генетичното разнообразие и биологичната сигурност.						
Изготвена наредба; Установяване на съществуващи видове, хабитати, екосистем и ландшафти;	брой	Общината	годишно			
Мярка 24.2. Подобряване на информираността и повишаване активността на местната общественост за опазване на биологичното разнообразие.						
Информационни кампании	брой	Общината	годишно			
Мярка 24.3. Развитие на мрежата Натура 2000 и подобряване на природозащитното състояние на природните местообитания и видове						
Природозащитни мероприятия;	брой	Общината	годишно			
Мярка 24.4. Опазване и възстановяване на екосистемите и присъщото им биологично разнообразие и осигуряване свързаността на мрежата Натура 2000						
Приети планове и реализирани политики на мастно ниво	брой	Общината	годишно			
Мярка 24.5. Подобряване капацитета, включително чрез обучения, на звената, отговорни за управлението на и за прилагането на политиките по биологично разнообразие и по управление на Натура 2000						
Проведени обучения в администрацията	брой	Общината	годишно			
Приоритет 25. Превенция и управление на риска от наводнение, свлачища и изменение на климата						
Мярка 25.1. Превенция, управление и анализ на риска от наводнения и засушаване, свлачища, срутища, ерозии, абразии, горски пожари и др.						
Работна група за управление на риска при бедствия	брой	Общината	годишно			
Мярка 25.2. Управление на риска от природни бедствия и за превенция на риска за живота и здравето на населението						

**Доклад за резултатите от междинна оценка за периода 2021 – 2024г.
на План за интегрирано развитие на община Чепеларе (2021 – 2027г.)**

Приоритет, мярка/ Индикатор за продукт	Мерна единица	Източник на информация	Период на отчитане	Целева стойност	Отчетна междинна стойност 2024	Степен на изпълнение
Изготвени анализи за риска и мерки за запазване здравето и живота на населението	брой	Общината	годишно			
Мярка 25.3. Проучвания и анализи, насочени към обследване на последиците от изменението на климата и отражението им върху водните ресурси на община Чепеларе						
Проведено проучване и анализ;	брой	Общината	годишно			
Мярка 25.4. Насърчаване на обучението в системата на предучилищното и училищното образование за риска от бедствия, включващо превенция, готовност, реагиране и възстановяване						
Проведени обучения в учебните заведения	брой	Общината	годишно			
Мярка 25.5. Изготвяне, преразглеждане и актуализиране на планове за защита при бедствия, както и разработване и актуализиране на съответните програми за намаляване на риска от бедствия						
Изготвени програми за действия, на различни нива;	брой	Общината	годишно			
Мярка 25.6. Стимулиране на застраховането срещу рискове от бедствия и аварии и такива, породени от изменението в климата						
Разработени документи, направени застраховки;	брой, лева	Общината	годишно			
Приоритет 26. Намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда						
Мярка 26.1. Изготвяне на анализ на изискванията на Директива (ЕС) 2019/904 относно забрани за използване на определени пластмасови продукти и ефектът върху местната икономика, подготовка и проучване на добри практики за замяна на някои видове пластмасови продукти с алтернативни.						
Проведен анализ	брой	Общината	годишно			
Мярка 26.2. Провеждане на информационни кампании за актуалните проблеми по предотвратяване изменението на климата за положителния ефект от рециклирането на пластмасовите изделия и кръговата икономика						
Информационни кампании	брой	Общината	годишно			

Препоръка: Необходимо е при актуализация на ПИРО да се предприемат корективни действия в Матрицата на индикаторите (Приложение №3), които да бъдат съобразени с „Методическите указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.“ на МРРБ и с Приложение 3а – Списък на общите индикатори в областта на регионалната политика и за постигане на растеж и заетост чрез ЕСИФ за периода 2021-2027 г. (Съгласно проекта на Регламент за ЕФРР за периода 2021-2027).

3.1.2. Оценка на ефикасността

Ефикасността на използваните ресурси указва отношението на постигнатия резултат спрямо вложените разходи. От направения преглед и оценка е уставен сериозен дисбаланс при напредъка между приоритетите, който се дължи основно на предвидените и изразходваните средства по отделните приоритети, както и заложения голям брой проектни инициативи/ дейности/проекти в някои от приоритетите. Оценка на ефикасността е направена и от гледна точка на произхода на финансовите ресурси за подпомагане на проектите, включени в ПИРО.

Фигура 26. Ефикасност на използваните източници на финансиране



Основен източник на финансиране за изпълнението на ПИРО – Чепеларе за периода 2021 - 2024 г. са средствата от държавния бюджет, които формират дял от 49% или 17 849 706,08 лв. за проекти на общинската администрация и на публичните институции, които са реализирани през периода на междинната оценка, вкл. за националното съфинансиране към проектите от фондовете на ЕС.

От общинския бюджет за изпълнение на ПИРО са реализирани 1 475 258,72 лв., което формира 4%.

Безвъзмездното финансиране от структурните и кохезионни фондове на ЕС формира дял от 16% или 5 689 382,64 лв., привлечени за реализиране на проекти в публичния, частния и неправителствения сектор.

„Други/финансови инструменти“ формират дял от 31% или 11 064 617,73 лв., от изразходвания ресурс и това са привлечени средства от ПУДООС, национални програми, частни инвестиции за съфинансиране на проекти от различни европейски фондове и др.

Прегледът на изпълнението показва, че са търсени различни възможности за финансовото обезпечаване на изпълнението на ПИРО. Осигуреният финансов ресурс е от спечелени проекти по оперативните програми на ЕС, действащи до края на 2023 г.: Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020; Оперативна програма „Храни“ 2014-2020 г.; Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020; Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020; както и програмите за новия период: Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027; Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021-2027; Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027; Национален план за възстановяване и устойчивост и др. Европейски програми: Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 (Европейски фонд за регионално развитие, Републикански бюджет); Национални програми на: Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда (ПУДООС), Програми на Министерство на образованието и науката, Министерство на младежта и спорта. Но основно се разчита на целеви трансфери от държавния бюджет.

3.2. Оценка на организацията и координацията на компетентните органи и ефективността на работата на административната структура

Мерки за наблюдение и механизми за събиране и обработване на данни

Наблюдението на изпълнението на ПИРО се извършва с цел постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране на регионалното и пространственото развитие, програмирането, управлението и ресурсното им осигуряване.

Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите за регионално и местно развитие, съгласно определени физически и финансови индикатори, организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за управление, и мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите от изпълнението на ПИРО.

От информацията, предоставена в Годишните доклади за изпълнение на ПИРО, се установява, че тя е идентична с текстовете в ПИРО, без да дава конкретика относно реалните действия на администрацията за наблюдение и механизми за събиране и обработване на данни.

Орган за наблюдение на плана за интегрирано развитие на общината е Общинският съвет - Чепеларе. В процеса на наблюдение на изпълнението на ПИРО Общинският съвет

**Доклад за резултатите от междинна оценка за периода 2021 – 2024г.
на План за интегрирано развитие на община Чепеларе (2021 – 2027г.)**

осигурява участието на заинтересованите органи, организации, физически и юридически лица при спазване на принципа за партньорство, публичност и прозрачност при изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината.

Финансовото и техническото обезпечаване на дейността по наблюдението на плана за интегрирано развитие на общината се осигурява от бюджета на общината.

Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината. За резултатите от наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината се разработва годишен доклад.

Сред приложените инструменти за изпълнение и наблюдение на ПИРО са Годишните доклади за наблюдение на изпълнението на ПИРО. За отчитане на напредъка по ПИРО ежегодно са изготвяни Годишни доклади.

Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на общината е публичен и се оповестява на страницата на общината в интернет. Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината осигуряват информация за изготвяне на междинната и последващата оценка на плана. Копие от годишните доклади за наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината се изпраща на председателя на Областния съвет за развитие в 7-дневен срок от решението за тяхното одобряване.

За прилагане на мерките за наблюдение и механизми за събиране и обработване на данни е необходимо да се предприемат следните действия:

- ✓ Създаване на Работна група, чиито състав е определен със Заповед на кмета, която следи изпълнението на програмата за реализация на ПИРО, обсъжда и мотивирано предлага промени в ПИРО на база на променени обстоятелства и/или възникнали проблеми, разглежда и одобрява годишни отчети за изпълнението на ПИРО.
- ✓ Наблюдението на изпълнението на ПИРО следва да се извършва въз основа на официални данни на Националния статистически институт, на Агенцията по заетостта, както и на данни от други национални, регионални и местни източници на информация.

Годишните доклади да се изготвят структура, съответстваща на разпоредбите на Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие , чл. 72. (8) и съдържа информация за:

- ✓ Раздел I. Общите условия за изпълнение на плана за интегрирано развитие на общината и в частност промените в социално-икономическите условия в общината;
- ✓ Раздел II. Постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на плана за интегрирано развитие на общината въз основа на индикаторите за наблюдение;

- ✓ Раздел III. Действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината, в т. ч.:
 - а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни;
 - б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на плана за интегрирано развитие на общината през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;
 - в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на плана за интегрирано развитие на общината;
 - г) мерките за постигане на необходимото съответствие на плана за интегрирано развитие на общината със секторните политики, планове и програми на територията на общината, включително мерките за ограничаване изменението на климата и за адаптацията към вече настъпилите промени;
 - д) мерките за прилагане принципа на партньорство;
 - е) резултатите от извършени оценки към края на съответната година;
- ✓ Раздел IV. Изпълнението на проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на плана за интегрирано развитие на общината с размера на усвоените средства за отчетния период и източниците на тяхното финансиране;
- ✓ Раздел V. Заключение и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението на плана за интегрирано развитие на общината.

Мерки за осигуряване на информация и публичност

Планът за интегрирано развитие на Община Чепеларе 2021-2027 г., приет с Решение № 235 на Общински съвет - Чепеларе от 25.03.2021 г.⁶⁴ е достъпен на страницата на Общината. ПИРО Чепеларе 2021-2027г. е публикуван в портала за обществени консултации на Министерски съвет.⁶⁵

Информация по отношение изпълнението на мерките и дейностите залегнали в ПИРО, обществеността получава от публикации в местните електронни и печатни издания, както и от официалния сайт на общината.

Публично достъпни са всички документи, решения, протоколи на Общински съвет - Чепеларе.

⁶⁴ <http://chepelare.org/?page=decisions&pid=28&id=1986>

⁶⁵ <https://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1475>

Мерки за прилагане на принципа на партньорство

Голяма част от реализираните проекти в обхвата на ПИРО са резултат от активността на заинтересованите страни, като администрацията е създавала необходимите форми за стимулиране на интереса за партньорства.

През периода 2021 - 2024г. са проведени редица срещи, обсъждани са възможности за реализиране на партньорски инициативи, като част от тях вече са разработени и са в процес на оценка.

Принципът на партньорство се прилага на всички етапи и нива в процеса на реализация на ПИРО, особено в областта на реализация на проекти от общинско значение, по които Общината е потенциален допустим партньор и проекти за обекти, които могат да се реализират на територията на Община Чепеларе.

В процеса на изпълнение на ПИРО е важно създаването на нови и поддържането на изградените вече ефективни партньорства. Това дава възможност в процеса на изпълнение да се реализира по-голяма икономическа целесъобразност и да се укрепи потенциала за разкриване на нови пътища към привличането на инвестиции и допълнителни финансови средства. Реализирането на стратегическите цели и приоритети следва да стане в условията на тясно взаимодействие и партньорство между местните власти, бизнеса и НПО. Необходимо е да се използват всички възможности за съвместни проекти и дейности, включително в условията на междубщинско и международно сътрудничество.

Предвижда се прилагането на успешни модели на партньорство за интегрирани териториални инвестиции между общините и бизнеса за техни съвместни инициативи. Важно условие е съчетаването на икономическите цели в развитието с опазването на околната среда и разумното използване на културното материално и нематериално наследство в общината.

Прилагането на подхода за интегрирани териториални инвестиции в общината дава своите резултати като на практика са създадени партньорски мрежи на регионално ниво.

Община Чепеларе е партньор в 2 КИТИ, разработени през 2023г.

КИТИ №BG16FFPR003-2.001-0156 Развитие на област Смолян чрез инвестиции в устойчив туризъм, създаване на нови атракции и опазване на културно- историческото наследство на териториите на общините Смолян, Чепеларе, Баните и Златоград и подобряване на транспортната свързаност. Водещ партньор/Кандидат: Община Смолян; Партньори: Община Чепеларе, Община Златоград, Община Баните, Областна администрация – Област Смолян, Регионален исторически музей „Стою Шишков“- Смолян, ПГСГСТ „Н. Й. Вапцаров“, „Пампорово“ АД, Агенция „Пътна инфраструктура“. Концепцията е одобрена и е в процес на финансиране.

**Доклад за резултатите от междинна оценка за периода 2021 – 2024г.
на План за интегрирано развитие на община Чепеларе (2021 – 2027г.)**

КИТИ №BG16FFPR003-2.001-0072, Развитие и целогодишно предлагане на устойчиви туристически продукти в Средните Родопи, Водещ партньор/Кандидат: Регионално сдружение на научно-технически съюзи, Партньори: Народно читалище „Проф. д-р Асен Златаров 1927“ - с. Смилян, Народно читалище „Христо Ботев -1892 г.“ - с. Чокманово, Сдружение „Тур де България“, „Д И К“ ООД, Община Чепеларе, Община Златоград. Концепцията е одобрена и е включена в резервен списък с конкретни бенефициенти, поради изчерпване на предвидения финансов ресурс.

Община Чепеларе е член на Местна Инициативна Група „Преспа“ – общини Баните, Лъки и Чепеларе. През периода се отчита постоянно участие в събрания и срещи, организирани от МИГ „Преспа“, вкл. председателство на УС на МИГ „Преспа“ от страна на Община Чепеларе и активна работа по популяризиране на Стратегия за местно развитие на МИГ и усвояване на средства по ПРСР 2014-2020. През 2023 г. представители на общинска администрация Чепеларе участват в подготовката на Стратегия за местно развитие на МИГ „Преспа“ за следващия планов период.

IV. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Изводи от постигнатите резултати

Междинната оценка за изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Чепеларе има за цел да обобщи първоначалните резултати и напредъка за първите 4 години от прилагането на стратегическия документ, като анализира промяната в средата и условията на живот на местната общност.

За изпълнение на ПИРО на Община Чепеларе през периода 2021 – 2024 г. реално инвестираният финансов ресурс в публичния и частния сектор е **36 078 965,17 лв.**, което формира **31,42%** изпълнение от планирания индикативен бюджет. Анализът, който по същество е част от параметъра „ефикасност на използваните ресурси“ показва, че общите разходи за финансовото изпълнение на ПИРО на Община Чепеларе за периода 2021-2024 г. на етап междинна оценка е показателен за постигнато **добро финансово изпълнение**.

Основен източник на финансиране за изпълнението на ПИРО – Чепеларе за периода 2021 - 2024 г. са средствата от държавния бюджет, които формират дял от 49% или 17 849 706,08 лв. за проекти на общинската администрация и на публичните институции, които са реализирани през периода на междинната оценка, вкл. за националното съфинансиране към проектите от фондовете на ЕС. Безвъзмездното финансиране от структурните и кохезионни фондове на ЕС формира дял от 16% или 5 689 382,64 лв., привлечени за реализиране на проекти в публичния, частния и неправителствения сектор. „Други/финансови инструменти“ формират дял от 31% или 11 064 617,73 лв., от изразходвания ресурс и това са привлечени средства от ПУДООС, национални програми, частни инвестиции за съфинансиране на проекти от различни европейски фондове и др. От общинския бюджет за изпълнение на ПИРО са реализирани 1 475 258,72 лв., което формира 4%.

Препоръки за подобряване на организацията и дейността

Необходимо е да се извърши актуализиране на Плана за интегрирано развитие на Община Чепеларе за периода 2021-2027г. с оглед променените социално – икономически условия през периода 2021 – 2024г. и наличието на одобрени програми за финансиране през новия програмен период със средства от фондовете на ЕС. Важно е при извършване на актуализацията да се спазват Методическите указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027г. на МРРБ и да се коригират допуснатите несъответствия по отношение на:

- ✓ Да се извърши актуализация и декомпозиране на стратегическата част на ПИРО, в съответствие с разпоредбите на Закона за регионалното развитие, Правилника за

неговото прилагане и в съгл. подробните изводи и препоръки направени в Раздел II. Оценка на степента на постигане на целите на ПИРО от настоящия доклад.

- ✓ Приложение №1 Програма за реализация на ПИРО на Община Чепеларе за периода 2021-2027 г. да се синхронизира със Стратегическата част на ПИРО и да отразява конкретно мерки и дейности, които са обвързани с индикативен финансов ресурс. При актуализация на Приложение №1 е препоръчително всички нови проектни идеи които се включват да бъдат реалистични – с конкретен източник на финансиране и период на изпълнение до края на стратегическия документ. При наличие на проектни идеи за които е необходим по-дълъг технологичен срок за изпълнение и липсата на възможност за финансиране е препоръчително да се обобщят в списък с проектни идеи за следващия програмен период.
- ✓ Да се актуализира Приложение 1А Индикативен списък на важни за общината проекти в изискуемия образец и при условията на Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ). Да се синхронизират включените проекти с Приложение №1. Условието за включване на конкретни проектни идеи по дадена мярка в Приложение №1А е общината съвместно с партньорите да са преценили, че (1) съответният проект е от особена важност за развитието на общината и следва да бъде реализиран приоритетно и (2) съответният проект да има известна степен на проектна готовност.
- ✓ Да се актуализира Матрицата с индикатори (Приложение №3), защото направената оценка показва, че изведените индикатори за продукт и резултат нямат целева стойност и не са съобразени с „Методическите указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.“ на МРРБ и с Приложение За – Списък на общите индикатори в областта на регионалната политика и за постигане на растеж и заетост чрез ЕСИФ за периода 2021-2027 г. (Съгласно проекта на Регламент за ЕФРР за периода 2021-2027).
- ✓ При актуализацията на ПИРО да се осигури съответствие с действащи документи на Община Чепеларе;

Реализирането на стратегическите цели и приоритети на ПИРО не е задача само на местната власт и трябва да се случва в условията на тясно взаимодействие и партньорство с бизнеса, социални, образователни културни институции, НПО и други заинтересовани страни. Необходимо е да се използват всички възможности за съвместни проекти и дейности, включително в условията на междуобщинско и международно сътрудничество.

Изведените препоръки няма задължителен характер.
